




21st CENTURY
实用规划教材

21世纪全国应用型本科**土木建筑系列**实用规划教材



工程合同管理

主 编 方 俊 胡向真
副主编 余群舟 马 驰
刘 玲 陈金洪



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材

工程合同管理

主 编 方 俊 胡向真
副主编 余群舟 马 驰
刘 玲 陈金洪



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书在现有工程合同管理研究成果的基础上,全面系统地阐述了工程合同管理的概念、基本原理和方法,重点介绍了工程建设领域常用标准合同文本的内容与使用技巧。

本书可供工程管理专业及土木工程专业、建筑学专业、给排水专业和暖通专业作为本科教材,同时也可作为工程建设领域各类专业技术人员和管理人员学习工程合同管理知识的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

工程合同管理/方俊,胡向真主编. —北京:北京大学出版社,2006.6

(21世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材)

ISBN 7-301-10743-9

I. 工… II. ①方… ②胡… III. 建筑工程—经济合同—管理—高等学校—教材

IV. TU723.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第054466号

书 名:工程合同管理

著作责任者:方俊 胡向真 主编

策 划 编 辑:吴迪 李昱涛

责 任 编 辑:刘丽

标 准 书 号:ISBN 7-301-10743-9/F · 1395

出 版 者:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667

电 子 信 箱:pup_6@163.com

排 版 者:北京东方人华北大彩印中心 电话:62754190

印 刷 者:

发 行 者:北京大学出版社

经 销 者:新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 16.5印张 386千字

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

定 价:23.00元

《21 世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材》

专家编审委员会

主 任 彭少民

副主任 (按拼音顺序排名)

陈伯望 金康宁 李 忱 李 杰

罗迎社 彭 刚 许成祥 杨 勤

俞 晓 袁海庆 周先雁 张俊彦

委 员 (按拼音顺序排名)

邓寿昌 付晓灵 何放龙 何培玲

李晓目 李学罡 刘 杰 刘建军

刘文生 罗 章 石建军 许 明

严 兵 张泽平 张仲先

21 世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材

参编学校名单 (按拼音排序, 覆盖 26 个省市自治区)

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 安徽理工大学 | 23 华北水利水电学院 |
| 2 北京建筑工程学院 | 24 华东交通大学 |
| 3 北京联合大学 | 25 华中科技大学 |
| 4 长春工程学院 | 26 淮阴工学院 |
| 5 长江大学 | 27 黄石理工学院 |
| 6 长沙理工大学 | 28 江汉大学 |
| 7 东南大学 | 29 江苏大学 |
| 8 广州大学 | 30 江西科技师范学院 |
| 9 贵州大学 | 31 九江学院 |
| 10 桂林工学院 | 32 昆明理工大学 |
| 11 合肥工业大学 | 33 丽水学院 |
| 12 河北工业大学 | 34 辽宁工程技术大学 |
| 13 河北建筑工程学院 | 35 内蒙古科技大学 |
| 14 河南大学 | 36 南昌工程学院 |
| 15 黑龙江科技学院 | 37 南昌航空工业学院 |
| 16 湖北工业大学 | 38 南华大学 |
| 17 湖南城市学院 | 39 南京工程学院 |
| 18 湖南大学 | 40 南京林业大学 |
| 19 湖南工程学院 | 41 南阳理工学院 |
| 20 湖南工学院 | 42 宁波工程学院 |
| 21 湖南科技大学 | 43 三峡大学 |
| 22 华北电力大学 | 44 山东交通学院 |

- | | |
|------------|-------------|
| 45 山西大学 | 59 西安建筑科技大学 |
| 46 上海大学 | 60 西安科技大学 |
| 47 石河子大学 | 61 西北农林科技大学 |
| 48 石家庄铁道学院 | 62 西南交通大学 |
| 49 四川理工学院 | 63 西南林学院 |
| 50 太原理工大学 | 64 湘潭大学 |
| 51 天津工业大学 | 65 孝感学院 |
| 52 天津商学院 | 66 浙江科技学院 |
| 53 武汉大学 | 67 中国地质大学 |
| 54 武汉工程大学 | 68 中南大学 |
| 55 武汉工业学院 | 69 中南林学院 |
| 56 武汉科技大学 | 70 重庆大学 |
| 57 武汉科技学院 | 71 株洲工学院 |
| 58 武汉理工大学 | |

北京大学出版社
禁止转载

目 录

第1章 绪论	1	2.4.1 合同生效与合同成立	17
1.1 合同的概念	1	2.4.2 合同的生效要件	18
1.2 合同的分类	2	2.4.3 附条件和附期限合同	19
1.2.1 双务合同与单务合同	2	2.4.4 效力待定合同	20
1.2.2 有偿合同与无偿合同	3	2.4.5 无效合同	20
1.2.3 有名合同与无名合同	3	2.4.6 可撤销合同	21
1.2.4 诺成合同与实践合同	4	2.4.7 合同被确认无效或被撤销的后果	22
1.2.5 要式合同与不要式合同	4	2.5 合同的履行	22
1.2.6 主合同与从合同	4	2.5.1 合同的履行概述	22
1.2.7 本约与预约	4	2.5.2 合同履行的原则	22
1.2.8 为订约人自己订立的合同与为第三人利益订立的合同	5	2.5.3 双务合同履行中的抗辩权	24
1.3 合同在工程项目管理中的地位与作用	5	2.6 合同的保全	25
复习思考题	6	2.6.1 合同保全的概念	25
第2章 合同法基本概念	7	2.6.2 债权人的代位权	25
2.1 合同法概述	7	2.6.3 债权人的撤销权	26
2.1.1 我国统一合同法的制定及其特点	7	2.7 合同变更与转让	27
2.1.2 合同法的立法宗旨	8	2.7.1 合同变更	27
2.1.3 合同法的调整对象	8	2.7.2 合同转让	27
2.1.4 合同法的基本原则	9	2.8 违约责任	28
2.1.5 合同法的结构体系	10	2.8.1 违约责任的概念和特征	28
2.2 合同的成立	11	2.8.2 违约责任的构成要件	29
2.2.1 合同成立的概念和要件	11	2.8.3 实际履行与损害赔偿	29
2.2.2 要约	11	2.8.4 违约金责任和定金责任	30
2.2.3 承诺	13	2.8.5 免责事由	30
2.2.4 缔约过失责任	14	复习思考题	31
2.3 合同的主要内容与形式	14	第3章 建设工程施工合同	32
2.3.1 合同的条款	14	3.1 建设工程施工合同概述	32
2.3.2 合同权利与合同义务	15	3.1.1 建设工程施工合同的概念	32
2.3.3 合同的形式	17	3.1.2 建设工程施工合同的类型	33
2.4 合同的效力	17	3.1.3 建设工程施工合同的特点	34
		3.1.4 建设工程施工合同的订立	35

3.2 《建设工程施工合同(示范文本)》简介.....36	4.2.3 合同双方对委托监理合同的管理.....90
3.2.1 《建设工程施工合同》文件的组成.....36	复习思考题.....92
3.2.2 词语定义.....37	练习题.....93
3.2.3 《建设工程施工合同(示范文本)》的组成.....38	第5章 FIDIC 施工合同条件96
3.3 《建设工程施工合同》通用条款的内容.....39	5.1 FIDIC 及 FIDIC 合同简介.....96
3.3.1 通用条款的组成.....39	5.1.1 FIDIC 简介.....96
3.3.2 通用条款的主要内容.....40	5.1.2 FIDIC 合同条件的发展历程.....96
3.4 建设行政主管部门对建设工程施工合同的管理.....51	5.2 FIDIC 施工合同条件.....100
3.5 发包人对建设工程施工合同的管理.....54	5.2.1 新版 FIDIC 施工合同文本格式.....100
3.5.1 发包人的权利和义务.....54	5.2.2 合同条件的特点.....101
3.5.2 发包人违约.....56	5.2.3 部分重要词语的定义.....102
3.6 承包人对建设工程施工合同的管理.....57	5.2.4 合同中各方的工作责任与权利.....107
3.6.1 订立建设工程施工合同前的准备工作.....57	5.2.5 合同中质量管理条款及内容.....113
3.6.2 承包人的权利和义务.....58	5.2.6 合同中进度管理条款及内容.....118
3.6.3 承包人违约.....60	5.2.7 合同中支付管理条款及内容.....121
复习思考题.....61	5.2.8 合同中其他管理性条款及内容.....125
第4章 建设工程其他合同62	复习思考题.....130
4.1 建设工程勘察设计合同.....62	第6章 工程合同索赔管理131
4.1.1 建设工程勘察设计合同概述.....62	6.1 索赔概述.....131
4.1.2 《建设工程勘察合同<示范文本>》的内容.....63	6.1.1 索赔的概念及特征.....131
4.1.3 《建设工程设计合同<示范文本>》的内容.....71	6.1.2 索赔的分类.....133
4.1.4 合同双方对勘察设计合同的管理.....78	6.1.3 索赔的作用及条件.....134
4.2 建设工程委托监理合同.....79	6.2 索赔程序及文件.....135
4.2.1 建设工程委托监理合同概述.....79	6.2.1 一般程序.....135
4.2.2 《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容.....80	6.2.2 索赔报告.....138
	6.2.3 索赔策略.....141
	6.3 索赔值的计算.....142
	6.3.1 计算理论分析.....142
	6.3.2 工期索赔值的计算.....143
	6.3.3 费用索赔值的计算.....148

6.4 反索赔	158	8.3.2 工程投标保证金	202
6.4.1 概述	158	8.3.3 承包商履约担保	203
6.4.2 反索赔的内容	159	8.3.4 预付款担保	204
6.4.3 反索赔的程序与报告	160	8.3.5 业主支付担保	205
6.5 索赔(反索赔)案例	162	8.4 工程合同的保险	205
6.5.1 国内工程施工索赔(反索赔) 案例	162	8.4.1 保险概述	205
6.5.2 国际工程施工索赔(反索赔) 案例	171	8.4.2 工程合同保险的基本概念	207
复习思考题	178	8.4.3 工程合同保险条款的主要 内容	209
练习题	179	8.4.4 工程合同保险的投保	214
第7章 工程合同变更管理	181	8.5 工程合同的风险管理	216
7.1 工程变更的概念与分类	181	8.5.1 工程合同的风险管理	216
7.1.1 工程变更的概念	182	8.5.2 承包人的风险管理	219
7.1.2 工程变更的分类	182	复习思考题	220
7.2 合同主体各方在工程变更活动中 的权利与义务	184	第9章 工程合同争议的解决	221
7.2.1 监理工程师在工程变更 活动中的一般权利与义务	184	9.1 概述	221
7.2.2 发包人在工程变更活动中 的一般权利与义务	184	9.1.1 合同争议	221
7.2.3 承包人在工程变更活动中 的一般权利与义务	184	9.1.2 建设工程施工合同争议的 形成	223
7.3 工程变更价款的确定	184	9.1.3 建设工程施工合同争议的 主要内容	224
7.4 工程变更的管理与控制	186	9.1.4 解决建设工程施工合同 争议的一般方式	224
7.4.1 工程变更的分类控制	186	9.2 合同争议的和解与调解	225
7.4.2 工程变更控制系统的构成	187	9.2.1 和解	225
7.4.3 承包商提出工程变更的 控制程序	190	9.2.2 调解	226
复习思考题	192	9.2.3 调解与和解的原则	228
第8章 工程合同风险管理	193	9.3 合同争议的仲裁	229
8.1 风险管理概述	193	9.3.1 合同争议仲裁的概念及 特征	229
8.2 工程合同风险因素分析	194	9.3.2 合同争议仲裁的基本原则	230
8.2.1 风险因素分析的方法	194	9.3.3 仲裁机构及仲裁人员	231
8.2.2 风险分类	195	9.3.4 仲裁协议	231
8.3 工程合同的担保	197	9.3.5 仲裁的程序	232
8.3.1 工程合同担保的基本概念	197	9.4 合同争议的司法诉讼	233
		9.4.1 合同诉讼的概念和基本 原则	233
		9.4.2 合同诉讼的管辖	234

9.4.3 审判组织.....	236	10.2 合同管理信息系统	241
9.4.4 合同诉讼的参与人.....	237	10.3 工程合同管理信息系统的分析	243
9.5 合同争议解决途径的选择	238	10.4 工程合同管理信息系统的设计	248
复习思考题	238	复习思考题	248
第 10 章 工程合同管理信息系统	240		
10.1 概述	240		

第1章 绪 论

教学提示: 合同是规范和调整平等主体间民事权利义务关系的工具,也是开展工程项目管理活动的法律依据。合同关系一般由主体、内容和客体这3个要素组成。

教学要求: 本章让学生了解合同的基本概念及其法律特征,掌握合同关系的3个构成要素及其合同的分类,通过本章的学习,让学生初步了解合同在工程项目管理中的地位与作用。

1.1 合同的概念

合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。

合同也常常称为契约,新中国建立以前,著述中都使用“契约”而不使用“合同”一词。

自20世纪50年代初期至今,除台湾地区之外,我国民事立法和司法实践中主要采用了合同而不是契约的概念。

合同是反映交易的法律形式,合同具有以下法律特征:

- (1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。
- (2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
- (3) 合同是当事人意思表示一致的协议。

合同是债的一种形式。所谓债是指发生在特定主体之间请求为特定行为的财产法律关系。民法通则第八十四条规定:债是按照合同的约定或依照法律的规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人,负有义务的人是债务人。在债的法律关系中,债权人有权要求债务人按照法律或合同的规定履行义务,而债务人负有为满足债权人的请求而为特定行为的义务。由于合同反映的只是正常的、典型的商品交换关系,而在实践中还存在一些非正常的、特殊的交换关系,如不当得利和侵权行为所产生之债等,都不能为合同之债所概括。因此,合同不能概括债的全部内容。债的关系较之于合同的关系而言更为抽象,它包括合同关系在内。

合同是发生在当事人之间的一种法律关系。合同关系和一般民事法律关系一样,也是由主体、内容和客体这3个要素组成。

合同关系的主体又称为合同的当事人,包括债权人和债务人。

合同关系的主体都是特定的,如甲和乙签订某项合同,甲和乙都是特定的主体。但是,合同关系的主体也不是固定不变的,依照法律和合同的规定,债可以发生变更和转移,从而使债的主体也会发生变化。例如,甲开发某高层商住楼,后因开发商甲的资金筹措出现困难,经与丙开发商协商,转让该项目的开发权,此时,丙又成为该高层商住楼施工合同

新的主体。

合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务，主要是指合同债权和合同债务。合同作为一种民事法律关系，是债权和债务的统一体。

合同关系的客体在我国民法学界有不同的观点，有的学者认为合同关系客体的内涵是物，也有学者认为合同关系客体的内涵主要不是物，而是行为。

般来说，物权的客体是物，而合同债权的客体主要是行为。因为债权人在债务人尚未交付标的物之前，无法实际占有和支配该标的物，只能请求债务人为一定的行为。因此，合同债权指向的对象主要是债务人的行为而非物。

合同关系具有相对性。所谓合同关系的相对性，是指合同关系只能发生在特定的合同当事人之间，只有合同当事人一方能够向另一方基于合同提出请求或提起诉讼；与合同当事人没有发生合同权利义务关系的第三人不能依据合同向合同当事人提出请求或提起诉讼，也不应承担合同的义务或责任；非依法律或合同规定，第三人不能主张合同上的权利。

1.2 合同的分类

合同按不同的标准，可以作出如下不同的分类：

- (1) 双务合同与单务合同。
- (2) 有偿合同与无偿合同。
- (3) 有名合同与无名合同。
- (4) 诺成合同与实践合同。
- (5) 要式合同与不要式合同。
- (6) 主合同与从合同。
- (7) 本约(本合同)与预约(预备合同)。
- (8) 为订约人自己订立的合同与为第三人利益订立的合同。

1.2.1 双务合同与单务合同

根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可划分为双务合同与单务合同。

1. 双务合同

双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。

双务合同的特点在于当事人具有履行义务的责任和要求他方履行义务的权利，双方的关系具有相互依赖性。

典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等。

建设工程的各类合同均为双务合同。如建设工程施工承包合同中，甲方享有获得合格的建筑产品的权利和按时支付工程进度款的义务，乙方则享有获得工程进度款的权利和按施工图纸及相关标准规范提供合格建筑产品的义务。

2. 单务合同

单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享

受权利的合同。

典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。

区分单务合同与双务合同的意义，主要在于确定两种合同的不同效力。即：

1) 是否适用同时履行抗辩权

双务合同中存在同时履行抗辩等法律问题，单务合同中，不存在此一法律问题，因为履行抗辩是以双方均负有义务为前提的。

2) 在风险负担上不同

单务合同中不发生双务合同中的风险负担问题。

3) 因一方的过错可致合同不履行的后果不同

在双务合同中，如果非违约方已履行合同的，可以要求违约方履行合同或承担其他违约责任；如果非违约方要求解除合同，则对于其已经履行的部分有权要求未履行给付义务的一方返还其已取得的财产。但在单务合同中，不存在上述情况。

1.2.2 有偿合同与无偿合同

根据当事人是否可以从合同中获取某种利益，可以将合同分为有偿合同与无偿合同。

有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。

有偿合同是商品交换最典型的法律形式。在实践中，绝大多数反映交易关系的合同都是有偿的。

无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。

无偿合同并不是反映交易关系的典型形式，它是等价有偿原则在实践中的例外现象，一般很少采用。

各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。

1.2.3 有名合同与无名合同

根据法律上是否规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无名合同。

有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。如我国合同法所规定的15类合同，都属于有名合同。

所谓无名合同，又称非典型合同，是指法律上尚未确定一定的名称与规则的合同。

根据合同自由原则，合同当事人可以自由决定合同的内容。

有名合同与无名合同并不是一成不变的，无名合同产生以后，经过一定的发展阶段，其基本内容和特点已经形成，则可以由合同法予以规范，使之成为有名合同。

有名合同与无名合同的区分意义主要在于两者适用的法律规则不同。

对于有名合同，应当直接适用合同法的规定，但在确定无名合同的适用法律时，首先应当考虑适用合同法的一般规则。其次，对于无名合同来说，因其内容可能涉及到有名合同的某些规则，因此，应当比照类似的有名合同的规则，参照合同的经济目的及当事人的意思等进行处理。例如旅游合同，因其包含了运输合同、服务合同、房屋租赁合同等多项有名合同的内容，因此可以类推适用这些有名合同的规则。

1.2.4 诺成合同与实践合同

所谓诺成合同,是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同,即“一诺即成”的合同。

这种合同的特点在于,当事人双方意思表示一致,合同即告成立。

根据合同法规定,具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同,赠与人在赠与财产的权利转移之前不能撤销赠与。

所谓实践合同,是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。在这种合同中仅凭双方当事人的意思表示一致,还不能产生一定的权利义务关系,还必须有一方实际交付标的物的行为,才能产生法律效果。

例如寄存合同,必须要寄存人将寄存的物品交保管人,合同才能成立并生效。

1.2.5 要式合同与不要式合同

根据合同是否应以一定的形式为要件,可将合同分为要式合同与不要式合同。

所谓要式合同,是指必须根据法律规定的形式而成立的合同。

对于一些重要的交易,法律常要求当事人必须采取特定的方式订立合同。例如,中外合资经营企业合同,属于应当由国家批准的合同,只有获得批准时,合同方为成立。抵押合同依法应登记而不登记的,则合同不能产生法律效力。

所谓不要式合同,是指当事人订立的合同依法并不需要采取特定的形式,当事人可以采取口头方式,也可以采取书面形式。

合同除法律有特别规定以外,均为不要式合同。

根据合同自由原则,当事人有权选择合同形式,但对于法律有特别的形式要件规定的,当事人必须遵循法律规定。

要式合同与不要式合同的区别在于,是否应以一定的形式作为合同成立或生效的条件。

1.2.6 主合同与从合同

根据合同相互间的主从关系,可以将合同分为主合同与从合同。

所谓主合同,是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。

所谓从合同,就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。

如建设工程合同中,施工承包合同为主合同,为承包方提供履约担保的合同则为从合同。

从合同的主要特点在于其附属性,即它不能独立存在,必须以主合同的存在并生效为前提。主合同未成立,从合同也不能成立,主合同无效,从合同也无效。

1.2.7 本约与预约

预约是指当事人之间约定将来订立一定合同的合同;本约为履行预约而订立的合同。

预约的效力在于使当事人负有订立本约的义务。如果预约的一方当事人不履行其订立本约的义务,则另一方有权请求法院强制其履行订约义务并承担违约责任。

1.2.8 为订约人自己订立的合同与为第三人利益订立的合同

根据订约人订立合同的目的是否为自己谋取利益,合同可以分为为订约人自己订立的合同与为第三人利益订立的合同。

所谓为订约人自己订立的合同,是指订约当事人订立合同是为自己设定权利,使自己直接取得和享有某种利益。

然而,在特殊情况下,订约当事人并非为了自己设定权利,而是为第三人的利益订立合同,合同将对第三人发生效力,这就是所谓为第三人利益订立的合同。这种为第三人利益订立的合同,其法律特征表现如下:

第一,第三人不是订约当事人,他不必在合同上签字,也不需要通过其代理人参与缔约。

第二,该合同只能给第三者设定权利,而不得为其设定义务。根据民法的一般规则,任何人未经他人同意,不应为他设定义务,擅自为他人设定义务的合同都是无效的。

第三,该合同的订立,事先无须通知或征得第三人的同意。

在现实生活中,大量存在的还是为订约人自己订立的合同。

1.3 合同在工程项目管理中的地位与作用

合同在工程项目管理过程中正在发挥越来越重要的作用,具体来讲,合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面。

1. 合同是工程项目管理的核心

任何一个建设项目的实施,特别是大中型建设项目的实施,都是通过签订一系列的承包合同来实现的。通过对承包范围、价款、工期和质量标准等合同条款的制订和履行,业主可以在合同环境下调控建设项目的运行状态。通过对合同管理目标责任的分解,工程项目的业主还可以规范项目管理机构的内部职能,紧密围绕合同条款开展项目管理工作。

因此,无论是对承包商的管理,还是对项目业主本身的内部管理,合同始终是工程项目的核心。

2. 合同是承包发包双方履行义务、享有权利的法律基础

为保证建设项目的顺利实施,平衡承包发包双方的职责、权利和义务,合理分摊承包发包双方的责任风险,建设工程合同通常界定了承包发包双方基本的权利义务关系。如发包方必须按时支付工程进度款,及时参加隐蔽工程验收和中间验收,及时组织工程竣工验收和办理竣工结算等。承包方则必须按施工图纸和批准的施工组织设计组织施工,向业主提供符合约定质量标准的建筑产品等。合同中明确约定的各项权利和义务是承包发包双方的最高行为准则,是双方履行义务、享有权利的法律基础。

3. 合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据

工程项目通常具有建设周期长、标底金额大、参建单位众多和子项目之间接口复杂等

特点。在合同履行过程中,业主与承包商之间、不同承包商之间、承包商与分包商之间以及业主与材料供应商之间不可避免地产生各种争执和纠纷。而调解处理这些争执和纠纷的主要尺度和依据应是承发包双方在合同中事先作出的各种约定和承诺,如合同的索赔与反索赔条款、不可抗力条款、合同价款调整变更条款等。作为合同的一种特定类型,建设工程合同同样具有一经签订即具有法律效力的属性。所以,合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。

复习思考题

1. 简述合同的概念及其法律特征。
2. 简述债权人与债务人的含义。
3. 简述合同关系的内涵。
4. 简述双务合同与单务合同的概念。
5. 简述有偿合同与无偿合同的概念。
6. 简述有名合同与无名合同的概念。
7. 简述诺成合同与实践合同的概念。
8. 简述要式合同与不要式合同的概念。
9. 简述主合同与从合同的概念。
10. 分析合同在工程项目管理中的地位与作用。

第2章 合同法基本概念

教学提示: 合同法是我国社会主义经济法律体系中的一项重要法律文本,是调整平等主体间财产流转关系的法律规范。合同法的基本概念和内涵,是学习工程合同知识的基础。准确掌握合同法的基础知识,对于后续章节的学习具有重要意义。

教学要求: 通过本章教学应使学生了解我国现行合同法律制度的基本内容。重点掌握合同成立的基本要件,合同生效的基本要件,合同履行的基本原则,合同保全的基本方法,合同权利义务的变更与转让及违约责任构成要件。

2.1 合同法概述

2.1.1 我国统一合同法的制定及其特点

1999年3月19日,第九届全国人民代表大会第二次会议审议通过了《中华人民共和国合同法》,从1993年开始设计立法方案到合同法正式颁布,历经6年的风雨历程,终于形成了一部统一的正式合同法律文本。

在此之前,我国的合同法律体系是以民法通则为基础法,经济合同法、涉外经济合同法和技术合同法三法并立。

为什么要用新的统一的合同法取代已经存在的三部合同法呢?

其主要原因是随着我国经济建设领域改革开放的不断深入和扩大,经济社会得到全面发展,三部合同法包括修订后的经济合同法不能较好地解决我国经济社会发展中存在的诸多重要问题,具体表现在以下几个方面:

(1) 三部合同法各自规范不同的合同关系和适用范围,特别是存在着国内和涉外两种合同法,彼此之间内容重复,存在互不相协调甚至不一致的情况。

(2) 部合同法规定的内容较为原则。原三部合同法条款总计具有一百四十五条,比较简略,在合同订立、合同效力和违约责任等方面规定较为原则,可操作性不强。

(3) 还保留了过分强调计划经济和旧的合同法的一些规则,对合同当事人限制太多,遗漏了许多重要制度。

(4) 在现实社会生活中利用合同形式搞欺诈,损害国家、集体和他人利益的现象较为突出,需要有针对性地规定防范条款。

(5) 部合同法现有调整范围不能完全适应社会经济生活的现状。实践中出现了新的融资租赁合同及其他合同形式需要加以规范,赠与合同、委托合同、居间合同的数量不断增多。

为了有效地解决上述问题,制定一部统一的、较为完备的合同法势在必行。为此我国最高立法机关——全国人大常委会作出了制定统一合同法的决策。

统一合同法具有以下5个方面的特点:

(1) 从实际出发,充分体现了贯彻了总结本国立法经验与借鉴国外立法经验相结合的原则。

- (2) 充分体现了合同意思自治原则。
- (3) 在价值取向上兼顾经济利益与社会公正、交易便捷与交易安全。
- (4) 充分体现了合同法制定和实施的时代特点。
- (5) 特别注重法律的规范性与可操作性。

2.1.2 合同法的立法宗旨

我国合同法的立法宗旨，主要体现在以下3个方面：

1. 保护合同当事人的合法权益

保护当事人的合法权益，是合同法立法宗旨之一，也是合同法的主要任务。

根据合同法的规定，自然人、法人、其他组织都可以成为合同当事人；合同当事人在参加合同活动中，依法享有权利和利益，合同法对合同当事人的合法权益的保护体现在各项合同法律制度之中。

2. 维护社会经济秩序

维护社会经济秩序是合同法立法的又一重要宗旨。社会经济的运行需要有完备的市场经济法律制度来规范经济活动主体的行为，否则将处于无序状态。

合同法作为调整财产交易关系的法律，必须要以维护社会经济秩序，特别是交易秩序为其基本任务。

3. 促进社会主义现代化建设

合同法作为一部体现了人民意志，反映了市场经济共同规律，适应改革开放需要的法律文件，对发展社会主义市场经济有直接的推动作用，对实现我国社会主义现代化建设任务有积极的促进作用。

2.1.3 合同法的调整对象

合同法作为调整平等主体间财产流转关系的法律规范，其调整对象主要体现在以下两个方面：

1. 合同法调整的是平等主体之间具有财产内容的社会关系

合同法所揭示的是特定的平等主体之间的关系，在合同法律关系中的双方当事人权利与义务是对等的，这区别于按指令性和服从原则设立的行政合同关系和依照按劳分配原则设立的劳动合同关系，这些不同主体间的关系应分别由行政法和劳动法予以调整；也区别于法人、其他社会组织内部的管理关系，这些不平等主体之间的关系应由公司法等法律予以调整。

在合同法的权利义务关系中，主体的行为总是与一定的财产利益相联系。虽然合同法是民法的重要组成部分，但它只调整平等主体之间的财产关系，有关收养、婚姻、监护身份关系的协议，不适用于合同法。

2. 合同法调整的是平等主体之间以财产流转为特征的社会关系

合同法调整的并非社会中全部的财产关系，而是其中动态的财产关系，就是以财产流

转为特征的社会关系，这是它与物权法的不同之处。

合同法与物权法虽都涉及财产权，但物权法是调整财产支配关系的法律，属于财产归属范畴。因为所有权及整个物权本质上是规定和揭示财产关系的静止状态。而合同法是将有形财产和无形财产从生产领域转移到交换领域，并经过交换领域进入消费领域，其内容表现为移转已占有的财产。

因此，合同法是所有人处分财产或获得财产的重要法律手段。

2.1.4 合同法的基本原则

合同法的基本原则是合同法的主旨和根本准则，也是制定、解释、执行和研究合同法的出发点。

合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。

1. 合同自愿原则

合同自愿原则是指当事人依法享有在缔结合同、选择合同相对人、确定合同内容以及变更和解除合同方面的自由。因此，合同自愿原则又称为合同自由原则。

合同自愿原则主要表现在以下5个方面：

- (1) 当事人有订立合同的自由及选择相对人的自由。
- (2) 当事人有确立合同内容的自由，法律尊重当事人的选择。
- (3) 当事人享有合同形式自由，除法律另有规定的以外，当事人可自主确定以何种形式成立合同。
- (4) 当事人有变更或解除合同的自由，经协商一致，当事人可以随时变更或解除合同。
- (5) 当事人有选择违约补救方式的自由。

2. 诚实信用原则

诚实信用原则是指当事人在民事活动中，应诚实守信，以善意的方式履行其义务，不得滥用权利及规避法律规定或合同约定的义务。

合同法中，诚实信用原则具体体现为：

(1) 在合同订立阶段应遵循诚实信用原则。在合同订立阶段，尽管合同尚未成立，但当事人彼此之间已具有订约上的联系，应依据诚实信用原则，负有忠实、诚实、保密、相互照顾和协助的附随义务。任何一方都不得采用恶意谈判、欺诈等手段牟取不正当利益，并致他人损害，也不得披露和不正当使用他人的商业秘密。

(2) 合同订立后在履行前应遵循诚实信用原则。在合同订立后，尚未履行前，当事人双方都应严守诺言，认真做好各种履约准备。

如果一方有确切的证据证明对方在履约前经营状况严重恶化，或存在其他法定情况，可以依据法律的规定，暂时中止合同的履行，并要求对方提供履约担保。

(3) 合同的履行应遵循诚实信用原则。在合同的履行中，当事人应根据合同的性质、目的及交易习惯履行通知、协助和保密的义务。

(4) 合同终止以后应遵循保密和忠实的义务。在合同关系终止以后，尽管双方当事人不再承担义务，但亦应承担某些必要的附随义务，如保密、忠实等义务。

(5) 合同的解释应遵循诚实信用原则。合同管理实践中,当事人在订立合同时所使用的文字词句可能有所不当,未能将其真实意思表达清楚,或合同未能明确各自的权利义务关系,使合同难以正确履行,从而发生纠纷,此时法院或仲裁机构应依据诚实信用原则,考虑各种因素以探求当事人的真实意思,并正确地解释合同,从而判明是非,确定责任。

3. 合法原则

我国合同法确认了合法原则,这保障了当事人所订立的合同符合国家的意志和社会公共利益,协调不同当事人之前的利益冲突,以及当事人的个别利益与整个社会和国家利益的冲突,保护正常的交易秩序。

合法原则是基本的民事活动准则,合法原则具体包括以下几点:

(1) 合法原则首先要求当事人在订约和履行中必须遵守全国性的法律和行政法规。

(2) 在合同订立方面,尽管我国合同法没有采纳计划原则,在实践中当事人也极少按照指令性计划订立合同,但在特殊情况下,国家也可能会给有关企业下达指令性任务或订货任务,而合同当事人不得拒绝依据指令性计划和订货任务的要求订立合同。

(3) 合法原则还包括当事人必须遵守社会公德,不得违背社会公共利益。

4. 鼓励交易原则

鼓励交易,指鼓励合法、自愿的交易。鼓励交易原则在合同法中主要体现在以下两个方面:

1) 减少了无效合同的范围

在因违法而无效合同中,合同法规定,只有违反了法律、行政法规中的强制性规范,才会导致合同无效;并非违反任何规范性文件均可导致合同无效。

过去的合同立法关于无效合同的概念的规定是十分宽泛的,从而导致合同过多地被宣告无效。而合同一旦被宣告无效,则意味着消灭了一项交易,即使当事人希望使其继续有效也不可能。尤其是一旦合同被宣告无效后,就要按照恢复原状的原则在当事人之间产生相互返还已经履行的财产或赔偿损失的责任,将会增加不必要的返还费用,从而造成财产的损失和浪费。从效率的标准来看,过多地宣告合同无效或解除,在经济上是低效率的。

2) 减少了无效合同的类型

过去的合同立法没有区分无效合同和可撤销合同,导致无效合同的类型过多。合同法理顺了无效合同和可撤销合同的范围,增加了可撤销合同的类型,减少了无效合同的类型。

2.1.5 合同法的结构体系

合同法由总则、分则和附则三大部分组成,共23章428条。各部分的具体内容如下:

总 则

第一章 一般规定

第二章 合同的订立

第三章 合同的效力

第四章 合同的履行

第五章 合同的变更和转让

第六章 合同的权利义务终止

第七章 违约责任

第八章 其他规定

分 则

第九章 买卖合同

第十章 供用电、水、气、热力合同

第十一章 赠与合同

第十二章 借款合同

第十三章 租赁合同

第十四章 融资租赁合同

第十五章 承揽合同

第十六章 建设工程合同

第十七章 运输合同

第十八章 技术合同

第十九章 保管合同

第二十章 仓储合同

第二十一章 委托合同

第二十二章 行纪合同

第二十三章 居间合同

附 则

其中，合同法总则部分共8章229条，分则部分共15章198条，附则部分共1条。

2.2 合同的成立

2.2.1 合同成立的概念和要件

合同成立是指当事人就合同主要条款达成了合意。

合同成立需要具备以下几个条件：

(1) 存在双方或多方订约当事人。一个人无法成立合同。

(2) 订约当事人对主要条款达成合意。合同的实质在于当事人的意思达成一致，合意的达成是合同成立的根本。

(3) 合同成立一般要经过要约和承诺阶段。

除以上基本条件之外，合同因性质的不同，还可能还有其他特别成立要件。如实践合同，以标的物的实际支付为成立要件。

2.2.2 要约

1. 要约的概念和特征

要约是希望和他人订立合同的意思表示。

要约发出后，非依法律规定或受要约人同意，不得变更、撤销要约的内容。

要约应具备以下条件:

- (1) 要约是由具有缔约能力的特定人作出的意思表示。
 - (2) 要约必须具有订立合同的意图。
 - (3) 要约须向要约人希望与其缔结合同的人发出。
 - (4) 要约的内容必须具体明确。
- 在建设工程招标投标活动中, 投标人向招标人递交投标书是一种要约。

2. 要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示, 该意思表示人不受要约邀请的约束。合同法中规定下列行为属于要约邀请:

- (1) 寄送的价目表。
- (2) 拍卖公告。
- (3) 招标公告。
- (4) 招股说明书。
- (5) 商业广告。但商业广告具备要约条件的构成要约。

3. 要约的法律效力

要约的法律效力又称要约的约束力。要约到达受要约人时生效。

要约的法律效力表现在两个方面:

- (1) 对要约人的拘束力。要约一经生效, 要约人不得随意撤销、变更要约。
- (2) 对受要约人的效力。要约使受要约人得到了承诺的权利。受要约人对要约同意的意思表示可使合同成立。只有受要约人才有承诺的资格, 受要约人可以承诺, 但不可以将承诺的资格让与他人。

要约可以撤回, 要约撤回是指要约人在要约生效前, 取消要约的意思表示, 撤回要约的通知应当先于或与要约同时到达受要约人。

要约也可以撤销, 要约撤销是指要约生效后, 要约人取消要约使其效力归于消灭。

撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺之前到达受要约人。但是, 如果要约中规定了承诺期限或者以其他形式表明要约是不可撤销的, 或者受要约人有理由认为要约是不可撤销的, 并已经为履行合同做准备工作, 则要约不可撤销。

如建设工程招标投标活动中, 根据招标投标法的规定, 投标人在开标前可以撤销、变更要约, 但开标后不得撤销和变更要约, 否则, 招标人可依法没收其投标保证金。

4. 要约的失效

要约失效是指要约法律效力的消灭。

要约失效后, 要约人不再受拘束, 受要约人也失去了承诺的资格。

要约失效的原因主要有以下几种:

- (1) 拒绝要约的通知到达受要约人。
- (2) 要约人依法撤销要约。
- (3) 承诺期限届满, 受要约人未作出承诺。
- (4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更。

合同法规定,有关合同标的、数量、质量、价格或者报酬、履行期限、履行地点和方法、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。

2.2.3 承诺

1. 承诺的概念和要件

承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺必须具备以下条件:

- (1) 承诺必须由受要约人向要约人作出。
- (2) 承诺必须在规定的期限内到达要约人。
- (3) 承诺的内容必须与要约的内容一致,但法律并未要求其绝对一致时,承诺可以对要约作出非实质性变更。
- (4) 承诺的方式须符合要约的要求。

2. 承诺的效力

承诺的效力在于使合同成立。合同法规定,承诺生效时,合同成立。

合同在承诺到达要约人时生效,即采用到达主义,这是大陆法系的传统。英美法系采用发信主义。发信主义和到达主义的本质区别在于承诺通知在途风险的分配。

发信主义是将此种风险分配给要约人承担。

到达主义是将此种风险分配给承诺人承担。

3. 承诺迟延和承诺撤回

承诺迟延是指受要约人所作承诺未在期限内到达要约人。这包括受要约人在承诺期限届满后发出承诺而使承诺延迟,以及受要约人在承诺期内发出承诺,但因其他原因而使承诺迟到两种情况。

合同法规定,受要约人超过承诺期限发出承诺的,除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新要约。

受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情形能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的,除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外,该承诺有效。

承诺可以撤回,撤回应是在承诺生效之前,因而撤回承诺的通知必须在承诺通知到达要约人之前或承诺同时到达要约人。此时,允许承诺人撤回承诺,不会损及要约人的利益。

合同法规定,当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书,签订确认书时合同成立。

当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

4. 合同成立的时间和地点

合同成立的时间是由承诺实际生效的时间决定的。通常情况下,承诺生效时合同成立,即承诺到达要约人时,合同成立。

合同成立的地点为承诺生效的地点,当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的,其经常居住地为合同成立的地点。

2.2.4 缔约过失责任

缔约过失责任是指合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所应承担的责任。

如甲乙双方在谈判过程中，甲向乙承诺如果乙不与丙订约，则甲将向乙正式签订合作合同。乙方信赖甲的承诺而未与丙订约，但甲最终拒绝与乙订约从而使乙遭受损失，这就是一种典型的缔约过失责任，应当由甲承担此缔约过失责任。

缔约过失责任具有以下法律特征：

(1) 此种责任发生在合同订立阶段，合同尚未成立，或虽成立，但被确认无效或者撤销。

(2) 一方违反了依诚信原则而产生的义务。此种义务不是约定义务，而是一种法定义务。

(3) 造成了另一方信赖利益损失，此种损失基于信赖而发生。

所谓信赖利益损失，主要是指一方实施某种行为后，另一方对此产生了信赖(如信任其会订立合同)，并因此而支付了一定的费用，因一方违反诚信原则使该费用不能得到补偿。

缔约过失责任主要有以下几种类型：

(1) 假借订立合同，恶意进行磋商。

(2) 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况。

(3) 泄露或不正当使用他人商业秘密。如产品的性能、销售对象、市场营销情况及技术诀窍等。

(4) 其他违背诚实信用原则的行为。

在上述几种情况下，一方必须给另一方造成损失，才应负缔约过失责任。

缔约过失责任不同于合同违约责任，缔约过失责任发生在合同订立过程中，合同尚未成立，或虽成立但被确认无效或者撤销。而合同违约责任发生在合同成立和生效以后。

2.3 合同的主要内容与形式

2.3.1 合同的条款

合同的内容表现为合同的条款，合同条款确定了当事人各方的权利义务。

1. 提示性合同条款

合同法第十二条列举了合同一般包含的条款，以提示缔约人。它包括以下8项基本条款：

(1) 当事人的名称或者姓名和住所。

(2) 标的。

(3) 数量。

(4) 质量。

(5) 价款或者报酬。

(6) 履行期限、地点和方式。

- (7) 违约责任。
- (8) 解决争议的方法。

2. 合同的主要条款

合同的主要条款是指合同必须具备的条款,如果欠缺它合同就不成立。

如合同法规定,借款合同应有借款币种的条款,该条款即为借款合同的主要条款。建设工程施工合同应有建设工期、工程质量和工程造价条款,这些条款即为施工合同的主要条款。

不同类型的合同,其主要条款也不相同。合同主要条款的个性化色彩很浓,法律上不宜对此作统一规定,而应根据不同的合同加以判断。

3. 合同的普通条款

合同的普通条款是指合同主要条款以外的条款,它包括以下几种类型:

(1) 法律未直接规定,亦非合同的类型和性质要求必须具备的,合同当事人无意使之成为主要合同条款。

如关于包装物返还的约定;建设工程施工合同中关于安全防护、环境保护和卫生防疫的约定。

(2) 当事人未写入合同中,甚至从未协商过,但基于当事人的行为,或基于合同的明示条款,或基于法律规定,理应存在的合同条款。英美合同法称之为默示条款。它分为以下种类:

① 该条款是实现合同目的及作用所必不可少的,只有推定其存在,合同才能达到目的及实现其功能。

② 该条款对于经营习惯来说是不言而喻的,即它的内容实际上是公认的商业习惯或经营习惯。

如销售合同履行中的验货环节,即使合同条款中未予明确,按照商业惯例,卖方在提交标的物时,应由买方或第三方验货。

③ 该条款是合同当事人系列交易的惯有规则。

系列交易中的合同条款同样适用于后续交易活动,即使后续交易未明确予以规定。

④ 该条款实际上是某种特定的行业规则,即某些明示或约定俗成的交易规则在行业内具有了不言自明的默示效力。

⑤ 直接根据法律规定而成为合同的普通条款。

如合同法第二百五十二条第一款规定,承揽人应当以自己的设备、技术和劳力,完成其主要工作,但当事人另有约定的除外。当事人对此未作任何约定时,该法律规定即成为合同的普通条款。

施工承包合同纠纷中,出现过下述典型案例:

某施工承包单位在项目施工过程中,为抢回因自身责任延误的工期,自行从设备租赁公司租一台起重机投入现场吊装工作,并在工程完成后为此向业主提出起重机台班费用索赔。很显然,尽管合同中对此类问题未予约定,但按照合同法规定,不应给予补偿。

2.3.2 合同权利与合同义务

合同的内容,从合同关系的角度讲,是指合同权利和合同义务。它们主要由合同条款加以确定,有些则由法律规定而产生。

1. 合同权利

合同权利又称合同债权，是指债权人根据法律和合同的规定向债务人请求给付并予以保有的权利。

合同债权具有以下特征：

1) 合同债权是请求权

权利体现为请求，而非支配，债权人在债务人给付之前，不能直接支配给付客体，也不能直接支配债务人的给付行为或人身，只能通过请求债务人履行来实现自己的权利。

如建设工程施工合同履行过程中，开发商作为债权人在工程尚未竣工交付之前，不能直接支配该工程，根据现有建设工程施工合同示范文本的规定，发包人中途占用尚未竣工的项目的，其造成的一切后果由发包人承担。

2) 合同债权是给付受领权

权利的基本思想在于将某种利益在法律上归属某人，合同债权的本质内容就是有效地受领债务人的给付，将该给付归属于债权人。

3) 合同债权是相对权

合同关系具有相对性，合同债权人仅得向合同债务人请求给付，无权向一般不特定人请求给付，因此，合同债权为相对权。

4) 合同债权具有平等性

在同一客体之上存在数个债权时，各债权平等，不存在谁优先于谁的问题。在不能足额受偿时，应按债权比例平均受偿。

5) 合同债权具有请求力、执行力、依法自力实现、处分权能和保持力

执行力是指债权人依生效判决，请求法院对债务人实施强制执行的效力。

依法自力实现，是指合同债权受到侵害或妨碍，情势紧迫而又不能及时请示国家机关予以救济的情况下，债权人自行救助，扣押债务人财产的效力。

处分权能是指债权人享有对债权本身的处分权，可放弃或转让债权等，作出对债权的有效处分行为。

保持力是指债务人自动或受法律的强制而提出给付时，债权人得保有该给付的效力。

2. 合同义务

合同义务包括给付义务和附随义务。给付义务分为主给付义务与从给付义务。

1) 主给付义务

主给付义务，简称主义务，是指合同关系所固有、必备，并用以决定合同类型的基本义务。

如买卖合同中，出卖人负有交付买卖物及转移其所有权的义务，买受人负有支付合同价款的义务，这两种义务均为主给付义务。

2) 从给付义务

从给付义务，简称从义务。此类义务不具有独立意义，仅具有辅助主给付义务的功能，其存在的目的在于决定合同的类型，而在于确保债权人的利益能够获得最大满足。

从给付义务发生的原因可归纳为如下几个方面：

(1) 基于法律的明文规定。如合同法第二百六十六条规定，承揽人应当按照定作人的

要求保守秘密, 未经定作人许可, 不得留存复制品或者技术资料。

(2) 基于当事人的约定, 如 A 企业兼并 B 企业, 约定 B 企业应提供全部客户关系资料。

(3) 基于诚实信用原则。如汽车销售商应交付必要的用户手册等文件。

3) 附随义务

附随义务是指随着合同关系的发展而不断形成的, 它在任何合同关系中均可能发生, 不局限于某一特定的合同类型。

同主给付义务不同, 当不履行附随义务时, 债权人原则上不得解除合同, 但可就其所受损害, 依不完全履行规定请求损害赔偿。而不履行主给付义务, 债权人可解除合同。

如工程技术人员不得泄露公司开发新产品的技术秘密(保密义务); 出卖人在标的物交付前应妥善保管该物品(保管义务); 技术受让方应提供安装设备所必要的物质条件(协助义务)等。

2.3.3 合同的形式

合同形式是合同当事人合意的表现形式。合同法规定的合同形式有书面形式、口头形式和其他形式。法律和行政规章规定采用书面形式的, 应采用书面形式。

1. 书面形式

书面形式是指以文字表现当事人所订立合同的形式。合同书、信件以及数据电文(包括电传、电子邮件、传真、电报和电子数据交换等)可以有形地表现所载内容的形式, 均属于书面形式。

关于公证、鉴证、登记和审批是属于合同的书面形式范畴, 还是合同的生效要件, 我国法学界尚存在争议。目前较为一致的说法是: 公证、鉴证、登记和审批不宜作为合同的生效要件, 因为合同是当事人各方的合意, 公证、鉴证、登记和审批则是当事人合意之外的因素, 不属于合同成立要件的范畴, 而属于效力评价领域。

2. 口头形式

口头形式是指当事人只用语言为意思表示订立合同, 而不是用文字表述协议内容的形式。

采用口头形式订立合同具有快速便捷的优点, 其缺点是发生合同纠纷时难以举证。

3. 推定形式

除书面形式和口头形式之外, 当事人还可以通过自己的行为成立合同。即当事人仅用行为向对方发出要约, 对方接受该要约, 做出一定或指定的行为作为承诺, 合同即宣告成立。

2.4 合同的效力

2.4.1 合同生效与合同成立

1. 合同生效的概念

所谓合同生效, 是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力, 也就是通常所说的法律效力。

2. 合同成立与生效的区别

合同法第四十四条规定：依法成立的合同，自成立时生效。正是因为这一原因，我国法律和司法实践中，长期以来没有区分合同成立与生效的问题，也没有进一步区分合同的不成立和无效问题。

尽管合法的合同一旦成立便产生效力，但合同的成立与合同的生效仍然是两个不同的概念，应当在法律上严格区分。

所谓合同的成立，是指缔约当事人就合同的主要条款达成合意，但合同的成立只是解决了当事人之间是否存在合意的问题，并不意味着已经成立的合同都能产生法律拘束力，换言之，即使合同已经成立，如果不符合法律规定的生效要件，仍然不能产生法律效力。

合法合同从合同成立时起具有法律效力，而违法合同虽然成立但不会发生法律效力。由此可见，合同成立后并不是当然生效的，合同是否生效，主要取决于其是否符合国家的意志和社会公共利益。

2.4.2 合同的生效要件

已经成立的合同，必须具备一定的生效要件，才能产生法律拘束力，合同的生效要件是判断合同是否具有法律效力的标准。

合同的一般生效要件包括下列 4 个条件：

- (1) 行为人具有相应的民事行为能力。
- (2) 意思表示真实。
- (3) 不违反法律和社会公共利益。
- (4) 合同必须具备法律所要求的形式。

1. 行为人具有相应的民事行为能力

行为人具有相应的民事行为能力的要件，通常又称为有行为能力原则或主体合格的原则。

由于任何合同都是以当事人的意思表示为基础，并且以产生一定的法律效果为目的。因此，行为人必须具备正确地理解自己的行为性质和后果、独立地表达自己意思的能力。不具备相应的民事行为能力，就不能相应地独立进行意思表示，即使订立了合同也将会使自己遭受损失。因此，各国民法人都将行为人有无行为能力作为区别法律行为有效和无效的条件。如我国民法通则规定：10 岁以上的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人是限制民事行为能力人。未满 10 周岁的未成年人和不能辨认自己行为的精神病人是无行为能力人，他们的民事活动需由其法定代理人代理进行。

2. 意思表示真实

所谓意思表示真实，是指表意人的表示行为应当真实地反映其内心的效果意思。

效果意思是指意思表示人欲使其表示内容引起法律上效力的内在意思要素，在不同的国家它又被称为“效力意思”、“法效意思”、“设立法律关系的意图”等。表示行为是指行为人将其内在意思以一定的方式表示于外部，并足以外界所客观理解的要素。

意思表示真实要求表示行为应当与效果意思相一致。

在大多数情况下，行为人表示于外部的意思同其内心真实意思是一致的。但有时行为

人作出的意思表示与其真实意思不相符合,例如:A单位拟同B单位签订供货合同,因B单位产品价格过高,本不想签约,但迫于B单位的压力或威胁不得已而与之签订了供货合同。此种情况称为“非真实的意思表示”、“意思缺乏”或“意思表示不真实”。

般以为,在意思表示不真实的情况下,一方面,不能仅以行为人的外部表示为根据,而不考虑行为人的内心意思。如行为人在受胁迫、受欺诈的情况下作出的意思表示,与其真实意志完全不符。如果不考虑行为人的真实意志,而使其外部的意思表示有效,并认为因欺诈、胁迫等订立的合同有效,既不利于保护行为人的利益,也会纵容胁迫、欺诈等违法行为,而且会破坏法律秩序。另一方面,也不能仅以行为人的内心意思为依据,而不考虑行为人的外部表示。因为行为人的内心意思往往是局外人无从考察的,如果行为人随时以意思表示不真实为理由主张合同无效,就会使合同的效力随时受到影响,使对方当事人利益受到损害。所以,在合同成立后,任何当事人都不能借口自己考虑不周、估计不足、不了解市场行情等原因而推翻合同效力。

合同一旦成立,就要在当事人之间产生拘束力,如果当事人是在被胁迫、受欺诈以及重大误解等法律规定的情形下作出的与其真实意思不符的意思表示,那么,根据法律规定,可以由人民法院或者仲裁机关依法撤销该行为,并根据情况追究过错的一方或双方当事人的责任。

3. 不违反法律和社会公共利益

不违反法律是指不违反法律和行政法规的强制性规定。不违反社会公共利益,就是指不违反公序良俗。

4. 合同必须具备法律所要求的形式

当事人可以选择合同所采用的形式,但如果法律对合同形式有特殊规定的,应当遵守法律的规定。

《合同法》第四十四条规定:法律、行政法规规定应当办理批准、登记手续生效的,依照其规定。

2.4.3 附条件和附期限合同

1. 附条件合同

附条件合同是指合同当事人在合同中约定一定的条件,并将条件的成立与否作为合同效力发生或消灭根据的合同。

附条件合同中所附条件应符合以下要求:

- (1) 条件必须是将来发生的事实,已发生的事实不能作为条件。
- (2) 条件是 uncertain 的事实,其将来发生与否不能确定。不可能发生的或者必然发生的事实不能作为条件。
- (3) 条件是由当事人约定的事实,而非法律规定的条件。
- (4) 条件必须合法。违法或者违背社会公德的事实不能作为合同的条件。
- (5) 条件不得与合同的主要内容相矛盾。

2. 附期限合同

附期限合同是指当事人在合同中设定一定的期限,并把期限的到来作为合同效力发生

或消灭根据的合同。

附期限合同和附条件合同不同，合同所附期限是必然到来的，而所附条件却是发生与否不确定的。

期限可分为始期和终期。

始期是合同效力发生的期限，又称生效期限。

终期是指合同效力终止的期限，又称为解除期限。

建设工程施工合同中虽然附了合同工期，但它不属于附期限合同的范畴，因为合同工期不影响合同效力的发生或消灭。

2.4.4 效力待定合同

1. 效力待定合同的概念

效力待定合同是指虽已成立，但是否发生法律效力尚不确定的合同。

该类合同的效力处于悬而未决状态，它欠缺权利人的同意，经权利人追认方可自始有效，权利人拒绝追认，合同归于无效。

2. 效力待定合同的类型

效力待定合同主要包括以下3种类型：

- (1) 限制民事行为能力人订立的依法不能独立订立的合同。
- (2) 无权代理订立的合同。
- (3) 无权处分合同。

其中无权代理主要有以下几种情况：

- ① 根本无权代理。
- ② 授权行为无效的代理。
- ③ 超越代理权范围进行的代理。
- ④ 代理权消灭以后的代理。

无权处分行为系指无处分权人处分他人财产而订立的合同。合同法第九十一条规定：无处分权人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

2.4.5 无效合同

1. 无效合同的概念

无效合同是指欠缺合同生效要件，虽已成立却不能依当事人意思发生法律效力。无效合同具有如下特征：

- (1) 无效合同的违法性。
- (2) 对无效合同的国家干预。
- (3) 无效合同具有不得履行性。
- (4) 无效合同自始无效。

2. 无效合同的范围

根据合同法规定，无效合同的范围主要包括以下几种：

- (1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。
- (2) 恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。
- (3) 以合法形式掩盖非法目的。
- (4) 损害社会公共利益。
- (5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

2.4.6 可撤销合同

1. 可撤销合同的概念和特征

可撤销合同，又称为可撤销、可变更的合同，它是指当事人在订立合同时，因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权而使已经生效的合同归于无效。

例如，因重大误解而订立的合同，误解的一方有权请求法院撤销该合同。

可撤销合同与无效合同是不同的，其法律特征表现为：

- (1) 可撤销合同主要是意思表示不真实的合同。
- (2) 必须由撤销权人主动行使撤销权，请求撤销合同。
- (3) 可撤销合同在未被撤销以前仍然是有效的。
- (4) 可撤销合同在民法通则中称为可变更、可撤销的合同，也就是说此类合同，撤销权人有权请求予以撤销，也可以不要求撤销，而仅要求变更合同的内容。

2. 撤销权的行使

撤销权通常由因意思表示不真实而受损害的一方当事人享有，如重大误解中的误解人、显失公平中的遭受重大不利的一方。

撤销权的行使，不一定必须通过诉讼的方式。如果撤销权人主动向对方作出撤销的意思表示，而对方未表示异议，则可以直接发生撤销合同的后果；如果对撤销问题，双方发生争议，则必须提起诉讼或仲裁，要求人民法院或仲裁机构予以裁决。

撤销权人有权提出变更合同，从鼓励交易的需要出发，合同法第五十四条规定：当事人请求变更的，人民法院或仲裁机构不得撤销。因此，请求变更的权利也是撤销权人享有的一项权利。

撤销权人必须在规定的期限内行使撤销权。合同法第五十五条规定：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权或具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权，则撤销权消灭。之所以规定撤销权的行使期限，是为了防止一些合同的效力长期处于不稳定状态，不利于社会经济秩序的稳定。

3. 可撤销合同的种类

可撤销合同通常包括以下4种类型：

- (1) 因重大误解订立的合同。
- (2) 在订立合同时显失公平的。
- (3) 因欺诈、胁迫而订立的合同。
- (4) 乘人之危订立的合同。

所谓重大误解，是指一方因自己的过错而对合同的内容等发生误解，订立了合同。误

解直接影响到当事人所应享有的权利和承担的义务。误解既可以是单方面的误解，也可以是双方的误解。

显失公平的合同是指一方在订立合同时因情况紧迫或缺乏经验而订立的明显对自己有重大不利的合同。如某人投资额占全部投资的五分之四，但利润的分配比例仅占百分之五，显然这种合作合同是不公平的。

所谓乘人之危，是指行为人利用他人的为难处境或迫切需要，强迫对方接受某种明显不公平的条件并作出违背其真实意志的意思表示。

2.4.7 合同被确认无效或被撤销的后果

合同被确认无效或被撤销的后果有两种，即返还财产和赔偿损失。

1. 返还财产

《合同法》第五十八条规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。

所谓返还财产，是指一方当事人在合同被确认无效或被撤销以后，对其已交付给对方的财产享有返还请求权，而已经接受对方交付的财产的一方当事人则负有返还对方的义务。

2. 赔偿损失

合同法第五十八条规定：合同无效或者被撤销后……，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

2.5 合同的履行

2.5.1 合同的履行概述

合同的履行是指债务人全面地、适当地完成其合同义务，债权人的合同债权得到完全实现。如交付约定的标的物，完成约定的工作并交付工作成果，提供约定的服务等。

合同的履行是合同法律效力的主要内容，而且是整个合同法的核心。

合同的成立是合同履行的前提，合同的法律效力既含有合同履行之意，又是合同履行的依据和动力所在。合同担保是为了促使合同履行，保障债权实现的法律制度。合同的保全可以起到间接强制债务人履行合同的作用。

2.5.2 合同履行的原则

合同履行的原则是合同当事人在履行合同债务时所应遵循的基本准则。这些原则主要包括适当履行原则，协作履行原则，经济合理原则和情事变更原则等。

1. 适当履行原则

适当履行原则，又称正确履行原则或全面履行原则，是指当事人按照合同规定的标的及其质量、数量，由适当的主体在适当的履行期限、履行地点以适当的履行方式，全面完成合同义务的履行原则。

适当履行与实际履行既有区别又有联系。实际履行强调债务人按照合同约定交付标的或者提供服务,至于交付的标的或提供的服务是否适当,则无力顾及。

适当履行既要求债务人实际履行,交付标的物或提供服务,也要求这些交付标的物、提供服务符合法律和合同的规定。

可见,适当履行必然是实际履行,而实际履行未必是适当履行,适当履行场合不会存在违约责任,实际履行不适当时则产生违约责任。

如建设工程施工合同履行过程中,实际履行通常仅限于指承包商完成预定的承包任务,向业主交付已完工程。而适当履行则指承包商不仅要向业主交付工程,而且交付的已完工程必须达到合同约定的质量等级,并且必须是在约定的工期之内交付。

2. 协作履行原则

协作履行原则,是指当事人不仅适当履行自己的合同债务,而且应基于诚实信用原则要求对方当事人协助其履行债务的履行原则。

些特定类型的合同中,合同的履行无债权人的配合将无法进行,因此,要求当事人在履行合同中相互协作,共同促成合同目的的实现。

协助履行一般视为合同债权人的义务。

协作履行原则通常包括以下内容:

(1) 债务人履行合同债务,债权人应适当受领给付。

(2) 债务人履行债务,要求债务人创造必要的条件,提供方便。

如建设工程工地周边居民关系的协调是债权人的一项重要义务,债权人应及时调处矛盾纠纷、处理突发事件。

(3) 因故不能履行或不能完全履行时,应积极采取措施避免或减少损失,否则要就扩大的损失自负其责。

(4) 发生合同纠纷时,应各自主动承担责任,不得推诿。

3. 经济合理原则

经济合理原则要求在履行合同时讲求经济效益,付出最小的成本以取得最佳的合同利益。

《合同法》第一百九十九条规定:当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大所支出的合理费用由违约方承担。

4. 情事变更原则

情事变更原则是指合同依法成立后,因不可归责于双方当事人的原因发生了不可预见的情事变更,致使合同的基础丧失或动摇,若继续维持合同原有效力则显失公平,应允许变更或解除合同。

情事变更原则的适用条件有:

(1) 须有情事变更的事实。

(2) 情事变更须发生在合同成立之后,履行完毕之前。

(3) 情事变更的发生不可归责于当事人,若因当事人原因而发生,则应由其承担相应

责任。

(4) 情事变更是当事人所不可预见的，如果当事人在缔约时能够预见，而当事人仍然订立合同，则表明当事人承担了该风险，不适用情事变更原则。

(5) 情事变更使履行合同显失公平。

情事变更原则正是着眼于情事变更所导致的当事人利益失衡，恢复当事人之间利益平衡是情事变更原则所要达到的目的。因此，没有显失公平状况的出现，就没有情事变更原则的适用。

情事变更的效力体现在两个方面：

(1) 变更合同。当事人可请求变更合同内容，如增减标的数额、延期或分期履行、变更标的物、调整标的价格等。

(2) 解除合同。如果变更合同无法消除显失公平的结果，则当事人可请求解除合同。

2.5.3 双务合同履行中的抗辩权

双务合同履行中的抗辩权，是指在符合法定条件时，当事人一方对抗对方当事人的履行请求权，暂时拒绝履行其债务的权利。双务合同履行中的抗辩权包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权。

双务合同履行中的抗辩权，是合同效力的表现。它们的行使，只是在一定的期限内中止履行合同，并不消灭合同的履行效力，产生抗辩权的原因消失后，债务人仍应履行其债务。

双务合同履行中的抗辩权，对抗辩权人是一种保护，免除其履行后得不到对方履行的风险，使对方当事人产生及时履行、提供担保等压力，因此它们是债权保障的法律制度，其作用比违约责任还积极，亦不逊色于债的担保。

行使抗辩权就是行使自己的合法权利，而非违约，应受法律保护。

1. 同时履行抗辩权

同时履行抗辩权是指双务合同中的当事人没有先后履行顺序的，一方在对方未为对待给付之前，可拒绝履行自己债务的权利。

《合同法》第六十六条规定：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。

一方在对方履行之前有权拒绝履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。

2. 先履行抗辩权

先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行一方未履行之前，后履行一方有权拒绝其履行请求，先履行一方履行债务不符合债的本旨，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

如建设工程施工合同履行过程中，承包方一般负有先履行债务的责任，即完成约定的工程形象进度，而发包方则负有后履行债务的责任，即审查承包方工程进度月报表后及时支付当月工程进度款。若承包方未完成约定的工程形象进度，或虽然完成了约定的工程形象进度，但工程质量不符合要求，则发包方有权拒绝承包方的付款请求。

3. 不安抗辩权

不安抗辩权是指双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。

不安抗辩权不同于同时履行抗辩权，不安抗辩权的享有者为双务合同中有先为给付义务的一方，权利发生的条件是对方有丧失履行能力的可能；而同时履行抗辩权的享有者为没约定先后履行顺序的双务合同中的双方当事人，权利发生的条件为对方尚未履行自己的义务。

不安抗辩权也不同于先履行抗辩权，先履行抗辩权产生于先履行一方不履行或者其履行不符合债的主旨的场合，并不要求他方有难为给付的可能。同时，先履行抗辩权的享有者为后履行义务的一方，而不安抗辩权的享有者是先履行义务的一方。

2.6 合同的保全

2.6.1 合同保全的概念

合同保全是指法律为防止因债务人财产的不当减少而给债权人的债权带来危害，允许债权人行使撤销权或代位权，以保护其债权的制度。

合同保全不同于合同担保。首先，合同保全的作用主要在于防止债务人责任财产的不当减少，而合同担保则是在于增加保障债权实现的责任财产的量，使第三人的财产也成为债权实现的保证，或者使债权人对特定的物享有物权，可通过物权的行使，使债权优先得到实现。其次，合同保全是基于法律的直接规定，债权人的撤销权、代位权，系债权的法定从权利，而合同的担保多基于当事人的约定而设立。另外，合同保全是债权效力的一部分，而合同担保多是在原债之外另行设定了担保之债。

合同保全一般具有以下法律特征：

(1) 合同保全是合同相对性原则的例外。根据合同相对性原则，合同仅在合同当事人之间产生法律效力，合同当事人不可以依合同向第三人主张权利。但依合同保全制度，合同债权人却可以依其与债务人之间的合同，而取得对第三人的影响。可见，合同保全为合同相对性原则的例外。

(2) 合同保全主要发生在合同生效期间。如果合同未成立、无效或已被撤销，则无合同保全的余地。

(3) 合同保全的基本方法是确认债权人享有代位权和撤销权，这两种措施均在于防止债务人财产的不当减少，从而保障债权人债权的实现。

2.6.2 债权人的代位权

1. 代位权的概念

债权人代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人债权造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人债权的权利。

代位权具有以下法律特征：

(1) 代位权是债权人代债务人之位向债务人的债务人主张权利, 因此, 债权人的债权对第三人产生了拘束力, 此项权利为法定权利, 随债的移转和消灭而移转和消灭。

(2) 代位权是债权人以自己名义行使债务人的权利, 代位权不同于代理权。代位权行使的目的在于保全自己的债权, 增大自己债权实现的可能性。

(3) 代位权是债权人请求第三人向债务人履行债务, 而不是请求第三人向自己履行债务。

(4) 代位权的行使必须向法院提起诉讼, 其虽为一种实体权利, 但只能依诉行使。

2. 代位权行使的要件

代位权的行使应符合以下要件:

(1) 债权人与债务人之间必须有合法的债权债务存在。

(2) 债务人对第三人享有到期债权。代位权是债权人代债务人之位而行使其债权, 当债务人的债权不存在时, 无从代位。而在债务人的债权未到期时, 也不能代位行使, 因为此时债务人的债务人享有期限利益。

(3) 债务人怠于行使其权利。所谓怠于行使, 是指应当而且能够行使而不行使。应当行使指若不及时行使, 权利就有可能超过诉讼时效等。所谓能够行使, 是指不存在任何权利行使的障碍。如果债务人已积极向其债务人主张权利或已向法院提起了诉讼, 但由于其债务人的原因而未能实现债权, 则不属于怠于行使。

(4) 债务人怠于行使权利的行为有害于债权人的债权。这主要是指债务人没有其他财产可供清偿, 又不积极行使对第三人的债权, 以获得财产来清偿自己的债务, 从而危及债权人的债权实现。

(5) 债权人代位行使的范围, 应以保全债权的必要为限。代位权行使的目的在于保障债权的实现, 因而代位权的行使不应超出这一目标范围, 代位权的行使范围应以债权人的债权为限。

2.6.3 债权人的撤销权

1. 撤销权的概念

撤销权是指债权人针对债务人滥用其财产处分权而损害债权人的债权的行为, 请求人民法院予以撤销的权利。

合同法第七十四条规定: 因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产, 对债权人造成损害的, 债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产, 对债权人造成损害, 并且受让人知道该情形的, 债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。

撤销权的行使范围以债权为限, 债权人行使撤销权的必要费用由债务人承担, 如诉讼费等。

2. 撤销权行使的构成要件

撤销权的行使必须符合客观要件和主观要件。

客观要件是指客观方面债务人实施了一定有害于债权人债权的行为。此类行为包括放弃到期债权、无偿转让财产和以明显不合理的低价转让财产。

主观要件是指债务人与第三人恶意。恶意是指债务人知道或者应当知道其处分财产的行为将导致其无资产清偿债务，从而有害于债权人的债权，而仍然实施该行为。第三人的恶意指在债务人以明显不合理的低价转让该财产时，第三人知道债务人以明显不合理低价转让财产将对债权人造成损害。如果第三人不知道该情形的，则为善意。

3. 撤销权的行使

撤销权的行使须由享有撤销权的债权人以自己的名义向人民法院提起诉讼，请求人民法院撤销债务人的不当处分财产的行为。

撤销权的行使应注意以下几个问题：

(1) 撤销权的行使范围应以债权人的债权为限。撤销权的行使在于保全债权，因而只能以债权人的债权额为限。否则，就是对债务人过分的干涉。

(2) 关于撤销之诉中的被告。若债务人实施的是单方行为，则应以债务人为被告；若债务人与第三人共同实施行为，则应以债务人和第三人为共同被告。

(3) 撤销权必须在一定期限内行使。《合同法》第七十五条规定：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

2.7 合同变更与转让

2.7.1 合同变更

1. 合同变更概述

合同变更有广义和狭义之分。广义的合同变更包括合同内容的变更与合同主体的变更。合同内容的变更指当事人不变，合同权利义务发生改变。合同主体的变更指合同内容保持不变，仅债权人或债务人发生改变。狭义的合同变更仅指合同内容的变更。

2. 合同变更的效力

合同变更原则上在将来发生效力，未变更的权利义务继续有效，已经履行的债务不因合同的变更而丧失法律依据。

合同变更之后，当事人之间的权利义务须依变更后的合同加以确定。当事人履行合同是否符合条件，也须依变更后的合同加以判断。

2.7.2 合同转让

1. 合同转让概述

合同转让是指合同权利义务的转让，合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人。合同转让包括合同权利的转让、合同义务的转让及合同权利义务的概括转让。

合同转让具有以下法律特征：

(1) 合同转让并不引起合同内容的变化。合同转让只是合同权利义务的归属方的变化，合同权利义务本身并没有发生变化。

(2) 合同转让是合同主体的变化。合同转让是由第三人替代合同当事人一方成为合同当事人,即当事人一方退出合同或第三人进入合同关系。

(3) 合同转让涉及原合同当事人双方之间的权利义务关系、转让人与受让人之间的权利义务关系。

2. 合同权利的转让

合同权利转让是指合同债权人将其合同权利转让给第三人享有。如高速公路收费权的转让,就是一种典型的合同权利的转让。

《合同法》第七十九条规定:债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。在合同权利部分转让的情况下,受让的第三人加入合同关系,与原债权人共享债权,使原合同之债变为多数人之债。在合同权利全部转让的情况下,第三人取代原债权人而成为合同的新债权人,原债权人脱离合同关系。

3. 合同义务的转让

合同义务转让是指不改变合同内容,债务人将其合同义务转移给第三人。

合同义务转让可分为全部转移和部分转移,全部转移是指第三人受让债务而成为合同新的债务人,部分转移则是第三人受让部分债务而加入到合同关系中。

4. 合同权利义务的概括转移

合同权利义务的概括转移,是指合同当事人一方将其合同权利义务一并转移给第三人。第三人取代原当事人成为合同的当事人,债的同一性不变。

合同权利义务的概括转移可基于法律的规定而发生,也可以基于当事人之间的合同行为而发生。合同权利义务的概括转移主要包括以下几种情形:

1) 合同承受

合同承受是指合同一方当事人与第三人订立合同,并以对方当事人同意,将合同中的权利义务一并转移给第三人。非经对方当事人同意,不得将合同中的权利义务一并转移给第三人。

2) 企业合并

企业合并是指两个或两个以上企业合并为一个企业。企业合并可导致合同主体的法定变更,即合同权利义务的概括转移。

《合同法》第九十条规定:当事人订立合同合并后的,则合并后的法人或者其他组织行使合同权利,履行合同义务。

2.8 违约责任

2.8.1 违约责任的概念和特征

违约责任是指合同当事人因违反合同义务而应承担的责任。

《合同法》第一百零七条规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

违约责任具有以下法律特征:

- 1) 违约责任产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
- 2) 违约责任具有相对性

合同关系的相对性决定了责任的相对性,违约责任只能在特定的当事人之间发生,合同之外的当事人不会成为违约责任的主体。

如甲乙之间订立了买卖合同,在甲尚未交付标的物之前,该标的物被丙损毁,致使甲不能向乙交付该标的物。此时,根据违约责任的相对性特征,甲仍然应向乙承担违约责任,而不得以标的物不能交付是因为第三人的侵权行为所致为由,要求免除违约责任。

- 3) 违约责任具有补偿性

违约责任旨在补偿因违约行为所造成的损害,而不是一种惩罚手段,受害人不能因违约方承担责任而获得额外的补偿。一般情况下,当损失小于违约金时,仍按违约金执行;当损失大于违约金时,应补齐差额部分。

- 4) 违约责任可以由当事人约定

违约责任具有一定的任意性,当事人可以在法律规定的范围内对违约责任作出事先的安排。《合同法》第一百一十四条规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损害赔偿额的计算方法。

- 5) 违约责任是民事责任的一种形式

民事责任根据其违反义务的性质不同,可分为违约责任和侵权责任。因此,违约责任是我国民事责任制度的组成部分。

2.8.2 违约责任的构成要件

违约责任的构成要件是指当事人应具备何种条件才应承担违约责任。

违约责任的一般构成要件包括以下内容:

- (1) 违约行为。
 - (2) 不存在法定和约定的免责事由。
- 只有这两个要件同时成立,才可以构成违约责任。

《合同法》第一百一十七条规定:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。但当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任,这里的不可抗力即为法定的免责事由。

除了上述法定的免责事由外,当事人如果约定有免责事由,那么当此免责事由发生时,当事人也可以不承担违约责任。

2.8.3 实际履行与损害赔偿

实际履行是指一方违反合同时,另一方有权要求其依据合同的规定继续履行。

损害赔偿是指违约方对因其不履行或不完全履行合同义务而给对方造成损失所应承担的赔偿责任。

损害赔偿与其他补救方式的区别:

- 1) 损害赔偿与实际履行

实际履行是实现合同目的有效方式,而损害赔偿不能使合同目的实现,只是为当事

人所遭受的损失提供补偿。两者可以并行使用。

2) 损害赔偿与支付违约金

损害赔偿以损失存在为构成要件。但违约责任不需要损失存在。如工程质量未达到合同约定的评定标准,经承包方整改后仍可以交付使用,对建设单位不会造成直接经济损失。但建设工程一次交验不合格,属承包方的违约行为,应当支付违约金。

违约金与损害赔偿也可以并行使用,当违约金不足以弥补损失时,还应赔偿损失。

损害赔偿应遵循完全赔偿原则。所谓完全赔偿原则,是指因违约而使受害人遭受的全部损失都应当由违约方赔偿。《合同法》第一百十三规定:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的收益。

损失赔偿额可按下式计算:

损失赔偿额=直接经济损失+间接经济损失

式中,间接经济损失包括合同正常履行后的预期收益,即利润损失。

2.8.4 违约金责任和定金责任

违约金是指由当事人通过协商预先确定的在违约发生后作出的独立于履行行为之外的给付。

违约金具有以下法律特征:

- (1) 违约金是由当事人协商确定的。
- (2) 违约金的数额是预先确定的。
- (3) 违约金是一种违约后生效的责任方式。

定金是指合同当事人为了确保合同的履行,由一方预先给付另一方一定数额的金钱或其他物品。

定金具有以下法律特征:

- (1) 定金在性质上属于约定定金,适用于债务不履行的行为。
- (2) 定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。给付定金的一方不履行合同,无权要求返还定金,接受定金的一方不履行合同,应当双倍返还定金。
- (3) 从性质上看,定金合同具有从合同的性质。

我国《担保法》第九十一条规定,定金的数额不得超过主合同标的额的20%。

2.8.5 免责事由

法定的或约定的免除当事人责任的事由,称为免责事由。

不可抗力是一种最典型的免责事由。

所谓不可抗力,是指不可预见、不能避免、不能克服的客观情况。不可抗力具有以下主要特征:

- (1) 不可预见性,判断是否可以预见须以一般人的预见能力及现有的科学技术水平作为能否预见的标准。
- (2) 不能避免和不能克服性。

不可抗力主要包括以下几种情况:

- (1) 自然灾害,如地震、台风、洪水等。
- (2) 政府行为,这主要是指当事人订立合同以后,政府颁布新的政策、法规和实行政措施而导致合同不能履行。
- (3) 社会异常现象,如罢工、骚乱等。

因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

复习思考题

1. 简述我国合同法的调整对象与立法宗旨。
2. 简述合同法的基本原则。
3. 简述合同成立的基本要件。
4. 简述合同的基本形式。
5. 简述合同生效的基本原则。
6. 简述合同履行的原则。
7. 简述合同保全的基本方法。
8. 简述无效合同的概念及其法律特征。
9. 简述违约责任的法律特征。
10. 简述不可抗力的概念及其特征。
11. 简述合同变更的概念及其效力。
12. 简述合同转让的概念及其法律特征。

第3章 建设工程施工合同

教学提示:本章重点是《建设工程施工合同(示范文本)》的组成和建设工程施工合同通用条款的主要内容。本章难点是建设主体各方对建设工程施工合同的管理。

教学要求:通过本章教学应使学生掌握建设工程施工合同的概念、特点;《建设工程施工合同(示范文本)》的组成,构成建设工程施工合同的文件和优先解释顺序;建设工程施工合同通用条款的主要内容;建设行政主管部门对建设工程施工合同的管理;承包人对建设工程施工合同的管理和发包人对建设工程施工合同的管理,了解建设工程施工合同的类型和建设工程施工合同订立的条件与程序。

3.1 建设工程施工合同概述

3.1.1 建设工程施工合同的概念

建设工程施工合同也称为建筑安装承包合同,是发包人(建设单位、业主或总包单位)与承包人(施工单位)之间为完成商定的建设工程项目,明确双方权利和义务的协议。建筑是指对工程进行营造的行为,安装主要是指与工程有关的线路、管道、设备等设施的装配。依据施工合同,承包人应完成一定的建筑、安装工程任务,发包人应提供必要的施工条件并支付工程价款。

建设工程施工合同是建筑工程合同中最重要,也是最复杂的合同。它在工程项目中持续时间长,标的物特殊,价格高。在整个建筑工程合同体系中,它起主导合同的作用。施工合同与其他建设工程合同一样,是一种双务合同,在订立时也应遵循自愿、公平、诚实信用等原则。

建设工程施工合同是工程建设质量控制、投资控制、进度控制的主要依据。通过合同关系,可以确定建设市场主体之间的相互权利义务关系,在建设领域加强对施工合同的管理对规范建筑市场有重要作用。

施工合同的当事人是发包人和承包人,双方是平等的民事主体,双方签订施工合同,必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。发包人必须具备组织协调能力或委托给具备相应资质的监理单位承担;承包人必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。

发包人是指在协议书中约定、具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国有企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其他合法完备手续取得发包人的资格,承认全部合同条件,能够而自愿履行合同规定义务的合同当事人。与发包人合并的单位、

兼开发包人的单位、购买发发包人合同以及接受发发包人出让的单位和人员(合法继承人),均可成为发发包人,履行合同规定的义务,享有合同规定的权利。

承包人是指在协议书中约定、被发发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。《建筑法》第十二条规定:建筑施工企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

3.1.2 建设工程施工合同的类型

1. 根据合同所包括的工程或工作范围

建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可以划分为:

(1) 施工总承包,即承包商承担一个工程的全部施工任务,包括土建、水电安装、设备安装等。

(2) 专业承包,即单位工程施工承包和特殊专业工程施工承包。单位工程施工承包是最常见的工程承包合同,包括土木工程施工合同,电气与机械工程施工承包合同等。在工程中,业主可以将专业性很强的单位工程分别委托给不同的承包商。这些承包商之间为平行关系。例如管道工程、土方工程、桩基础工程等。但在我国不允许将一个工程肢解成分项工程分别承包。

(3) 分包合同。它是施工承包合同的分合同。承包商将施工承包合同范围内的一些工程或工作委托给另外的承包商来完成。他们之间签订分包合同。

2. 根据合同的计价方式

建设工程施工合同按合同的计价方式可以划分为:固定价格合同、可调整价格合同、成本加酬金合同3种类型。

1) 固定价格合同

固定价格合同是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。这种合同的价款并不是绝对不可调整的,而是约定范围内的风险由承包人承担。双方应当在专用条件内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,以及风险范围以外的合同价款调整方法。

如果发发包人对施工期间可能出现的价格变动采取一次性付给承包商一笔风险补偿费用办法的,可在专用条款内写明补偿的金额和比例,写明补偿后是全部不予调整还是部分不予调整,以及可以调整项目的名称。

2) 可调整价格合同

合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款的调整方法。通常,可调整价格合同中合同价款的调整因素包括:法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;工程造价管理部门(指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构)公布的价格调整;一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;双方约定的其他因素。

对于可调价格合同,双方可在专用条款中写明调整的范围和条件,除材料费外是包括机械费、人工费、管理费等,对通用条款中所列出的调整因素是否还有补充,如对工程

量增减和工程变更的数量有限的,还应写明限制的数量;调整的依据,写明是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件;写明调整的方法、程序,承包人提出调价通知的时间,工程师批准和支付的时间等。

承包人应当在上述情况发生后 14 天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

3) 成本加酬金合同

成本加酬金合同是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某种方式支付酬金的合同类型。合同价款包括成本和酬金两部分,合同双方应在专用条件中约定成本构成和酬金的计算方法。按酬金的不同计算方法又可分为:成本加固定百分比酬金合同、成本加固定酬金合同、成本加浮动酬金合同和目标成本加奖励合同 4 种类型。

3. 根据合同的性质

根据合同标的性质,建设工程合同有以下几种类型:

- (1) 建筑安装工程施工承包合同。
- (2) 装饰工程施工承包合同。
- (3) 劳务合同和技术服务合同。
- (4) 材料或设备供应合同。

3.1.3 建设工程施工合同的特点

1. 合同标的物的特殊性

施工合同的标的物是特定的建筑产品,合同的标的物不同于其他一般商品。建筑产品具有固定性、单件性、体积庞大的特点,这也是建筑产品区别于其他商品的根本特点。建筑产品的特点决定了建筑产品生产的特点,即建筑产品生产具有单件性、流动性、周期长的特点。每个建筑产品具有特定的功能要求,不同的区域、不同的时期、不同的用途,其实物形态千差万别,要求每一个建筑产品都需单独设计和施工,即使可重复利用的标准设计或重复使用的图纸,也应采取相应的修改设计才能施工(如场地地质条件的变化等),说明建筑产品的施工生产具有单件性;建筑产品属于不动产,其基础部分与大地相连,不能移动,施工队伍、施工机械必须围绕建筑产品移动,说明建筑产品施工生产具有流动性;建筑产品体积庞大,消耗的人力、物力、财力多,一次性投资额大,也说明建筑产品施工生产的周期长。以上这些特点,必然在施工合同中表现出来,每个施工合同的标的都是特殊的,相互间具有不可替代性。

2. 合同履行期限的长期性

建筑物的施工由于结构复杂、体积大、建筑材料类型多、工作量大,使得工期都较长(与一般工业产品的生产相比),而合同履行期限肯定要长于施工工期,因为工程建设的施工应当在合同签订后才开始,且需加上合同签订后到正式开工前的一个较长的施工准备时间和工程全部竣工验收后,办理竣工结算及保修期的时间。在施工施工过程中,还可能因为不可抗力、工程变更、材料供应不及时等原因而导致工期的顺延。所有这些情况,决定了施工合同的履行期限具有长期性。

3. 合同内容的多样性和复杂性

虽然施工合同的当事人只有两方,但其涉及的主体却有多种。与人多数合同相比,施工合同的履行期限长、标的额大,涉及的法律关系(包括劳动关系、保险关系、运输关系等)具有多样性和复杂性。这就要求施工合同的内容尽量详尽。施工合同除了应当具备合同的一般内容外,还应应对安全施工、专利技术使用、发现地下障碍物和文物、工程分包、不可抗力、工程设计变更、材料设备的供应、运输、验收等内容作出规定。所有这些都决定了施工合同的内容具有多样性和复杂性。

4. 合同监督的严格性

由于施工合同的履行对国家的经济发展、公民的工作和生活都有重大的影响,因此,国家对施工合同的监督是十分严格的。具体体现在以下几方面:

1) 对合同主体监督的严格性

建设工程施工合同主体一般只能是法人。发包人一般只能是经过批准进行工程项目建设的法人,必须有国家批准的建设项目,落实投资计划,并且应当具备相应的协调能力。承包人则必须具备法人资格,而且应当具备相应的从事施工的资质。无营业执照或无承包资质的单位不能作为建设工程施工合同的承包人,资质等级低的单位不能越级承包建设工程。

2) 对合同订立监督的严格性

订立建设工程施工合同必须以国家批准的投资计划为前提,即使是国家投资以外的、以其他方式筹集的投资也要受到当年的贷款规模和批准限额的限制,纳入当年投资规模的平衡,并经过严格的审批程序。建设工程施工合同的订立还必须符合国家关于建设程序的规定。同时,考虑到建设工程的重要性和复杂性,在施工过程中经常会发生合同纠纷,《合同法》要求建设工程施工合同的订立应采取书面形式。

3) 对合同履行监督的严格性

在施工合同的履行过程中,除了合同当事人应当对合同进行严格管理外,合同的主管机关(工商行政管理机构)、金融机构、建设行政主管部门等,都要对施工合同的履行进行严格的监督。

3.1.4 建设工程施工合同的订立

1. 订立施工合同应具备的条件

- (1) 初步设计已经批准。
- (2) 工程项目已经列入年度建设计划。
- (3) 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
- (4) 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
- (5) 对于招标投标工程,中标通知书已经下达。

2. 订立施工合同应当遵守的原则

1) 遵守国家法律法规和国家计划原则

国家立法机关、国务院、国家建设行政主管部门都十分重视施工合同的规范工作,也

有许多涉及建设工程施工合同的强制性管理规定，这些法律、法规、规定是我国建设工程施工合同订立和管理的依据。

建设工程施工对经济发展、生活环境产生多方面的影响。订立施工合同的当事人，必须遵守国家法律、法规，必须遵守国家强制性规定，也应遵守国家的建设计划和其他计划(如贷款计划)。

2) 平等、自愿、公平的原则

签订施工合同当事人双方都具有平等的法律地位，任何一方都不得强迫对方接受不平等的合同条件。合同内容应当是双方当事人真实意思的体现，合同内容还应当是公平的，不能单纯损害一方的利益。对于显失公平的施工合同，当事人一方有权决定是否订立合同和合同内容，有权申请人民法院或仲裁机构予以变更或撤销。

3) 诚实信用的原则

当事人订立施工合同应该诚实信用，不得有欺诈行为，双方应当如实将自身和工程的情况介绍给对方。在施工合同履行过程中，当事人也应恪守信用，严格履行合同。

3. 订立施工合同的程序

施工合同的订立同样包括要约和承诺两个阶段。其订立方式有直接发包和招标发包两种。对于必须进行招标的建设项目，工程建设的施工都应通过招标投标确定承包人。中标通知书发出后，中标人应当与招标人及时签订合同。《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.2 《建设工程施工合同(示范文本)》简介

3.2.1 《建设工程施工合同》文件的组成

除专用条款另有约定外，《建设工程施工合同》由下列文件组成：

(1) 双方签署的合同协议书。

(2) 中标通知书。

(3) 投标书及其附件。

(4) 本合同专用条款。它是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

(5) 本合同通用条款。它是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。它代表我国的工程施工惯例。

(6) 本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。在专用条款中约定：

① 适用的我国国家标准、规范的名称。

② 没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，则约定适用行业标准、规范的名称。

③ 没有国家和行业标准、规范的，则约定适用工程所在地的地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

④ 国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技

术要求, 承包人按约定的时间和要求提出施工工艺, 经发包人认可后执行。

⑤ 若发包人要求使用国外标准、规范的, 应负责提供中文译本。所发生的购买和翻译标准、规范或制定施工工艺的费用, 由发包人承担。

⑥ 图纸。指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准, 满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的, 发包人应代为复制, 复制费用由承包人承担。若发包人对工程有保密要求的, 应在专用条款中提出, 保密措施费用由发包人承担, 承包人在约定保密期限内履行保密义务。承包人未经发包人同意, 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后, 除承包人存档需要的图纸外, 应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

⑦ 工程量清单。

⑧ 工程报价单或预算书。

合同履行中, 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分, 在不违反法律和行政法规的前提下, 当事人可以通过协商变更合同的内容, 这些变更的协议或文件的效力高于其他合同文件, 日后签署的协议或文件效力高于先签署的协议或文件。

当合同文件内容含糊不清或不一致时, 在不影响工程正常进行的情况下, 由发包人、承包人协商解决, 双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时, 按有关争议的约定处理。

合同正本一式两份, 具有同等效力, 由合同双方分别保存一份。副本份数, 由双方根据需要在专用条款内约定。

3.2.2 词语定义

《建筑工程合同》文件中的词语定义如下:

- (1) 项目经理: 指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
- (2) 设计单位: 指发包人委托的负责本工程的设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
- (3) 监理单位: 指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
- (4) 工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表, 其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
- (5) 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
- (6) 工程: 指发包人和承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
- (7) 合同价款: 指发包人、承包人在协议书中约定, 发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
- (8) 追加合同价款: 指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况, 经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
- (9) 费用: 指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

(10) 工期：指发包人、承包人在协议书约定按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

(11) 开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

(12) 竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

(13) 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经过发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

(14) 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

(15) 书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

(16) 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

(17) 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

(18) 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(19) 小时或天：合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天截止时间为当日24时。

3.2.3 《建设工程施工合同(示范文本)》的组成

为了规范和指导合同当事人双方的行为，完善合同管理制度，解决施工合同中存在的合同文本不规范、条款不完备、合同纠纷多等问题，国家建设部和国家工商行政管理局于1999年12月24日颁发了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)(以下简称《施工合同示范文本》)。

《施工合同示范文本》(GF-99-0201)是在1991年3月31日发布的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)的基础上，根据新颁布和实施的工程建设有关法律、法规，结合我国施工合同示范文本推行的经验及工程建设施工的实际状况，借鉴国际上广泛使用的土木工程施工合同条件(特别是FIDIC土木工程施工合同条件)的成熟经验和有效做法进行修订的。该文本适用于土木工程，包括各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路、管道的施工和设备安装。

《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的，并附有3个附件。

1. 协议书

《协议书》是《施工合同示范文本》中总纲性文件。虽然其文字量并不大，但它规定了合同当事人双方最主要的权利义务，规定了组成合同的文件及合同当事人对履行合同义

务的承诺,合同当事人要在这份文件上签字盖章,因此具有很强的法律效力。协议书主要包括以下10个方面的内容:

- (1) 工程概况:工程名称、工程地点、工程内容、群体工程应附承包人承揽工程项目一览表、工程立项批准文号、资金来源等。
- (2) 工程承包范围。
- (3) 合同工期:开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数(包括法定节假日)。
- (4) 质量标准。
- (5) 合同价款:分别用大小写表示。
- (6) 组成合同的文件。
- (7) 本协议书有关词语含义与通用条款中分别赋予它们的定义相同。
- (8) 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
- (9) 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
- (10) 合同生效:合同签订时间(年月日)、合同签订地点、双方约定生效的时间。

2. 通用条款

具体内容将在3.3节详细介绍。

3. 专用条款

考虑到建设工程的内容各不相同,工期、造价也随之变动,承包人、发包人各自的能力、施工现场的环境和条件也各不相同,《通用条款》不能完全适用于各个具体工程,因此,配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充,使《通用条款》和《专用条款》成为双方统一意愿的体现。《专用条款》的条款号与《通用条款》相一致,但主要是空格,由当事人根据工程的具体情况予以明确或者对《通用条款》进行修改、补充。

4. 附件

附件是对施工合同当事人权利义务的进一步明确,并且使当事人的有关工作一目了然,便于执行和管理。一般有3个附件:承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表和工程质量保修书。

3.3 《建设工程施工合同》通用条款的内容

3.3.1 通用条款的组成

通用条款是根据合同法、建筑法和建设工程施工合同管理办法等法律法规对承发包双方的权利义务作出的具体规定,除双方协商一致对其中的某些条款做修改、补充或取消外,双方都必须履行。我国建设工程施工合同示范文本通用条款有11部分共47个条款、173个子款,基本适用于各类建设工程。11部分为:词语定义及合同文件、双方一般权利和义

务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约索赔和争议、其他。具体内容详见表 3-1。

表 3-1 《建筑工程施工合同》通用条款的内容

各部分的内容	各条款的内容	
一、词语定义及合同文件	1. 词语定义 2. 合同文件及解释顺序	3. 语言文字和适用法律、标准及规范 4. 图纸
二、双方一般权利和义务	5. 工程师 6. 工程师的委派和指令 7. 项目经理	8. 发包人工作 9. 承包人工作
三、施工组织设计和工期	10. 进度计划 11. 开工和延期开工 12. 暂停施工	13. 工期延误 14. 工程竣工
四、质量与检验	15. 工程质量 16. 检查和返工 17. 隐蔽工程和中间验收	18. 重新检验 19. 工程试车
五、安全施工	20. 安全施工与检查 21. 安全防护	22. 事故处理
六、合同价款与支付	23. 合同价款及调整 24. 工程预付款	25. 工程量的确认 26. 工程款(进度款)支付
七、材料设备供应	27. 发包人供应材料设备 28. 承包人采购材料设备	
八、工程变更	29. 工程设计变更 30. 其他变更	31. 确定变更价款
九、竣工验收与结算	32. 竣工验收 33. 竣工结算	34. 质量保修
十、违约、索赔和争议	35. 违约 36. 索赔	37. 争议
十一、其他	38. 工程分包 39. 不可抗力 40. 保险 41. 担保 42. 专利技术 & 特殊工艺	43. 文物和地下障碍物 44. 合同解除 45. 合同生效与终止 46. 合同份数 47. 补充条款

3.3.2 通用条款的主要内容

1. 关于质量控制的条款

建筑工程质量是关系到国计民生的大事,我国政府制定了“百年大计、质量第一”质量方针。工程施工中的质量控制是合同履行中的重要环节。施工合同的质量控制是一项系

统工程,涉及施工各个环节及多方面的因素。承包人应建立质量管理体系,按照合同约定的标准、规范、图纸以及工程师发布的指令认真施工,并达到合同约定的质量标准。在施工过程中,承包人要随时接受工程师对材料、设备、中间部位、隐蔽工程、竣工工程等质量的检查、验收与监督。

1) 工程质量

工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或专业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,由承包人承担违约责任。发包人对部分或全部工程质量有特殊要求的,应支付由此增加的追加合同价款(在专用条款中写明计算方法),对工期有影响的应相应顺延工期。

双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此而造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

2) 检查和返工

在工程施工过程中,工程师及其委派人员对工程的检查检验,是一项日常工作 and 重要职能。承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外,影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。

因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。以上检查检验合格后,又发现由承包人原因引起的质量问题,仍由承包人承担责任和发生的费用,赔偿发包人的直接损失,工期不予顺延。

3) 隐蔽工程和中间验收

由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽,很难再对其进行质量检查(这种检查成本很大),因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收,双方可在专用条款中约定验收的单项工程和部位的名称、验收的时间、操作程序和要求,以及发包人应该提供的便利条件等。

工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人才可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

工程师不能按时进行验收,应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等的要求,验收 24 小时内,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。

4) 重新检验

无论工程师是否进行验收,当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,承包人应

按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5) 工程试车

对于设备安装工程，应当组织试车。试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

(1) 试车的组织责任

① 单机无负荷试车。设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车。承包人应在试车前 48 小时书面通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人为试车提供必要条件。试车通过，工程师在试车记录上签字。工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，承包人可自行组织试车，发包人应当承认试车记录。只有单机试运转达到规定要求，才能进行联动试车。

② 联动无负荷试车。设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由发包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知承包人。通知内容包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签字。

③ 投料试车。投料试车，应当在工程竣工验收后由发包人全部负责。如果发包人需要求承包人配合或在工程竣工验收前进行时，应当征得承包人同意，另行签订补充协议。

(2) 试车的双方责任

① 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

② 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购方负责重新购置和修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

③ 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，工程师提出修改意见。承包人修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。

④ 试车费用除已包括在合同价款之内或者专用条款另有约定外，均有发包人承担。

⑤ 工程师未在规定时间内提出修改意见，或试车合格不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，记录自行生效，承包人可继续施工或办理竣工手续。

6) 材料设备供应的质量控制

(1) 发包人供应材料设备

实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，

承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。

如果发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人应承担有关责任。发包人应承担责任的^①具体内容,双方可根据以下情况在专用条款内约定:

① 材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差。

② 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购。

③ 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用。

④ 到货地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点。

⑤ 供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐;多于一览表约定数量时,发包人负责将多余部分运出施工场地。

⑥ 到货时间早于一览表约定的供应时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期。

发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。

(2) 承包人采购材料设备

承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。

7) 竣工验收

竣工验收是指由建设单位、施工单位和项目验收委员会,以批准的设计任务书和设计文件以及国家或部门颁发的竣工验收规范和质量检验标准为依据,按照一定的程序和手续,在项目建成并试生产合格后(工业生产性项目),对工程项目进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。竣工验收是全面考核建设工作,检查是否符合设计要求和质量标准的重要环节。

(1) 竣工工程的条件

国务院 2000 年 1 月发布的第 279 号令《建设工程质量管理条例》中规定,建设工程质量验收应当具备以下条件:

① 完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。

② 有完整的技术档案和施工管理资料。

③ 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

④ 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。

⑤ 有施工单位签署的工程保修书。

(2) 承包双方竣工验收的责任和工作程序

① 工程具备竣工验收条件，承包人按照国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

② 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

③ 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

④ 工程竣工验收通过后，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

⑤ 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

⑥ 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按前述条款规定的办理。

⑦ 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

⑧ 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强制使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任。

8) 质量保修

(1) 质量保修的规定

《建筑法》第六十二条规定：建筑工程实行质量保修制度。

建筑工程质量保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和保修期限由国务院规定。

承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

(2) 质量保修的实施

承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。

(3) 质量保修书的主要内容

① 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容由双方约定。

② 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日起算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

③ 质量保修责任

A. 属于保修范围和内容的项目, 承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理, 发包人可委托其他人员修理, 保修费用从质量保修金内扣除。

B. 发生须紧急抢修事故(如水上跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等), 承包人接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故, 抢修费用由发包人承担。

C. 在国家规定的工程合理使用期限内, 承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的, 承包人应承担损害赔偿责任。

④ 质量保修金的支付方法

质量保修金的支付方法见施工合同投资控制条款的相关内容。

2. 关于投资控制的条款

1) 合同价款及调整

招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。合同价款在协议书内约定后, 任何一方不得擅自改变。双方可在专用条款中约定采用的合同价款方式, 如固定价格合同、可调价格合同或成本加酬金合同。

2) 工程预付款

1. 工程预付款是在工程开工前由发包人(甲方)预先支付给承包人(乙方)一定限额的工程备料款, 是施工企业用来进行工程准备、保证施工所需材料和构件正常储备所需的流动资金。建设部 107 号文规定, 工程预付款的具体事宜由发承包双方根据建设行政主管部门的规定, 结合工程款、建设工期和包工包料情况在合同中约定。预付额度, 建筑工程一般不得超过当年建筑(包括水、电、暖、卫等)工程工作量的 30%, 大量采用预制构件以及工期在 6 个月以内的工程, 可以适当增加; 安装工程一般不得超过当年安装工程量的 10%, 安装材料用量较大的工程, 可以适当增加。

实行工程预付款的, 双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额, 开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付, 承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知, 发包人收到通知后仍不能按约定预付, 承包人可在发出通知后 7 天停止施工, 发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息, 并承担违约责任。

3) 工程进度款

(1) 工程量的确认

工程量的确认是支付工程价款(进度款)的前提条件。确认工程量的程序和责任如下:

① 承包人应按专用条款约定的时间, 向工程师提交已完工程量的报告。

② 工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工程量(计量), 并在计量前 24 小时通知承包人, 承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量, 计量结果有效, 作为工程价款支付的依据。

③ 工程师收到承包人报告后 7 天内未进行计量,从第 8 天起,承包人报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。

④ 工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。

⑤ 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。

(2) 工程价款(进度款)结算方式

① 按月结算

实行旬末或月中预支,月终结算,竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。按月结算是国内外常见的一种工程款支付方式。

② 竣工后一次结算

建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在 12 个月以内,或者工程承包合同价值在 100 万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。

③ 分段结算

分段结算即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度、划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。分段的划分标准由各部门、自治区、直辖市、计划单列市规定。

当承包人完成合同约定的工程形象进度时,承包人提出已完工程量报告,经工程师审查确认,签发付款证书后,由发包人按合同约定的时间付款。如专用条款中可约定:“当承包人完成基础工程施工时,发包人支付合同价款的 20%;完成主体结构工程施工时,支付合同价款的 50%;完成装饰工程施工时,支付合同价款的 15%;工程竣工验收通过后,再支付合同价款的 10%;其余 5% 作为工程保修金,在保修期满后返还给承包人。”

④ 目标结款方式

目标结款方式是在合同中将承包工程的内容分解成不同的验收单元,以业主验收的单元工程内容作为支付工程价款的前提条件。当承包商完成单元工程内容并经业主(或其委托人)验收后,业主支付构成单元工程内容的工程价款。目标结款方式实质上是运用合同手段、财务手段对工程完成情况进行主动控制。

⑤ 其他结算方式

结算双方可以在专用条款中约定采用并经开户银行同意的其他结算方式。

(3) 工程款(进度款)支付的程序和责任

工程款(进度款)支付程序如图 3.1 所示。




图 3.1 工程款(进度款)支付程序

① 在确认计量结果后 14 天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。

② 调整的合同价款、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

③ 发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付

款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可以与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

④ 发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

4) 其他费用的支付

(1) 安全施工方面的费用

① 安全施工及检查的费用

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由承包人承担。

发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及所发生的费用。

② 安全防护的费用

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施。由发包人承担防护措施费用。

实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

③ 事故处理的费用

发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

(2) 专利技术及特殊工艺

发包人要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用。承包人应按发包人要求使用,并负责试验等有关工作。承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并承担有关费用。擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。

(3) 文物和地下障碍物

① 发现文物

在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

② 发现地下障碍物

施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,

同时提出处置方案,工程师在收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发发包人承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时,发发包人应报请有关部门协同处置。

5) 竣工结算

(1) 竣工结算的时限

工程竣工验收报告经发发包人认可后 28 天内,承包人向发发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。发发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发发包人。

(2) 竣工结算相关的责任

① 发发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

② 发发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发发包人支付结算价款。发发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的,承包人可以与发发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

③ 工程竣工验收报告经发发包人认可后 28 天内,承包人未能向发发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发发包人要求交付工程的,承包人应当交付,发发包人要求不交付工程的,承包人承担保管责任。

④ 承包双方对工程竣工结算价款发生争议时,按通用条款关于争议的约定处理。

6) 质量保修金

(1) 质量保修金的支付

保修金由承包人向发发包人支付,也可由发发包人从应付承包方工程款内预留。质量保修金的比例及金额由双方约定,一般不超过施工合同价款的 3%。

(2) 质量保修金的结算与返还

质量保修期满后,发发包人应当及时结算和返还质量保修金。发发包人应当在质量保修期满后 14 天内,将剩余保修金和按约定利率计算的保修金利息返还承包人。

3. 关于进度控制的条款

建设工程施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。

1) 施工准备阶段的进度控制

(1) 进度计划

① 承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

② 群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。

工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见,并不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。工程师对进度计划予以确认的主要目的,是为工程师对进度进行控制提供依据。

(2) 开工及延期开工

① 承包人要求的延期开工

承包人应当按照协议约定的开工日期开始施工。若承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到申请后48小时内不答复,视为已同意承包人要求,工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

② 发包人原因造成的延期开工

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

2) 施工阶段的进度控制

(1) 工程师对进度计划的检查与监督

承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。

工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,并经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。如果采用改进措施后,经过一段时间工程实际进展赶上进度计划,则仍可按原进度计划执行。如果采用改进措施一段时间后,工程实际进展仍明显与进度计划不符,则工程师可以要求承包人修改原进度计划,并经工程师确认后执行。但是,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果承包人按修改后的进度计划施工不能按期竣工的,承包人仍应承担相应的违约责任。

工程师应当随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题,并帮助承包人予以解决,特别是承包人无力解决的内外关系协调问题。

(2) 暂停施工

① 发包人原因造成的暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可以自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价格,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期。

② 承包人原因造成的暂停施工

因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。

③ 意外事件导致的暂停施工

在施工过程中出现一些意外情况,如果需要承包人暂停施工的,承包人应该暂停施工。此时工期是否给予顺延,应视风险责任应由谁承担而确定。如发现有价值的文物、发生不可抗力事件等,风险责任应由发包人承担,工期顺延。

(3) 工期延误

① 工期可以顺延的情况

以下原因造成的工期延误属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,经工程师确认,工期相应顺延:

- A. 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
- B. 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行。
- C. 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。
- D. 设计变更和工程量增加。
- E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时。
- F. 不可抗力。
- G. 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

② 办理工期顺延的程序

承包人在上述情况发生后 14 天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

3) 竣工验收阶段的进度控制

在竣工验收阶段,工程师进度控制的任务是督促承包人完成工程扫尾工作,协调竣工验收中的各方关系,参加竣工验收。

(1) 竣工验收的程序

承包人必须按照协议书约定的竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工的,承包人应当承担违约责任。

① 承包人提交竣工验收报告

当工程按合同要求全部完成后,具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收的有关规定,向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交竣工图。

② 发包人组织验收

发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收,并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见,承包人应当按要求进行修改,并承担因自身原因造成修改的费用。中间交工工程的范围和竣工时间,由双方在专用条款内约定。验收程序同上。

发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收,或者在验收后 14 天内不提出修改意见,则视为竣工验收报告已经被认可。发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收,从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

(2) 提前竣工

施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

3.4 建设行政主管部门对建设工程施工合同的管理

在市场经济条件下,建设市场主体之间相互的权利义务关系主要是通过合同确立的,因此,在建设领域加强对施工合同的管理具有十分重要的意义。国家立法机关、国务院、国家建设行政主管部门都十分重视施工合同的规范工作,1999年3月15日九届全国人大第二次会议通过,1999年10月1日生效实施的《中华人民共和国合同法》对建设工程合同做了专章规定,《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程施工合同管理办法》等也有许多涉及建设工程施工合同的规定,这些法律法规是我国建设工程施工合同订立和管理的依据。

建设工程施工合同的监督管理,是指各级工商行政管理部门、建设行政主管部门和金融结构依据法律和行政法规、规章制度,采取法律的、行政的手段,对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督,保护施工合同当事人的合法权益,调解施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同的法规的贯彻实施。各级工商行政管理部门、建设行政主管部门和金融结构对合同的监督侧重于宏观的依法监督。此外,合同双方的上级主管部门、仲裁机构或人民法院、税务部门、审计部门及合同公证鉴证机关等也从不同角度对施工合同进行监督管理。

1. 工程分包与转包

通过投标和评标活动选中承包人,意味着发包人对承包人的投标报价、工期等定量化因素的认可,也意味着发包人对承包人的施工技术、人员素质、社会信誉的认可,承包人的综合实力对工程质量、投资控制、进度控制等有直接影响。因此,在通常情况下,承包人应当自己来完成施工任务或主要施工任务。

《建筑法》第二十八条规定:禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。《建筑法》第二十九条规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再次分包。

1) 工程分包

工程分包是指经合同约定或发包人认可,从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。

承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包人签订分包合同。非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。

工程分包不能解除承包人任何义务与责任,承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,

承包人承担连带责任。

分包合同签订后,发包人与分包人之间不存在直接的合同关系。分包人应对承包人负责,承包人对发包人负责。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。

2) 工程转包

工程转包是指不行使承包人的管理职责,不承担技术经济责任,将所承包的工程倒手转给他人的行为。

下列行为均属于转包:

(1) 承包人将承包的工程全部包给其他施工单位,从中提取回扣者。

(2) 承包人将工程的主要部分或群体工程(指结构技术要求相同的)中半数以上的单位工程包给其他施工单位者。

(3) 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位者。

2. 不可抗力

1) 不可抗力的范围

在合同签订时应当明确不可抗力的范围。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、震、洪水等自然灾害。

2) 不可抗力事件发生后双方的工作

在履行合同的过程中,应当加强管理,在可能的范围内减少或者避开不可抗力事件的发生(如爆炸、火灾等有时就是因为管理不善引起的)。

不可抗力事件发生后,承包人应当立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3) 不可抗力所造成损失的承担

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损坏,由发包人承担。

(2) 发包人、承包人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。

(4) 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

(5) 工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

(6) 延误工期相应顺延。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

4. 合同生效与终止

1) 合同生效

双方在协议书中约定本合同生效方式，双方当事人可选择以下几种方式之一：

(1) 本合同于××年××月××日签订，自即日起生效。

(2) 本合同双方约定应进行公（鉴）证，自公（鉴）证之日起生效。

(3) 本合同签订后，自发包人提供图纸或支付预付款或提供合格施工场地或下达正式开工指令之日起生效。

(4) 本合同签订后，需经发包人上级主管部门批准，自上级主管部门正式批准之日起生效，但双方应约定合同签订后多少天内发包人上级主管部门应办完正式批准手续。

2) 合同终止

除了质量保修方面双方的权利和义务，如果发包人、承包人履行完合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

5. 争议的解决

1) 争议解决方式

发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿意和解、调解或和解、调解不成的，双方可以在专用条款中约定选择以下一种方式解决争议：

(1) 双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

2) 发生争议后停止施工的条件

发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受。

(3) 仲裁机构要求停止施工。

(4) 法院要求停止施工。

6. 施工合同的解除

1) 可以解除合同的情形

(1) 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

(2) 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

(3) 承包人将其承包的全部工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

(4) 因不可抗力致使合同无法履行，发包人、承包人可以解除合同。

(5) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行，发包人、

承包人解除合同。

2) 解除合同的程序

合同一方依据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，双方可按有关争议的约定处理。

3) 合同解除后的善后处理

合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

3.5 发包人对建设工程施工合同的管理

工程发包人、承包人对建设工程施工合同的管理是微观的、具体的管理，也是合同管理的出发点和落脚点，体现在建设工程施工合同从订立到履行的全过程中。

3.5.1 发包人的权利和义务

1. 发包人的义务

发包人应按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及应支付的其他款项。

2. 工程师及其职权

1) 工程师

工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人派驻施工场地(指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所)履行合同的代表两种情况。

(1) 发包人委托监理。发包人委托监理单位全部或者部分负责合同的履行。国家推行建设工程监理制度，对于国家规定实行强制监理的工程施工，发包人必须委托监理，对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以委托监理。工程施工监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程施工合同，代表发包人对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。监理单位受发包人委托负责工程监理并应具有相应工程监理资质等级证书。发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人和承包人在专用条款内写明。总监理工程师是经监理单位法定代表人授权，派驻施工现场监理机构的总负责人，行使监理合同赋予监理单位的权利和义务，全面负责受委托工程的

建设监理工作。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。如对委托监理的工程师要求其在行使认可索赔权力时,如索赔额超过一定限度,必须先征得发包人的批准。

(2) 发包人派驻代表。发包人派驻施工现场履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人法定代表人授权、派驻施工现场的负责人,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人,以避免给现场施工管理带来混乱和困难。

(3) 合同履行中,发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按争议的约定处理。

(4) 除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

2) 工程师的委派和指令

(1) 工程师委派代表

在施工过程中,不可能所有的监督和管理工作都由工程师亲自完成,工程师可委派代表,行使合同约定的自己的部分权力和职责,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻现场的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

(2) 工程师发布指令、通知

工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予以执行。因指令错误发生的追加合同价款(指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况、经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款)和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。

(3) 工程师应当及时完成自己的职责

工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令,批准并履行其他约定的义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,

并赔偿承包人有关损失，顺延工期。

(4) 工程师易人

如需更换工程师，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

3. 发包人的工作职责

发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作。使施工场地具备施工条件，在开工后继续解决相关的遗留问题。

(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。

(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及由专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，对资料的准确性负责。

(5) 办理施工许可证及其他施工所需的证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通、爆破作业等申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)。

(6) 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物和保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。

(9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。发包人可以将上述部分工作委托承包人办理，具体内容应由双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。发包人未能履行以上各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。

按具体工程和实际情况，在专用条款中逐条列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求，实际存在而通用条款未列入的，要对条款内容予以补充。双方协议将本条中发包人工作部分或全部交承包人完成时，应写明对通用条款的修改内容，发包人应支付费用的金额和计算方法，还应写明发包人不能按专用条款要求完成有关工作时，应支付的费用金额和赔偿承包人损失的范围及计算方法。

3.5.2 发包人违约

1. 发包人的违约行为

发包人应当按照合同约定完成相应的义务。如果发包人不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，则应承担相应的违约责任。发包人的违约行为包括：

(1) 发包人不按合同约定按时支付工程预付款。

(2) 发包人不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行。

(3) 发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款。

(4) 发包人不履行合同约定义务或者不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人的违约行为可以分成两类：一类是不履行合同约定义务，如发包人应当将施工所需

的水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,但发包人没有履行该项义务,即构成违约;另一类是不按合同约定履行义务,如发包人应当开通施工场地与城乡公共道路的通道,并在专用条款中约定了开通的时间和数量要求,但实际开通的时间晚于约定或质量低于合同约定,也构成违约。

2. 发包人承担违约责任的方式

合同约定应该由工程师完成的工作,工程师没有完成或没有按照约定完成,给承包人造成损失的,也应当由发包人承担违约责任。因为工程师是代表发包人进行工作的,其行为与合同约定不符时,视为发包人的违约。发包人承担违约责任后,可以根据监理委托合同追究监理单位相应的责任。

发包人承担违约责任的方式有以下4种:

1) 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失

赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式,其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。承包人、发包人双方应当在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过发包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2) 支付违约金

支付违约金的目的补偿承包人的损失,双方在专用条款中约定发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

3) 顺延延误的工期

对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延。

4) 继续履行

发包人违约后,承包人要求发包人继续履行合同的,发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。

3.6 承包人对建设工程施工合同的管理

3.6.1 订立建设工程施工合同前的准备工作

本小节主要讲述合同文本分析。

1. 合同文本的基本要求

合同文本通常指合同协议书和合同条件等文件。合同文本是合同的核心,确定了当事人双方在工程中的权利和义务。合同一经签订,即成为合同双方在工程施工过程中行为的评判依据。它的每项条款都与双方的利益相关,影响到双方的成本、费用和收入。通常,当事人双方在选择合同文本时应注意满足以下基本要求。

(1) 内容齐全,条款完整,不能漏项。合同虽然在工程实施前起草和签订,但应对工程实施过程中各种情况都要作出预测、说明和规定,以防止扯皮和争执。

(2) 定义清楚、准确,双方工程责任的界限明确,不能含混不清。合同条款应是肯定的、

可执行的,对具体问题,各方该做什么、不该做什么,谁负责、谁承担费用,应十分明确。

(3) 内容具体、详细,不能笼统,不怕条文多。双方对合同条款应有统一的解释。

(4) 合同应体现双方平等互利原则,即责任和权益、工程(工作)和报酬之间应平衡,合理分配风险,公平地分担工作和责任。

在我国,施工合同文本通常采用《建设工程施工合同(示范文本)》,它能较好地反映上述要求。

2. 合同文本分析的主要内容

通常,施工合同文本分析主要包括以下几个方面。

(1) 施工合同的合法性分析。具体包括:当事人双方的资格审查;工程项目已具备招标投标、签订和实施合同的一切条件;工程施工合同的内容(条款)和所指行为符合《合同法》,以及其他各种法律的要求,如劳动保护、环境保护、税赋等法律要求等。

(2) 施工合同的完备性分析。具体包括:属于施工合同的各种文件(特别是工程技术、环境、水文地质等方面的说明文件 and 设计文件,如图纸、规范等)齐全;施工合同条款齐全,对各种问题都有规定、不漏项等。

(3) 合同双方责任和权益及其关系分析。主要分析合同双方的责任和权益是否互为前提条件。例如,合同规定发包人有一项权力,则分析该项权力的行使对承包人的影响,该权力是否需要制约,发包人有无滥用这个权力的可能,发包人使用该权力应承担什么责任,以此提出对该项权力的制约。同时,还应注意发包人与承包人的责任和权益应尽可能具体、详细,并注意其范围的限定。

(4) 合同条款之间的联系分析。由于合同条款所定义的事件和合同问题具有一定的逻辑关系(如实施顺序关系、空间上和技术上的互相依赖关系、责任和权利的平衡和制约关系、完整性要求等),使得合同条款之间有一定的内在联系。因此,在合同分析中还应注意合同条款之间的内在联系,同一种表达方式,在不同的合同环境中,或有不同的上下文,则可能有不同的风险。通过内在联系分析,可以看出合同条款之间的缺陷、矛盾、不足之处和逻辑上的问题等。

(5) 合同实施的后果分析。如承包人可以分析:在合同实施中会有哪些意想不到的情况?这些情况发生后应如何处理?本工程是否过于复杂或范围过大、超过自己的能力?自己如果不能履行合同,应承担什么样的法律责任?后果如何?对方如果不能履行合同,应承担什么样的法律责任?

3.6.2 承包人的权利和义务

1. 项目经理及其职权

1) 项目经理

项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。他代表承包人负责工程施工的组织、实施。承包人施工质量、进度管理方面的好坏与项目经理的水平、能力、工作热情有很大的关系,一般都应当在投标书中明确项目经理,并作为评标的一项内容。项目经理的姓名、职务应在专用条款内写明。

承包人如需更换项目经理,应至少提前 7 天以书面形式通知发包人,并征得发包人同

意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，不得更改前任作出的书面承诺，因为前任项目经理的书面承诺是代表承包人的，项目经理的易人并不意味着合同主体的变更，双方都应履行各自的义务。发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

2) 项目经理的职权

项目经理有权代表承包人向发包人提出要求和通知。承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织实施。在情况紧急且无法与工程师联系的情况下，应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。若责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；若责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

2. 承包人工作

承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用（在专用条款中应该写明需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间。发包人如委托承包人完成工程施工图及配套设计，本款应写明设计的名称、内容、要求、完成时间和设计费用计算方法）。

(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表（在专用条款中应该写明应提供计划、报表的名称及完成时间）。

(3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫（在专用条款中应该写明承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求）。

(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用（在专用条款中应该写明向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求。如提供的现场办公生活用房的间数、面积、规格和要求，各种设施的名称、数量、规格型号及提供的时间和要求，发生费用的金额及由谁承担）。

(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外（在专用条款中应该写明需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，写明地方政府、有关部门和发包人对本款内容的具体要求。如在什么时间、什么地段、哪种型号的车辆不能行驶或行驶的规定，在什么时间不能进行哪些施工，施工噪音不得超过多少分贝）。

(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同条款，双方在专用条款内约定（在专用条款中应该写明已完工程成品保护的特别要求及费用承担）。

(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建

筑)、古树名木的保护工作(在专用条款中应该写明施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担)。

(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非承包人原因造成的损失和罚款除外)。在专用条款中应该写明施工场地清洁卫生的要求。如对施工现场布置、机械材料的放置、施工垃圾处理等场容卫生的具体要求,交工前对建筑物的清洁和施工现场清理的要求。

(9) 双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。承包人未能履行上述各项义务造成发包人损失的,应赔偿发包人有关损失。

在专用条款中应该写明:按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求,实际需要而通用条款未列的,要对条款和内容予以补充。本条工作发包人不在签订专用条款时写明,但在施工中提出要求,征得承包人同意后双方订立协议,可作为专用条款的补充,本条还应写明承包人不能按合同要求完成有关工作应赔偿发包人损失的范围和计算方法。

3.6.3 承包人违约

1. 承包人违约的情况

承包人的违约行为主要有以下 3 种情况:

- (1) 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工。
- (2) 因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准。
- (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2. 承包人承担违约责任的方式

承包人承担违约责任的方式有以下 4 种:

1) 赔偿因其违约给发包人造成的损失

承、发包人双方应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2) 支付违约金

双方可以在专用条款中约定承包人应当支付违约金的数额或计算方法。发包人在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:

- (1) 发包人盈利损失。
- (2) 由于工期延长而引起的贷款利息增加。
- (3) 工程拖期带来的附加监理费。
- (4) 由于本工程拖期无法投入使用,租用其他建筑物时的租赁费。

至于违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误 1 天赔偿的款额计算,累计赔偿额一般不超过合同总额的 10%。

3) 采取补救措施

对于施工质量不符合要求的违约,发包人有权要求承包人采取返工、修理、更换等补

救措施。

4) 继续履行

承包人违约后,如果发包人要求承包人继续履行合同时,承包人承担上述违约责任后仍应继续履行施工合同。

复习思考题

1. 试述建设工程施工合同的概念和特点。
2. 试述建设工程施工合同订立的条件和程序。
3. 简述《建设工程施工合同(示范文本)》的组成。
4. 试述构成建设工程施工合同的文件和优先解释顺序。
5. 如何进行隐蔽工程和中间验收?
6. 简述试车的组织和责任。
7. 发包人供应的材料设备与约定不符时如何处理?
8. 建设工程竣工验收应具备的条件是什么?
9. 试述承包双方竣工验收的责任和工作程序。
10. 简述质量保修的范围和质量保修的责任。
11. 试述工程款(进度款)支付的程序和责任。
12. 简述变更价款的确定方法和确定程序。
13. 简述施工进度计划的提交及确认。
14. 简述工期顺延的理由及确认程序。
15. 工程分包与工程转包的区别?施工合同对工程分包有何规定?
16. 不可抗力所造成的损失应如何分担?
17. 简述施工合同争议的解决方式。
18. 什么情况下施工合同可以解除?
19. 简述工程师的产生及职权。
20. 发包人和承包人的工作有哪些?
21. 简述合同文本分析的主要内容。

第4章 建设工程其他合同

教学提示：工程建设是必须由多个不同利益主体参与的活动。这些主体相互之间是由合同构建起来的法律关系。各主体的利益目的正是通过实现这些合同权利来实现的。建设工程合同种类繁多。除了施工合同外，主要的合同还有勘察设计合同、建设监理合同等。

教学要求：掌握勘察设计合同、委托监理合同示范文本的概念及其内容，特别要掌握合同条款的含义；熟悉订立合同的程序和注意事项；了解我国关于工程勘察设计、工程监理方面的法规的立法情况。

4.1 建设工程勘察设计合同

4.1.1 建设工程勘察设计合同概述

工程勘察和设计是工程建设活动必不可少的程序。建设工程在施工之前，必须要查明、分析、评价建设场地的地质、地理、环境特征和岩土工程条件，还要对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析和论证。根据建设工程的要求所进行的上述活动就是工程勘察和设计。

工程勘察设计活动是一项专业性极强的活动，必须由具备法定条件的专门机构和专业技术人员来完成。通常，建设工程的业主与从事工程勘察设计的专门机构签订勘察设计委托合同进行勘察设计活动。

《合同法》第二百六十九条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条规定：建设工程合同应当采用书面形式。上述规定说明，勘察、设计合同必须采用书面形式订立。

由于勘察设计活动的内容相当复杂，规定发包人和承包人权利义务的合同内容十分专业化，为使勘察设计合同的签订和履行能够顺利进行，建设部和国家工商行政管理总局于2000年联合颁布了《建设工程勘察设计合同管理办法》，并推荐使用《建设工程勘察合同》(GF-2000-0203, GF-2000-0204)和《建设工程设计合同》(GF-2000-0209, GF-2000-0210)示范文本。该示范文本虽不强制使用，但由于其条款设计的科学性和完备性有利于明确双方的技术经济责任、保护双方的合法权益，从而成为了勘察设计中发包方和承包方的明智选择。

《建设工程勘察合同》示范文本分为两种。其中，GF-2000-0203版本适用于岩土工程勘察、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探；GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测。

《建设工程设计合同》示范文本也分为两种。其中，GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计；GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计。

以上两种合同的示范文本虽因内容的不同而各有两个版本,但从条款来看,其实质都不外乎《合同法》第十二条所规定的内容,即当事人名称和住所,标的,数量,质量,价款或酬金,履行期限、地点和方式,违约责任,解决争议的方法等。

4.1.2 《建设工程勘察合同<示范文本>》的内容

适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探的勘察合同示范文本GF-2000-0203条款如下:

工程名称:

工程地点:

勘察证书等级:

签订日期:

发包人:

勘察人:

发包人委托勘察人承担_____任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,发包人、勘察人协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称

1.2 工程建设地点

1.3 工程规模、特征

1.4 工程勘察任务委托文号、日期

1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求

1.6 承接方式

1.7 预计勘察工作量

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责;勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作定于____年____月____日开工,____年____月____日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计____元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度____%时,向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款,计____元;勘察工作结束后____天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的____%,计____元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸、或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清、致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如落实土地征用、赔偿青苗树木、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及备好水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性支付给勘察人临时设施费____元。

5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费

(计算方法见 6.1); 发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时, 发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。

5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议, 未经勘察人同意, 发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目; 如发生上述情况, 发包人应负法律责任, 勘察人有权索赔。

5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察, 按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料, 并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格, 勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格; 若勘察人无力补充完善, 需另委托其他单位时, 勘察人应承担全部勘察费用; 或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时, 勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外, 并根据损失程度向发包人支付赔偿金, 赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。

5.2.3 在工程勘察前, 提出勘察纲要或勘察组织设计, 派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘察过程中, 根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求, 向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见, 并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员, 应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度, 承担其有关资料保密义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六章 违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地, 发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算), 工期按实际工日顺延外, 还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格, 不能满足技术要求时, 其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间, 由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时, 勘察人未进行勘察工作的, 不退还发包人已付定金; 已进行勘察工作的, 完成的工作量在 50%以内时, 发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费计____元; 完成的工作量超过 50%时, 则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间拨付勘察费, 每超过一日, 应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料, 每超过一日, 应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后, 发包人不履行合同时, 无权要求退还定金; 勘察人不履行合同时, 双倍退还定金。

第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其他约定事项

第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_____仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到有建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完本合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_____份，发包人_____份，勘察人_____份。

发包人名称：(盖章)

勘察人名称：(盖章)

法定代表人：(签字)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

委托代理人：(签字)

住所：

住所：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

建设行政主管部门备案：(盖章)

鉴证意见：(盖章)

备案号：

经办人：

备案日期： 年 月 日

鉴证日期： 年 月 日

适用于岩土工程设计、治理、检测的勘察合同示范文本 GF-2000-0204 条款如下：

工程名称：

工程地点：

勘察证书等级：

签订日期：

发包人：

承包人：

发包人委托承包人承担_____任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一章 工程概况

1.1 工程名称

1.2 工程地点

- 1.3 工程立项批准文件号、日期
- 1.4 岩土工程任务委托文号、日期
- 1.5 工程规模、特征
- 1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求
- 1.7 承接方式
- 1.8 预计的岩土工程工作量

第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件见表 4-1:

表 4-1 发包人向承包人提供的有关资料文件

序号	资料文件名称	份数	内容要求	提交时间

第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件见表 4-2:

表 4-2 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号	报告、成果、文件名称	数量	内容要求	交付时间

第四条 工期

本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条 收费标准及支付方式

5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2 本岩土工程费总额为____元(大写____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3 本合同生效后,发包人按表 4-3 约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

表 4-3 向承包人预付(或支付)工程费表

拨付工程费时间	占合同总额百分比	金额人民币(元)	(工程进度)

第六章 变更及工程费的调整

6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前____天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于____天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起____天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第____天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.2 变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_____。

第七章 发包人、承包人责任

7.1 发包人责任

7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容,规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及及时性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果,文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果,文件的时间。

7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付____元计算加班费。

7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费____元。

7.1.4 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制或泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2 承包人责任

7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的____%。

7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件,发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条 违约责任

8.1 由于发包人提供的资料文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3 发包人按时支付工程款(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条 材料设备供应

9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的材料,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的原因,是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

9.2 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条 报告、成果、文件检查验收

10.1 发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后____天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3 隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方可进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4 工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在____天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

10.5 工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起____天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十二章 其他约定事项

第十三条 争议解决办法

本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_____仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

第十四条 合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式_____份,发包人_____份、承包人_____份。

发包人名称: (盖章)

承包人名称: (盖章)

法定代表人: (签字)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

委托代理人: (签字)

住 所:

住 所:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

开户银行:

开户银行:

银行账号:

银行账号:

建设行政主管部门备案: (盖章)

鉴证意见: (盖章)

备案号:

经办人:

备案日期: 年 月 日

鉴证日期: 年 月 日

可以看出,根据勘察任务的不同,上述两种版本的合同示范文本略有区别,但它们所包含的条款实质上是相同的。

关于发包人向勘察人提供文件资料的约定,合同特别强调这是发包人的义务。但实践中,由于专业上的原因,发包人往往会要求由勘察人收集这些资料文件,而处于弱勢的勘察人又不得不顺从发包人的要求。为此,示范文本特别规定,如果勘察人进行了该项工作,所需费用应由发包人承担,并且不包含在勘察费中。

关于工期的约定,示范文本提供了两种方式,合同双方可以选择其一。一种是约定绝对工期,即“本工程勘察工作定于_____年_____月_____日开工,_____年_____月_____日提交勘察成果资料”;另一种是相对工期,即“勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准”。

关于收费标准的约定,示范文本也提供了多种选择。如果所进行的勘察工作有国家的统一定价,则按照定价执行;否则,双方可以约定以“预算包干”、“中标价加签证”或“实际完成工作量结算”等方式根据双方的协议价格计取收费。

关于付费方式的约定,示范文本统一规定了首付定金、按进度分期支付的方式。定金

是我国《担保法》规定的法定担保方式之一。定金是在订立合同之后、履行合同之前，一方当事人预先支付给另一方当事人的不超过合同总价款 20% 的货币。《担保法》规定：定金对于双方都有违约惩罚的作用，即给付定金的一方不履行合同，则无权索回定金，而收取定金的一方不履行合同，则须双倍返还定金。在合同履行之后，定金抵做合同价款。

示范文本对双方义务进行了一般性的约定，但当事人还可以根据具体工程的情况，以补充协议或条款的方式对双方的义务做更完善和详尽的规定，补充协议或条款作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

关于违约责任的规定，示范文本规定“由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在 50% 以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50% 的勘察费；完成的工作量超过 50% 时，则应向勘察人支付预算额 100% 的勘察费”；以及因勘察人违约给发包人造成损失时应向发包人赔偿，但“……赔偿金额最高不超过返工项目的收费”。从这些规定可以看出，示范文本在一定程度上对处于弱势的勘察人有所保护，这有助于维护双方当事人实质上的公平的法律地位。

关于争议解决方式的约定，示范文本首先规定双方可以协商或提请建设行政主管部门调解解决。实践中，因协商或调解能迅速而低成本地解决纠纷，所以常被纠纷双方首选采用。但协商和调解都不具备法律效力，也不是纠纷解决的必经程序。当协商或调解不能解决纠纷，或者双方不愿进行协商或调解，则双方必须通过一种具有法律效力的途径解决纠纷。示范文本提供了两种选择，即仲裁或诉讼。现实中，仲裁由于其专业、保密、快速、低成本且不失公正而成为当事人的首选。

4.1.3 《建设工程设计合同<示范文本>》的内容

适用于民用建设工程的设计合同示范文本 GF-2000-0209 条款如下：

工程名称：

工程地点：

合同编号：

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

发包人委托设计人承担_____工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见附表 4-4：

表 4-4 合同设计项目

序号	分项目 名称	建设规模		设计阶段及内容			估算总投资(万元)	费率 (%)	估算设计费(元)
		层数	建筑面积 (M ²)	方案	初步 设计	施工图			

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件见表 4-5:

表 4-5 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件见表 4-6:

表 4-6 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜

第五条 本合同设计费估算为_____元人民币。设计费支付进度详见表 4-7:

表 4-7 设计费支付进度表

付费次序	占总设计费%	付费额(元)	付费时间
第一次付费	20%	定金	本合同签订后三日内
第二次付费			

说明: ① 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

② 在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费, 不留尾款。

③ 实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定, 多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时, 双方另行签订补充协议。

④ 本合同履行后, 定金抵作设计费。

第六条 双方责任**6.1 发包人责任**

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派往现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件及专利技术,未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准

6.2.3 设计合理使用年限为____年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人过错造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____%。

7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八章 其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场以配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时,所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项:

发包人名称: (盖章)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

住所:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行账号:

设计人名称: (盖章)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

住所:

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行账号:

建设行政主管部门备案: (盖章)

备案号:

备案日期:

鉴证意见: (盖章)

经办人:

鉴证日期:

适用于专业建设工程的设计合同示范文本 GF-2000-0210 条款如下:

工程名称:

工程地点:

合同编号:

设计证书等级:

发包人:

设计人:

签订日期:

发包人委托设计人承担____工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理办法》

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章

1.3 建设工程批准文件

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准

第三条 合同文件的优先次序。构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

1. 合同书

2. 中标函(文件)

3. 发包人要求及委托书

4. 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条 费用

7.1 双方商定,本合同的设计费为____万元,收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费,工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计____万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2 设计人提交____设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计____万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志,未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须经得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间、份数向发包人交付设计文件(出现在9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定的有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为____年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的____%。

9.2.5 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍退还发包人已支付的定金。

9.2.7 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十章 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件

擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效,一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。

12.8 本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称: (盖章)

设计人名称: (盖章)

法定代表人: (签字)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

委托代理人: (签字)

项目经理: (签字)

项目经理: (签字)

住所:

住所:

邮政编码:

邮政编码:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:

银行账号:

银行账号:

建设行政主管部门备案: (盖章)

鉴证意见: (盖章) 备案号

经办人:

鉴证日期:

备案日期:

建设工程的设计与勘察活动的性质有许多相似之处,因此设计合同与勘察合同也有许多相似。根据设计任务内容的不同,设计合同示范文本分为民用建设工程设计合同和专业建设工程设计合同。其条款叙述的内容实质上是相同的。

示范文本首先列明了设计合同签订所依据的文件。这是法规对于工程建设程序的强制性规定。如果不具备建设工程的有关批准文件,设计合同签订的依据就不存在,因此设计合同即使签订,也是无效的。

设计费和勘察费的支付方式非常相似。按照示范文本的规定,发包人应在合同签订之后、履行之前,按照我国担保法的规定向设计人支付相当于估算设计费 20% 的定金。

4.1.4 合同双方对勘察设计合同的管理

勘察、设计合同双方对于合同签订和履行的管理工作做得是否好,直接影响到双方的利益。

1. 委托方对勘察设计合同的管理

工程勘察设计活动从业单位应具备相应资质是法定条件,因此委托人应首先对勘察设计师的资质进行验证。这是保证合同生效的前提条件之一。

勘察设计合同明确规定发包方应按期为承包人提供各种依据资料、文件,并对其质量和准确性负责。现实中,发包方应注意不要由于身处相对有利的合同地位而有忽视应当承担的义务。

如果发包方因故要求修改设计,一般来说,设计文件的提交时间应由双方另行商定,发包方还应按承包方实际返工修改的工作量增付设计费。

当承包方不能按期、按量完成勘察设计任务时,发包方都有权向其提出索赔。

随着工程咨询业的发展,工程咨询服务的专业化水平越来越高。委托方也可以委托具有相应资质等级的建设监理公司对勘察设计合同进行专业化的监督和管理。

2. 承包方对勘察设计合同的管理

由于勘察设计活动主要是由承包人体具体实施完成,承包方对勘察设计合同的管理更应充分重视。

(1) 在乙方项目组织中设立专门的合同管理机构

该机构甚至可以是乙方项目组织中最早设立的部门。它早在勘察设计项目的投标阶段就介入工作,从事勘察设计项目的投标工作。中标后,起草、分析合同条款以及签署合同的工作主要就是由这个机构负责具体实施的。签约后,研究、分析、分解合同条款也是由该机构来完成的。

(2) 随时随地跟踪、控制合同的履行

将合同履行的实际情况与合同条款进行对比,如勘察设计活动是否符合法定规范、勘察设计活动进度是否符合合同规定的进度、发生的费用是否在合同价款之内等。如果实际情况与合同或计划存在差异,则要找出产生差异的原因,提出解决的办法,以采取措施纠正偏差。

(3) 合同资料的文档管理

勘察设计活动的每一环节,从投标开始直到勘察设计成果的提交,都要有完整的文档资料。这些文档资料是勘察设计师履行合同规定义务的数量和质量的证明。因此要十分注意对文档资料的管理。

(4) 勘察设计合同的索赔

索赔是法律赋予合同当事人的合法权利。充分利用索赔权利,能够有效维护承包人的经济利益。承包方在下列情况下可以按合同的规定向发包人提出相应索赔要求:

- ① 发包人不按合同要求按时、按质、按量提供资料,致使承包人无法正常工作。
- ② 发包人在合同履行中途提出变更要求。
- ③ 发包人不按合同规定支付合同价款。
- ④ 因其他发包人责任给承包人造成利益损害的情况。

4.2 建设工程委托监理合同

4.2.1 建设工程委托监理合同概述

建设工程监理,是指具有相应资质的监理单位受工程项目业主的委托,依据国家有关法律、法规,经建设主管部门批准的工程项目建设文件,建设工程合同和建设工程委托监理合同,对工程的建设实施的专业化监督和管理。

18世纪60年代,西方国家的产业革命导致了建筑业空前繁荣。惯于自己从事建设和监督的业主对日渐复杂、高技术的建设项目的管理逐渐感到力不从心,他们急需求助于有专门知识和经验技能的专业人员来代替自己从事项目的建设的管理和监督活动。于是,建设工程监理行业出现了。20世纪80年代以后,一些发展中国家和地区开始仿效这种做法。许多国际金融机构也把实行监理作为提供建设项目贷款的条件之一。在这种大环境和国内经济体制改革的双重前提下,我国建设部于1988年7月25日发出《关于开展建设监理工作的通知》,标志着我国建设监理制度的起步。

《中华人民共和国建筑法》第三十条规定:国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条规定:实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。《中华人民共和国合同法》第二百七十六条规定:建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

由此可见,建设项目的业主(建设监理的委托人)与建设监理单位(建设监理的受托人)之间是由委托合同所确立的权利义务关系;这个委托监理合同又是监理单位开展监理工作的最主要的直接依据之一。监理合同的适当订立和履行不仅关系到建设项目监理工作的成效和建设项目控制目标的实现与否,而且还关系到合同双方的直接利益。正因为如此,业主和监理单位都应当十分重视监理合同的订立和履行。

由于建设项目本身具有复杂性的特点,监理合同的内容不仅复杂而且十分专业化。对于处于委托人地位的建设项目业主来说,能够在平等、自愿的基础上自主签订内容完善、合乎科学规律的委托监理合同,一般而言,不在业主的知识、经验和能力范围之内。因此,委托监理合同示范文本十分必要。中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家工商行政管理局于2000年2月联合发布了《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF-2000-0202)(以下简称“示范文本”)。

4.2.2 《建设工程委托监理合同<示范文本>》的内容

由于业主主要通过公开招标程序选择监理单位并与之订立委托监理合同,因此对于合同双方具有法律约束力的所有文件,包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定都是监理合同的内容,这是广义建设监理合同的范畴。

狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本,即示范文本,它由三部分组成:委托监理合同、标准条件和专用条件。

1. 建设工程委托监理合同

建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。合同双方也在该部分签章。其条款样式如下:

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人_____与监理人_____经双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称:

工程地点:

工程规模:

总投资:

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

① 监理投标书或中标通知书;

② 本合同标准条件;

③ 本合同专用条件;

④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自_____年_____月_____日开始实施,至_____年_____月_____日完成。

本合同一式_____份,具有同等法律效力,双方各执_____份。

委托人:(签章)

住所:

法定代表人:(签章)

开户银行:

账号:

邮编:

电话:

本合同签订于:_____年_____月_____日

监理人:(签章)

住所:

法定代表人:(签章)

开户银行:

账号:

邮编:

电话:

第一条概括反映监理工程的概况。需要说明的是：由于目前我国监理单位主要还是在项目建设的施工阶段承担造价、质量和工期等方面的监督和管理工作，因此这一条款反映的仅仅是建设工程的施工阶段。其实，随着监理行业的不断成熟和发展，其服务范围会逐渐拓展到项目的前期策划、设计甚至是项目竣工验收之后的运营或物业管理阶段。由此将会导致监理合同内容发生变化，示范文本的内容也会增加。

第三条说明有效文件的组成范围。其中，第①项是在进行监理招标投标过程中形成的具有法律效力的文件；第②和第③项是在签订监理合同过程形成的文件（将在下一问题中详细介绍）；而第④项则是在监理合同履行过程中对于出现偶发事件，而合同又没有事先约定，或者对合同原有的约定做出修改，经双方商议而签订的补充或修正文件。这种补充或修正其实是合同履行中非常常见的现象，发生后一定要注意整理和归档。

需要说明的是，以上这些构成合同的文件，如果出现内容相互矛盾、抵触的情况，一般来说，后形成的文件具有优先的效力等级。因此监理合同文件的解释顺序为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级；第二是委托监理合同；第三是专用条件；第四是标准条件；第五是中标通知书；最后是中标人的监理投标文件。

第四条和第五条反映合同双方受托和委托的意愿。

2. 标准条件

虽然建设项目各不相同，对项目进行的监理工作也不尽相同，但作为委托人和受托人，其基本的权利义务有共同之处。标准条件就是对委托人和受托人的这些基本权利义务的规范，具有普遍性和通用性，是所有工程监理合同都可以参照使用的通用条款。

我国监理合同示范文本中的标准条件是参照国际工程监理通用合同条件，结合我国工程监理实际情况编制的。在实用中，这部分内容一般不做改动，双方依照采纳即可。其条款样式如下：

第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

一、下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

- (1) “工程”是指委托人委托实施监理的工程。
- (2) “委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
- (3) “监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
- (4) “监理单位”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
- (5) “总监工程师”是指经委托人同意，监理单位派到监理单位全面履行本合同的全权负责人。
- (6) “承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
- (7) “工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
- (8) “工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9) “工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10) “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11) “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

二、建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

三、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明，如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

四、监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

五、监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

六、监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

七、在合同期内或合同终止后，未经得有关方面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

八、委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

九、委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

十、委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

十一、委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

十二、委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)，负责与监理人联系，更换常驻代表，要提前通知监理人。

十三、委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

十四、委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

(1) 与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

(2) 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

十五、委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

十六、根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

十七、监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1) 选择工程总承包人的建议权。

(2) 选择工程分包人的认可权。

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4) 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5) 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6) 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7) 征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9) 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同约定的竣工期限的签认权。

(10) 在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

十八、监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应及时通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

十九、在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人权利

二十、委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

二十一、委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

二十二、监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

二十三、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

二十四、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

二十五、监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进

度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

二十六、监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

二十七、监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

二十八、监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

二十九、委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

三十、委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

三十一、由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。

三十二、在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过 42 天的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

三十三、监理人向委托人办理竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

三十四、当事人一方要求变更或解除合同时,应当在 42 日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

三十五、监理人在应当获得监理报酬之日起 30 日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后 14 日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后 42 日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

三十六、监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

三十七、当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后 21 日内没有收到答复,可在第一个通知发出后 35 日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。

三十八、合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

三十九、正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

四十、如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

四十一、支付监理报酬所求取的货币币种，汇率由合同专用条件约定。

四十二、如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

四十三、委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

四十四、在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

四十五、监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

四十六、监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

四十七、监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

四十八、监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

四十九、因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

第一条关于名词和用语含义的规定，是为避免双方在合同履行过程中因为对名词和专业用语的含义理解分歧产生不必要的纠纷而作出的。例如，标准条件第三十九条的规定说明了监理人的报酬分为三部分，分别是完成“正常的监理工作”、“附加工作”和“额外工作”的报酬。第一条第7款明确规定了“工程监理的正常工作的含义，则监理报酬中的固定金额部分就是由于监理人完成了该部分的工作内容应得到的酬金；委托人支付给监理人报酬中的“附加工作报酬”是由监理人完成的附加工作量决定的，第8款规定的“工程监理的附加工作”的内容就是计算“附加工作报酬”的依据。由此可以看出，双方对于合同中出现的所有名词和用语没有分歧理解非常重要，因此第一条的规定十分有必要。

第十七条规定了监理人享有的各项权利。应当注意的是，《合同法》第三百九十九条规定：受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的，应当经委托人同意；因情况紧急，难以和委托人取得联系的，受托人应当妥善处理委托事务，但事后应当将该情况及时报告委托人。监理合同是委托合同，所以监理人在行使其各项监理权利时，必须经过委托人的认可，并以书面形式在一定时期限内向委托人报告。这就是第十

七条第7款规定的原因。在实际运用时,标准条件中24小时的时间期限可以根据委托人和监理人的意愿和实际情况进行适当修改。

委托监理合同自双方签字之日起生效,有效期由双方在示范文本第一部分中约定。

第三十一至三十八条规定了委托监理合同变更、解除和终止的处理办法。

3. 专用条件

示范文本中的标准条件是对各种行业和专业的所有建设项目监理委托关系双方权利义务普遍性和通用性的规定。但是建设项目因地域、专业的不同而各不相同,对不同项目进行的监理工作也各有不同,因此仅有标准条件是远远不够的。例如标准条件中的第1条规定:委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。这其中,“双方约定的时间”以及“所需要的工程资料”就因工程的不同而各不相同,标准条件是无法确定的。这就需要双方在“专用条件”中作出约定和规定。因此,“专用条件”就是在标准条件的基础上,结合委托监理工程的项目特点、项目所在地地方法规、部门规章的规定,由双方经过协商,对于标准条件中无法确定的内容进行细化、具体化或修改而形成的条款。

为了方便对照,专用条件部分的条款编号不是按从小到大的顺序由第一条开始顺序编排的,而是与标准条件中相应条款的编号相对应的。例如标准条件第十条规定:委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。专用条件中的第十条就对此做了具体化的规定:委托人应提供的工程资料及提供时间:在×年×月×日之前向监理人提供如下资料:①××××;②××××;……。这样,两个条件中相同序号的条款共同组成一条内容完备的条款。再比如,标准条件第四十一条规定:如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,……如果委托人认为该时间太短,在与监理人协商达成“72小时”的一致意见后,可在专用条件中用相同序号的条款将时间修改为72小时。

由于监理服务提供的是工程施工期间的监督管理服务,这种服务在不同工程项目之间表现出来的差异性不像施工项目那么多,对于不同监理项目需要特别约定的内容不是很多。因此监理合同的专用条件较之施工合同的专用条件要简单得多。

专用条件的条款样式如下:

第三部分 专用条件

二、本合同适用的法律及监理依据:

四、监理范围和监理工作内容:

九、外部条件包括:

十、委托人应提供的工程资料及提供时间:

十一、委托人应在____天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

十二、委托人的常驻代表为:

十五、委托人免费向监理机构提供如下设施:

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:

补偿金额—

十六、在监理期间,委托人免费向监理机构提供____名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示,并免费提供____名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。

二十六、监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)〕:

赔偿金 = 直接经济损失 × 报酬比率 (扣除税金)

三十九、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:

(报酬 = 附加工作日数 × 合同报酬/监理服务日)

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:

四十一、双方同意用____支付报酬,按____汇率计付。

四十五、奖励办法:

奖励金额 = 工程费用节省额 × 报酬比率

四十九、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

(一) 提交____仲裁委员会仲裁;

(二) 依法向人民法院起诉。

附加协议条款: _____

第一条相应于标准条件的第二条。标准条件第二条规定:建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。合同双方可以根据该建设项目及其所在地,依照国家法律的有关规定,商议本合同适用的法规、规范、标准等,并将其列明在该条款中,如国家大剧院建设工程委托监理合同的专用条件第二条规定的合同适用的法规及依据是:

(1) 国家及北京市有关工程建设法规、规章、规定。执行时按北京市的、国家的、国外的(经有关方协商确认的)、双方协商的顺序执行。

(2) 国家竣工验收规范、规程、工程质量验收标准、北京市有关建筑安装工程技术资料管理的规定、国家和北京市档案馆的工程竣工资料规定。

(3) 北京市的工程建设概预算定额及有关费用标准、招投标工程中标通知及中标费用标准。

(4) 业主与监理公司签订的监理合同文件。

(5) 业主与总承包单位签订的施工总承包合同文件。

(6) 业主与工程分包单位签订的分包合同,业主与材料设备供应商签订的材料设备采购供应合同。

(7) 施工总承包与分包单位所签订的分包合同,施工总承包单位与材料设备供应商签订的材料设备采购供应合同。

(8) 本工程的设计文件、设计合同,包括工程施工过程中的设计变更洽商文件。

(9) 建设施工过程中业主与工程总承包之间签署的有关影响工程进度、费用、质量的函件。

(10) 本合同在实施过程中如与国家及本室颁布的新法规有抵触时,按国家当时颁布的新法规执行。

第四条相应于标准条件的第四条。标准条件第四条规定:……完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务……该条款就用来约定该建设项目监理工作具体的范围和内容。通常该条款应与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、单项工程承包所涵盖的范围相一致。例如可以包括如下范围和内容:

(1) 协助委托人选择承包人,组织设计、施工、设备采购等招标。

(2) 技术监督和检查:检查工程设计,材料和设备质量;对操作或施工质量的监督和检查等。

(3) 施工管理:包括质量控制、成本控制、计划和进度控制等。

第九条相应于标准条件的第九条。标准条件第九条规定:委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件……这里所说的外部关系是指与政府有关职能管理部门、与工程所在地周边社区、与工程的总承包和分包单位之间的关系。由于标准条件中无法指明,所以由双方在专用条件中明确规定。

第十条相应于标准条件的第十条。标准条件第十条规定:委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。在专用条件中就应当规定:委托人在×年×月×日之前向监理人提供如下资料:①××××;②××××;……。

第十一条相应于标准条件的第十一条。标准条件第十一条规定:委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。由于监理人与业主之间是委托合同关系,监理人是“受业主之托”,按照《中华人民共和国合同法》第三百九十九条的规定:受托人应当按照委托人的指示处理委托事务……,监理人在履行监理职责过程中经常需要要求业主对事务作出决定。业主作出这些决定的速度直接影响工程的进度和监理人的工作。因此专用条件的第十一条用来规定业主作出决定的最晚期限。

第十二条相应于标准条件的第十二条。标准条件第十二条规定:委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)……专用条件第十二条应明确该常驻代表的姓名。

第十五条相应于标准条件的第十五条。标准条件第十五条规定:委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员驻地房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。监理人可以与业主约定除标准条件规定以外的由业主免费提供的设施,并将所有免费提供的设施清单详细地列于专用条件的第十五条之中。应当注意的是,这些设施,除了消耗品外,在委托监理合同履行完毕后要交还给委托人。对于本应由业主提供,但实际由监理人自备的设施,业主应当予以经济补偿。这些监理人自备设施清单也要在该条款中列明,同时要列明按照标准条件规定的计算公式计算出的应由业主承担的补偿金额。

第十六条相应于标准条件的第十六条。标准条件第十六条规定:根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。专用条件的第十六条就用来规定这些工作人员和服务人员的数量。应当注意的是,这些工作人员和服务人员并不隶属于监理单位,而是隶属于业主,他们与监理单位是合作关系。在工作

中,他们主要的作用是协调监理单位与业主单位各部门之间的关系,并由总监理工程师调动使用。

第二十六条相应于标准条件的第二十六条。标准条件第二十六条规定:监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。在实际执行中,监理人的报酬计算有多种方法。比较常见的是:报酬总额=工程概算总额 \times 双方约定的比率(依据工程大小不同,幅度约在1.5%~2.5%之间),该约定的比率就称为“报酬比率”。则计算赔偿金时,以扣除监理人应缴税金后实得报酬计算出的比率乘以委托人的直接经济损失为监理人应向委托人支付的赔偿。

第二十九条相应于标准条件的第二十九条。标准条件第二十九条规定:正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。这里所说的报酬计算方法可以是第二十六条中提及的“报酬总额=工程概算总额 \times 双方约定的比率”,其中,工程概算费在500万元以下、500~1000万元、1000~5000万元不同规模的工程,约定的比率相应为2.5%、2.5~2.0%、2.0~1.4%。实践中,也可以采用总额包干或按照人数来计算报酬。

附加工作和额外工作的报酬计算公式通常相同,即:附加或额外工作的日数 \times (监理合同报酬总额/监理服务日数)。其中的“监理合同报酬总额/监理服务日数”表示的是监理人平均每日所获得的工作报酬。

第四十一条相应于标准条件的第四十一条。标准条件第四十一条规定:支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。该条款主要用于涉外工程监理合同,即监理合同一方当事人为涉外主体,结算涉及外币的情况。

第四十五条相应于标准条件的第四十五条。标准条件第四十五条规定:监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。对监理人实施奖励,以鼓励监理人积极运用其智力优势推行合理化建议,作用十分明显。本条款规定按照报酬比率将合理化建议所节省的资金额中的一部分奖励给监理人。当然,奖励与否,可以由双方当事人自主选择。

第四十九条相应于标准条件的第四十九条。标准条件第四十九条规定:因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉。由于委托合同而引发的纠纷属于经济纠纷。经济纠纷的解决,当事人之间的协商和他人出面进行的协调、调解不具有法律效力,从而也不是法定的纠纷解决的必经程序。根据有关法律规定,具有法律效力的解决经济纠纷的途径是诉讼或仲裁。而《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国仲裁法》规定了“或审或裁”制度,即由纠纷当事人自行选择将其纠纷交由具有管辖权的人民法院审理或者交由当事人自己选定的仲裁机构进行裁决,二者仅可选择其一,并且法院的判决和仲裁机构的裁决都具有终局法律效力。专用条件的该条款就用以记载委托人和受托人的这种选择。如果选择仲裁,由于仲裁不存在地域管辖,所以双方还需要一致约定具体的仲裁机构,即该条第1款。如果选择向人民法院起诉,由于法院的地域管辖,“工程所在地就是纠纷解决地”,则无须双方约定法院。

最后的“附加协议条款”用来明确双方在标准和专用条件中尚未明确的事项,或者针

对工程具体情况达成的特殊协议。

4.2.3 合同双方对委托监理合同的管理

建设监理委托合同的订立只是监理工作的开端，双方通过履行合同实现各自经济目的是双方最终意愿。合同双方，特别是受托人一方必须实施有效管理，监理合同才能得以顺利履行。为此，在监理合同履行过程中应注意如下问题：

1. 监理人应当完成的工作

监理合同的专用条款规定了监理工作的范围和-content，这些工作所谓“正常的工作”。但监理工作进行当中经常会发生订立合同时未能或不能合理预见而需要监理人完成的工作，这些工作就是所谓的“附加工作”和“额外工作”。需要注意的是，这部分工作一旦发生，也是监理人必须完成的。对于这些工作的懈怠会导致监理人法律意义上的“失职”从而可能承担相应的法律责任，因此在监理合同履行过程中需要谨慎对待。

“附加工作”和“额外工作”的酬金不包含在“监理人的报酬”当中，其计算办法已在专用条款第三十九条内做了约定。

“附加工作”可能包括：由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；增加监理工作的范围和-content等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。

“额外工作”指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务不超过 42 天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已经完成工程的部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。

2. 双方的义务

(1) 委托人的义务

除了合同条款列明的各项义务，为使监理人顺利进行工作，需要注意如下的协助工作也应由委托人承担：将授予监理人的权利、监理机构主要成员的分工、监理权限及时通知已选定的项目建设承包商，并在与承包商签订的建设工程合同中予以明确；为监理人驻工地的监理机构开展正常工作提供包括信息服务、物质服务和人员服务在内的协助服务，如协助监理人获取工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，以掌握产品信息，向监理人提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录，以方便监理工作的组织协调。再比如，委托人应免费向监理人提供职员和服务人员并在专用条件中写明提供的人数和服务时间，这些人员在监理服务期间只应服从监理工程师的指示，但监理人不对这些人员的失职行为负责。

(2) 监理人的义务

监理人在履行合同期间，应运用其技能负责地工作，公正维护委托人以及工程承包商的合法权益。如果监理人不按合同履行其职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员、终止监理合同或要求监理人承担相应的赔偿

责任或连带赔偿责任。

监理人开始执行监理工作前应向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及项目机构其他工作人员的情况。合同履行过程中如需要调换总监理工程师,必须经过委托人同意,并派出具有相应资质和能力的人员。

监理人不得泄露与本工程、合同业务有关的包括委托人、承包人在内的各方的保密资料。

非经委托人同意,监理人一方的工作人员不应接受来自任何有关工程建设各方的、委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

当委托人和承包人因合同发生争议时,监理机构应以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议诉诸诉讼或仲裁解决时,应提供真实的材料以作证据。

3. 监理酬金的计算和支付

1) 正常工作的酬金

正常酬金包括监理工作所需要的全部成本、税金和合理利润三部分。所谓成本,包括直接成本(如人员报酬、差旅费用、设备摊销费用和外部协作费用等)和间接成本(如管理人员工资、业务费用、办公费用、培训资料费用和其他行政活动经费等)。

国家物价局、建设部颁发的价费字 479 号《关于印发工程建设监理费有关规定的通知》规定了四种监理费的计算方法:

(1) 按照监理工程概预算的百分比计收。

(2) 按照参与监理工作的年度平均人数计算。

(3) 不宜按(1)、(2)两项办法计收的,由委托人和监理人按商定的其他方法计收。

(4) 中外合资、合作、外商投资的建设工程,由双方参照国际标准协商确定。

第(1)种方法简便、科学,适用范围较广,一般新建、改建、扩建的工程都适用这种方法;第(2)种方法主要适用于单工种或临时性,或不宜按第(1)种方法计算报酬的工程。

2) 附加工作的酬金

增加监理工作时间的补偿酬金按增加工作的天数计算,即:

报酬 = 附加工作天数 × 合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数

增加监理工作内容属于监理合同的变更,双方应另行签订补充协议,具体商定报酬额或报酬的计算方法。

3) 额外工作的酬金

额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算,可参照上式计算。

4) 酬金的支付

监理酬金的支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取首期支付一定百分比酬金,以后每月(季)等额支付,工程完工并竣工验收后结算尾款的支付方式。

如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应在收到支付通知书的 24 小时内向监理人发出表示异议的通知,但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

委托人在商定的支付期限内未予支付酬金的,应向监理人补偿相应的利息,利息按规

定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。

4. 违约责任

在《委托监理合同示范文本》中规定了约束双方行为的条款,如果监理人未按合同总要求的职责提供服务,或委托人违背了其对监理人的责任时,均应向对方承担赔偿责任。

应当注意到的是,如果委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失;但因监理人的过失给委托人造成损失的累计赔偿额不应超出除去税金后的监理报酬总额。并且,监理人不对责任期以外发生的任何事由引发的损失或损害负责,也不对第三方违反合同承担责任。

5. 监理合同的生效、有效期、变更与终止

监理合同自签订之日起生效。其有效期就是示范文本第一部分“委托监理合同”第五条规定的起止期间。如果合同履行过程中双方商定延期,则完成时间相应顺延,合同有效期就是自合同生效起至合同完成的时间。

委托监理合同常常会发生变更,例如改变监理工作服务范围、工作深度、工作进程等。需要注意,变更合同需要在42日前通知对方并应书面载明,口头协议在无充分证据情况下不受法律保护。因变更合同使对方遭受损失,除依法可免除责任的情况外,应由责任方予以赔偿。

由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或工作持续时间,增加的工作应视为附加的工作,并应得到附加工作酬金。

工程竣工验收并办理了承包人与委托人的工程移交手续后,监理人应收到监理酬金的尾款,至此,委托监理合同即告终止。

如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出其未履约义务的通知。若委托人在21天内未收到答复,可在第一个通知发出35日后发出终止监理合同的通知,合同即终止。

监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人作出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同的通知。如果14日内未得到委托人答复,可再次向委托人发出终止合同的通知。如果第二次通知发出42日后仍未得到答复,监理人可终止合同,也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

合同的终止不影响双方应有的权利和义务。

复习思考题

1. 说明建设工程勘察设计公司示范文本的作用。
2. 《建设工程勘察设计公司示范文本》的种类有哪些?各适用于哪些勘察活动?
3. 试比较《合同法》第十条所规定的合同内容与《建设工程勘察设计公司示范文本》的条款,并说明两者之间的关系。
4. 勘察设计公司委托方与承包方应如何做好对勘察合同的管理工作?

5. 委托监理合同包括哪些文件?
6. 监理合同示范文本有什么作用? 其中的标准条件和专用条件之间是什么关系?
7. 监理合同双方有哪些权利和义务?
8. 监理人应当完成的工作有哪些?
9. 监理人的酬金包括哪几部分? 分别如何计算?

练 习 题

1. 单项选择题(每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

- (1) 监理工程师在履行合同义务时工作失误, 给施工单位造成损失, 施工单位应当要求()赔偿损失。
 - A. 建设单位
 - B. 监理单位
 - C. 监理工程师
 - D. 项目经理
- (2) 组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释, 互为说明。当出现含糊不清或矛盾时, 具有第一优先解释顺序的文件是()。
 - A. 合同专用条款
 - B. 投标书
 - C. 协议书
 - D. 合同标准条款
- (3) 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本, 此时监理单位()。
 - A. 应从委托方获得附加监理酬金
 - B. 应从委托方获得额外监理酬金
 - C. 应从承包方获得合理化建议的奖金
 - D. 不应从任何一方获得额外奖励或酬金
- (4) 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间, 此项工作应属于()。
 - A. 正常工作
 - B. 附加工作
 - C. 额外工作
 - D. 意外工作
- (5) 依据监理委托合同规定, 委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。
 - A. 工程总投资超过预期金额
 - B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
 - C. 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
 - D. 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
- (6) 监理合同示范文本规定, ()属于监理服务的额外工作。
 - A. 由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间
 - B. 合同内约定由委托人承担的义务, 经过协商改由监理单位承担
 - C. 应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作
 - D. 出现不应由监理单位负责的特殊情况, 导致终止执行监理任务的善后工作
- (7) 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆, 开展监理业务时监理单位

位使用自备车辆,则在监理服务期间的车辆使用费用应由()。

- A. 监理单位承担
- B. 承包商承担
- C. 委托人补偿,属于附加监理费用
- D. 委托人补偿,属于额外监理费用

(8) 监理合同示范文本规定,合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备,则应按()计算设施使用补偿费。

- A. 补偿金额=设备在工程上使用的时间×设备原值
- B. 补偿金额=设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率
- C. 补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费
- D. 补偿金额=设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值+管理费

2. 多项选择题(每题的备选项中,有两个或两个以上符合题意,至少有1个错误)

(1) 监理委托合同中,属于委托人权利有()。

- A. 规划设计决定权
- B. 工程设计变更审批权
- C. 实施项目的质量监督控制权
- D. 工程建设有关协作单位协调主持权
- E. 生产工艺设计认定权

(2) 委托人在监理合同中的委托工作内容可以是()。

- A. 完成设计任务
- B. 制订特殊工艺的质量标准
- C. 编制施工组织设计
- D. 监督工程施工质量
- E. 负责采购设备

(3) 监理单位的义务包括()。

- A. 选择承担工程项目建设的实施单位
- B. 与承包商签订施工合同
- C. 公正地维护有关各方的合法权益
- D. 不得泄露与本工程有关的保密资料
- E. 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

(4) 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。

- A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
- B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
- C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
- D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
- E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

(5) 因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿的原则是()。

- A. 按工程实际受到的损害计算
- B. 按委托人认为所受到的损害计算

- C. 按实际损害计算一定比例的赔偿金
 - D. 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
 - E. 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
- (6) 按照监理合同示范文本的规定, 委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时, ()。
- A. 发出拒付全部酬金通知书, 要求监理单位重新提交酬金支付申请表
 - B. 及时地发出异议通知书
 - C. 按时支付全部酬金, 异议部分下次支付时再予扣款
 - D. 按时支付无异议部分酬金, 拒付有异议部分酬金
 - E. 拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息

第5章 FIDIC 施工合同条件

教学提示:本章简要介绍了 FIDIC 及 FIDIC 的不同版本的合同文件;详细介绍了 FIDIC1999 年出版的四个合同条件的特点及适用情况;重点介绍了 1999 年版施工合同条件的内容,包括合同条件中的词语定义、各方的权利与义务、质量管理、进度管理、支付管理及其他管理性条款的内容。

教学要求:通过本章教学应使学生了解 FIDIC 出台的不同版本的合同条件;熟悉 1999 年出台的四个合同条件的特点和适用条件;掌握 1999 年版施工合同条件的内容。

5.1 FIDIC 及 FIDIC 合同简介

5.1.1 FIDIC 简介

FIDIC 是“国际咨询工程师联合会”法文名称 *Fédération International Des Ingénieurs-Conseils* 前 5 个字母。其英文名称是 *International Federation of Consulting Engineers*。FIDIC 于 1913 年由欧洲 5 国独立的咨询工程师协会在比利时根特成立,现在瑞士洛桑。

FIDIC 成立 90 多年来,对国际上实施工程建设项目,以及促进国际经济技术合作的发展起到了重要作用。由该会编制的《业主与咨询工程师标准服务协议书》(白皮书)、《土木工程施工合同条件》(红皮书)、《电气与机械工程合同条件》(黄皮书)、《工程总承包合同条件》(桔黄皮书)被世界银行、亚洲开发银行等国际和区域发展援助金融机构作为实施项目的合同和协议范本。这些合同和协议文本,条款内容严密,对履约各方和实施人员的职责义务做了明确的规定;对实施项目过程中可能出现的问题也都有较合理规定,以利于遵循解决。这些协议性文件为实施项目进行科学管理提供了可靠的依据,有利于保证工程质量、工期和控制成本,使雇主、承包人以及咨询工程师等有关人员的合法权益得到尊重。此外, FIDIC 还编辑出版了一些供雇主和咨询工程师使用的业务参考书籍和工作指南,以帮助雇主更好地选择咨询工程师,使咨询工程师更全面地了解业务工作范围和根据指南进行工作。该会制订的承包商标准资格预审表、招标程序、咨询项目分包协议等都有很实用参考价值,在国际上受到普遍欢迎,得到了广泛承认和应用, FIDIC 的名声也显著提高。

中国工程师咨询协会代表我国于 1996 年 10 月加入了该组织。

5.1.2 FIDIC 合同条件的发展历程

1. FIDIC 合同条件的演变

1957 年, FIDIC 与国际房屋建筑和公共工程联合会[现在的欧洲国际建筑联合会(FIEC)在英国咨询工程师联合会(ACE)颁布的《土木工程施工合同文件格式》的基础上出版了《土木工程施工合同条件(国际)》(俗称“红皮书”),常称为 FIDIC 条件。该条件分为两部分,第一部分是通用合同条件,第二部分为专用合同条件。

1963年,首次出版了适用于业主和承包商的机械与设备供应和安装的《电气与机械工程施工标准合同条件格式》即黄皮书。

1969年,红皮书出版了第2版。这版增加了第三部分,疏浚和填筑工程专用条件。

1977年,FIDIC和欧洲国际建筑联合会(FIEC)联合编写 *Federation International Europeenne de la Construction*(巴黎),这是红皮书第3版。

1980年,黄皮书出了第二版。

1987年9月红皮书出版了第4版。将第一部分(专用合同条件)扩大了,单独成册出版,但其条款编号与第二部分对应,使两部分合在一起共同构成确定合同双方权利和义务的合同条件。第一部分必须根据合同的具体情况起草。为了方便第一部分的编写,其编有解释性说明以及条款的例子,为合同双方提供了必要且可供选择的条文。

同时出版的还有黄皮书第一版《电气与机械工程施工合同条件》,分为三个独立的部分:序言、通用条件和专用条件。

1995年,出版了橘皮书《设计—建造和交钥匙合同条件》。

以上的红皮书(1987)、黄皮书(1987)、橘皮书(1995)和《土木工程施工合同—分合同条件》、蓝皮书(《招标程序》)、白皮书(《顾客/咨询工程师模式服务协议》)、《联合承包协议》、《咨询服务分包协议》共同构成FIDIC彩虹族系列合同文件。

1999年9月,FIDIC出版了一套4本全新的标准合同条件:

《施工合同条件》(新红皮书)的全称是:《由业主设计的房屋和工程施工合同条件》(*Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer*);《设备与设计—建造合同》(新黄皮书)的名称是:《由承包商设计的电气和机械设备安装与民用和工程合同条件》(*Conditions of Contract for Plant and Designed-Build for Electrical and Mechanical Plant and Building and Engineering Works Designed by the Contractor*);《EPC/交钥匙项目合同条件》(*Conditions of Contract for EPC/Turnkey*)——银皮书(*Silver Book*)。FIDIC还编写了适合于小规模项目的《简明合同格式》(*Short Form of contract*)——绿皮书(*Green Book*)。

2. FIDIC(1999年版)合同条件介绍

1) 《施工合同条件》(新红皮书)

(1) 适用范围

该合同条件适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目。新红皮书基本继承了原红皮书的“风险分担”的原则,即雇主愿意承担比较大的风险。因此,雇主希望提供几乎全部设计(可能不包括施工图、结构补强等);雇用工程师管理合同,管理施工以及签证支付;希望在工程施工的全过程中持续得到全部信息,并能作变更等;希望支付根据工程量清单或通过的工作总价。而承包商仅根据雇主提供的图纸资料进行施工。当然,承包商有时要根据要求承担结构、机械和电气部分的设计工作。那么,《施工合同条件》(新红皮书)正是此种类型业主所需的合同范本。

(2) 特点

① 新红皮书放弃了原红皮书第四版的框架,而是继承了1995年橘皮书的格式,合同条件分为20个标题,与新版黄皮书、银皮书合同条件的大部分条款一致,同时加入了一些

新的定义,便于使用和理解。

② 新红皮书对雇主的职责、权力、义务有了更严格的要求,如对雇主资金安排、支付时间和补偿、雇主违约等方面的内容进行了补充和细化。

③ 对承包商的工作提出了更严格的要求,如承包商应将质量保证体系和月进度报告的所有细节都提供给工程师,在何种条件下将没收履约保证金,工程检验维修的期限等。

④ 索赔、仲裁方面:增加了与索赔有关的条款并丰富了细节,加入了争端委员会的工作程序,由3个委员会负责处理那些工程师的裁决不被双方认可的争端。

2) 《设备和设计—建造合同条件》(新黄皮书)

(1) 适用范围

《设备和设计—建造合同条件》特别适合于“设计—建造”(Design-Construction)建设发行方式。该合同范本适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、雇主愿意将部分风险转移给承包商的情况。《设备和设计—建造合同条件》与《建造合同条件》相比,最大区别在于前者雇主不再将合同的绝大部分风险由自己承担,而将一定风险转移至承包商。

(2) 特点

① 借鉴1995年橘皮书的格式,合同结构类似新红皮书,并与新红皮书、银皮书相统一。

② 对设计管理的要求更加系统、严格,通用条件里就专门有一条共7款关于设计管理工作的规定。同时赋予了工程师较大权力对设计文件进行审批;限制了雇主在更换工程师方面的随意性,如果承包商对雇主提出的新工程师人选不满意,则雇主无权更换;雇主对承包商的支付,采用以总价为基础的合同方式,期中支付和费用变更的方式均有详细规定。

③ 承包商要根据合同建立一套质量保证体系,在设计和实施开始前,都要将其全部细节送工程师审查;增加可供选择的“竣工检验”并严格了“竣工检验”环节以确保工程的最终质量;另外,新黄皮书的规定使承包商要承担更多的风险,如将“工程所在国之外发生的叛乱、革命、暴动政变、内战、离子辐射、放射性污染等”在原黄皮书中由业主承担的风险改由承包商来承担,当然因为设计工作是由承包商来提供的,设计方面的风险自然也由承包商承担。

④ 索赔、仲裁方面:与新红皮书一样,采用DAB工作程序来解决争端。

3) 《EPC/交钥匙项目合同条件》(银皮书)

(1) 适用范围

《EPC/交钥匙项目合同条件》是一种现代新型的建设履行方式。该合同范本适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、承包商承担绝大部分风险的情况。与其他三个合同范本的最大区别在于,在《EPC/交钥匙项目合同条件》下雇主只承担工程项目的很小风险,而将绝大部分风险转移给承包商。这是由于作为这些项目(特别是私人投资的商业项目)投资方的业主在投资前关心的是工程的最终价格和最终工期,以便他们能够准确的预测在该项目上投资的经济可行性。所以,他们希望少承担项目实施过程中的风险,以避免追加费用和延长工期。

《EPC/交钥匙项目合同条件》特别适宜于下列项目类型:

① 民间主动融资 PFI(Private Finance Initiative),或公共/民间伙伴 PPP(Public/Private

Partnership), 或 BOT(Built Operate Transfer)及其他特许经营合同的项目。

② 发电厂或工厂且业主期望以固定价格的交钥匙方式来履行项目。

③ 基础设计项目(如公路、铁路、桥、水或污水处理石、水坝等)或类似项目, 业主提供资金并希望以固定价格的交钥匙方式来履行项目。

④ 民用项目且业主希望采纳固定价格的交钥匙方式来履行项目, 通常项目的完成包括所有家具、调试和设备。

(2) 特点

① EPC 合同明确划分了雇主与承包商的风险, 特别是承包商要独自承担发生最为频繁的“外部自然力”这一风险。

② 由于雇主承担的风险已大大减少, 就没有必要专门聘请工程师来代表他对工程进行全面细致的管理。EPC 合同中规定, 业主或委派业主代表直接对项目进行管理, 人选的更迭无须经承包商同意; 雇主或雇主代表对设计的管理比黄皮书宽松; 但是对工期和费用索赔管理是极为严格的, 这也是 EPC 合同订立的初衷。

4) 《简明格式合同》(绿皮书)

(1) 适用范围

FIDIC 编委会编写绿皮书的宗旨在于使该合同范本适用于投资规模相对较小的民用和土木工程, 如:

① 造价在 500 000 美元以下以及工期在 6 个月以下。

② 工程相对简单, 不需专业分包合同。

③ 重复性工作。

④ 施工周期短。

承包商根据雇主或雇主代表提供的图纸进行施工。当然, 简明格式合同也适用于部分或全部由承包商设计的土木电气、机械和建筑设计的项目。

类似银皮书关于管理模式的条款, “工程师”一词也没有出现在合同条件里。这是因为在相对直接和简单的项目中, 工程师的存在没有必要性。当然, 如果业主愿意, 他仍然可以任命工程师。

鉴于绿皮书短小、简单、易于被用户掌握, 编委会强烈地希望绿皮书能够被非英语系国家翻译成其母语, 从而广泛地应用。此外, 对发展中国家、不发达国家和在世界范围邀请招标的项目, 绿皮书也被推荐使用。

(2) 特点

① 正如绿皮书的名字一样, 本合同格式的最大特点就是简单, 合同条件中的一些定义被删除了而另一些被重新解释; 专用条件部分只有题目没有内容, 仅当业主认为有必要时才加入内容; 没有提供履约保函的建议格式; 同时, 文件的协议书中提供了一种简单的“报价和接受”的方法以简化工作程序, 即将投标书和协议书格式合并为一个文件, 业主在招标时在协议书上写好适当的内容, 由承包商报价并填写其他部分, 如果业主决定接受, 就在该承包商的标书签字, 当返还的一份协议书到达承包商处的时候, 合同即生效。

② 合同条件中关于“业主批准”的条款只有两款, 从而在一定程度上避免了承包商将自己的风险转移给业主; 通过简化合同条件, 将承包商索赔的内容都合并在一个条款中; 同时, 提供了好几种变更估价和合同估价方式以供选择。

③ 在竣工时间、工程接收、修补缺陷等条款方面也和其他合同文本有一定的差异。

3. FIDIC 合同条件的应用

(1) 国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用

在世界各地,凡世行、亚行、非行贷款的工程项目以及一些国家和地区的工程招标文件中,大部分全文采用 FIDIC 合同条件。在我国,凡业行贷款项目,全文采用 FIDIC “红皮书”。凡世行贷款项目,在执行世行有关合同原则的基础上,执行我国财政部在世行批准和指导下编制的有关合同条件。

(2) 合同管理中对比分析使用

许多国家在学习、借鉴 FIDIC 合同条件的基础上,编制了一系列适合本国国情的标准合同条件。这些合同条件的项目和内容与 FIDIC 合同条件大同小异。主要差异体现在处理问题的程序规定上以及风险分担规定上。FIDIC 合同条件的各项程序是相当严谨的,处理业主和承包商风险、权利及义务也比较公正。因此,业主、咨询工程师、承包商通常都会将 FIDIC 合同条件作为一把尺子,与工作中遇到的其他合同条件相对比,进行合同分析和风险研究,制定相应的合同管理措施,防止合同管理上出现漏洞。

(3) 在合同谈判中使用

FIDIC 合同条件的国际性、通用性和权威性使合同双方在谈判中可以有“国际惯例”为理由要求对方对其合同条款的不合理、不完善之处作出修改或补充,以维护双方的合法权益。这种方式在国际工程项目合同谈判中普遍使用。

(4) 部分选择使用

即使不全文采用 FIDIC 合同条件,在编制招标文件、分包合同条件时,仍可以部分选择其中的某些条款、某些规定、某些程序甚至某些思路,使所编制的文件更完善、更严谨。在项目实施过程中,也可以借鉴 FIDIC 合同条件的思路和程序来解决和处理有关问题。

需要说明的是,FIDIC 在编制各类合同条件的同时,还编制了相应的“应用指南”。在“应用指南”中,除了介绍招标程序、合同各方及工程师职责外,还对合同每一条款进行了详细解释和说明,这对使用者是很有帮助的。另外,每份合同条件的前面均列有有关措辞的定义和释义。这些定义和释义非常重要,它们不仅适合于合同条件,也适合于其全部合同文件。

5.2 FIDIC 施工合同条件

5.2.1 新版 FIDIC 施工合同文本格式

FIDIC 出版的所有合同文本结构,都是以通用条件、专用条件和其他标准化文件的格式编制。

1. 通用条件

所谓“通用”,其含义是工程建设项目不论属于哪个行业,也不管处于何地,只要是土木工程的施工均可适用。条款内容涉及:合同履行过程中业主和承包商各方的权利与义务,工程师(交钥匙合同中为业主代表)的权利和职责,各种可能预见到事件发生后的责

任界限,合同正常履行过程中各方应遵循的工作程序,以及因意外事件而使合同被迫解除时各方应遵循的工作准则等。

2. 专用条件

专用条件是相对于“通用而言”,要根据准备实施的项目的工程专业特点,以及工程所在地的政治、经济、法律、自然条件等地域特点,针对通用条件中条款的规定加以具体化。可以对通用条件中的规定进行相应补充完善、修订或取代其中的某些内容,以及增补通用条件中没有规定的条款。专用条件中条款序号应与通用条件中要说明条款的序号对应,通用条件和专用条件内相同序号的条款共同构成对某一问题的约定责任。如果通用条件内的某一条款内容完备、适用,专用条件内可不再重复列此条款。

3. 标准化的文件格式

FIDIC 编制的标准化合同文本,除了通用条件和专用条件以外,还包括有标准化的投标书(及附录)和协议书的格式文件。

投标书的格式文件,是投标人愿意遵守招标文件规定的承诺表示。投标人只需要填写投标报价并签字后,即可与其他材料一起构成有法律效力的投标文件。投标书附件列出了通用条件和专用条件内涉及工期和费用内容的明确数值,与专用条件中的条款序号和具体要求相一致,以使承包商在投标时予以考虑。这些数据经承包商填写并签字确认后,合同履行过程中作为双方遵照执行的依据。

协议书是业主与中标承包商签订施工承包合同的标准化格式文件,双方只要在空格内填入相应内容,并签字盖章后合同即可生效。

5.2.2 合同条件的特点

1. 国际性、权威性、通用性

FIDIC《土木工程施工合同条件》的国际性和权威性,从其出台的过程以及它多年被应用于国际工程所证实。其通用性,表现在只要是土木、工程,包括房屋工程、桥隧工程、公路工程等均通用;另一方面,它不仅用于国际工程,也可以应用于国内工程,如我国国内工程广泛应用的交通部编制的《公路工程施工合同条件》就是等同采用 FIDIC 合同条件,铁道部编制的《铁路工程施工合同条件》等就是等效采用 FIDIC 合同条件而出台的。建设部的施工合同也是如此。

2. 权利和义务明确、职责分明、趋于完善

FIDIC 合同条件文件不仅对工程的规模、范围、标准以及费用的结算办法都规定得十分明确,而且对工程管理过程中的许多细节都做了明确的规定,同时对雇主、承包商、工程师等各方权责规定得十分明确,这是保证工程实施的重要条件,从而减少执行过程中的误解和纠纷。如雇主与承包商之间是雇用与被雇用的关系,但是雇主必须通过工程师来传达自己的命令。雇主和工程师是委托与被委托的关系,但是雇主不能干预工程师的正常工作。但是可以向监理单位提出更换不称职的监理人员。工程师和承包商之间没有任何合同关系,双方是监理与被监理的关系,承包商所进行的工作都必须通过工程师的批准,严格遵照工程师的指示。但是承包商可以通过法律手段来保护自己的合法权益。FIDIC 合同条

件所确定的各方之间的关系可保证工程按照合同顺利进行。

3. 文字严密、逻辑性强、内容广泛具体、可操作性强

合同各个条件之间既有相互制约的关系,又有互相补充的关系,从而构成了一个完整的合同体系。如《施工合同条件》1.5款,同时也明确规定了文件的优先次序。

4. 法律制度完善

合同条件中形成了一套完整的具有法律特征的管理制度体系,如工程保险制度、合同担保制度、质量责任制度、价款支付制度、施工监理制度等。使得合同顺利履行具备了制度上的保证。

5. 合同条件具有唯一性

FIDIC 合同条件是承包商和工程师各自工作的唯一依据。双方在签订合同之后,就只能以此合同作为办事依据。

5.2.3 部分重要词语的定义

1. 合同及合同文件

1) 合同

按照 FIDIC 施工合同条件第 1.1.1.1 条规定,合同指合同协议书、中标函、本条件(合同条件;包括通用条件和专用条件)、规范、图纸、资料表以及合同协议书或中标函中列出的其他文件。

这里的合同实际上是全部合同文件的总称,它包括了全部的对双方有约束力的文件。这些文件主要有:

(1) 合同协议。

(2) 中标函:一方面可能是指雇主对承包商投标函的正式接受函,另一方面它还可能包括双方商定的其他内容。如在评标中,雇主发现投标书中有些内容不清楚或甚至错误,投标人对这些的澄清和确认。若整个合同文件中没有“中标函”一词,则此时中标函应理解为“协议书”。

(3) 投标函:指的是投标人的报价函,通常包括投标人的承诺和投标人根据招标文件的内容,提出为雇主承建本招标项目而要求的合同价格。(注:若中标后签订了合同,这里提到的投标人就是承包人)

(4) 合同条件:主要指专用条件和通用条件。

(5) 规范:它的主要作用是在合同中对招标项目从技术方面进行描述,提出项目在施工中应满足的技术标准、程度等,与我国国内施工的技术规范、规程等含义一致。它是各方(雇主、承包商、工程师)解决项目相关的技术问题的依据。究竟用什么规范,用哪国的规范由当事人双方在合同中约定。

(6) 图纸:指项目实施过程中的工程图纸。以及包括由雇主(或其代表)按照合同发出的任何补充和修改的图纸。这里图纸实质可能有两个来源,一是雇主提供的,当然包括其对其图纸的修改和变更,另一个是承包商设计提供的,当然应经过工程师的同意和认可。这里图纸与国内施工合同文本含义是一致的。

(7) 资料表:指合同中名为资料表的文件中,由承包商填写并随投标一起提交的资料文件。这类文件包括工程量表、数据、表册、费率或价格表(报价单)。

(8) 其他文件。

另外,合同文件包括在合同履行过程中,当事人双方补充的一些协议如会议纪要等。

2) 合同文件的优先次序

由上面分析知,在 FIDIC 施工合同中,构成对当事人双方有约束力的合同文件有 8 个,由于合同文件形成的时间长,在实施中情况在不断发生变化,可能受到诸多外界因素影响,因而这些文件客观上不可避免地会出现一些不同,甚至矛盾的现象,因而应对文件作出解释。在此, FIDIC 施工合同作了三个方面的说明。

(1) 组成合同的各文件是可以相互解释的。如专用条件就是对通用条件的解释和说明。

(2) 在解释时,各文件的优先次序应按上述“合同”中列到的合同文件的顺序进行,即“(1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)→(7)→(8)”。应当说明的是,合同履行过程中,双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。

(3) 若文件之间出现歧义或不一致,工程师应作出必要的澄清或指示。

3) 合同协议书

(1) 协议书的签订。一般承包商收到中标函后 28 天内双方签订,其格式按专用条件中附的格式。同时,签订合同的印花税和类似费用如果有的话,由雇主承担。

(2) 协议书的内容。FIDIC 施工合同条件规定的“合同协议书”实质上是一个统领性的文件。对所有的合同文件作了归纳,从其内容看主要有三个方面:

① 包含的全文件中的术语具有合同条件中所定义的含义;

② 构成整个工程合同的全部文件的清单;

③ 说明当事人双方对合同内容的认可及履行合同的承诺。

2. 投标文件相关的定义

(1) 投标函

投标函指的是投标人的报价函,其格式一般由雇主方在招标文件中拟订好,由投标人填写,作为其正式报价函,它是投标书的核心部分之一。

(2) 投标书

投标书是指投标者投标时提交给招标人的且构成合同文件的全部文件的总称。它主要包括有投标函;填写的各类表格及文件,如工程量表、计工表、投标保证金函等以及其他的文件,如施工方法、方案、进度计划安排、人员安排、设备清单、分包计划等。

(3) 投标函附录

这个文件是附在投标函后面并构成投标函一部分的一个附录,它将合同条件中的核心内容简单列出,并给出在合同中相应的条款号。这个附录中的大部分内容雇主在招标时已规定,少部分由投标人填写,因而对雇主规定的相关内容、数据承包商应仔细研究。

3. 合同各方及人员

(1) 雇主

指在投标函附录中称为雇主的当事人以及其财产所有权的合法继承人(这里也可理解为业主或发包人)。

(2) 承包商

指为雇主接受的在投标函中称为承包商的当事人, 以及其财产所有权的合法继承人。

(3) 工程师

指由雇主任命的并在投标函附录中指名的为实施合同担任工程师的人员, 或者在实施中雇主替换工程师由其重新任命并通知承包商的人员。这里工程师的含义与国内的总监理工程师的含义基本一致, 当然他们的职责有很大的不同。

(4) 雇主人员

根据定义, 雇主人员主要包括: 工程师、工程师的助理人员, 工程师和雇主的雇员, 包括职员和工作, 工程师和雇主通知承包商为雇主方工作的那些人员。

由定义可以知道, 新 FIDIC 施工合同条件明确将工程师列为雇主的人员, 从而改变和淡化了工程师这一角色的“独立性”和“公正无偏”的性质, 这也是与以前 FIDIC 施工合同条件各版本不同的地方之一。这种变化是与实际紧密结合的。在国内, 一些学者对我国工程师(监理工程师)也有类似的定位, 如他们认为工程师应在不损害承包商利益的前提下维护雇主的利益。

(5) 承包商人员

指承包商的代表和承包商现场聘用的所有人员。这里所有人员包括一般职员如技术人员、管理人员、财务人员等, 工人、承包商和一般分包商的人员, 其他人员如大型设备、家、来安装或协助的人员。

这样明确规定承包商的人员, 有利于在合同履行过程中划清责任, 即这些人员若在现场出现了非雇主承担责任或风险的事件受到影响, 则由承包商承担相关责任。

4. 日期、工期相关的概念

(1) 基准日期

合同中定义的基准日期是指投标截止日期之前的 28 天所对应的日期。这一日期为雇主与承包商承担风险的界线, 即在基准日期之后发生的一切风险作为一个有经验的承包商在投标时若不能合理预见, 则由雇主承担, 如物价的变化, 当地政策的变化等, 在此日期之前, 无论是何种涉及投标报价风险发生, 均由承包商承担。

(2) 开工日期

按合同规定, 开工日期若在没有明确规定具体的时间, 则开工日期应在承包商收到中标函后的 42 天内, 由工程师在这个日期前 7 天通知承包商, 承包商在开工日后应尽可能快地施工。

此日期是计算工期的起点, 同时由于雇主的原因使工程师不能发布开工日期, 若给承包商造成损失, 则承包商可以向雇主索赔。

(3) 工期

在合同条件中, 没有明确工期的含义, 但可理解为双方签订合同时所有确定的工期即双方“可接受的工期”。随着合同的履行可能会出现一些影响工期的事件, 则工期可以顺延, 即工期是会变化的, 因而不能简单地用“工期”来判断承包商是否延误工期。

(4) 竣工时间

这里其实指的是一个时间段, 就是合同要求承包商完成工程的时间, 这段时间包括承

包商合理地获得的延长工期,因而可以理解为竣工时间为签订合同的时间加上合理的顺延时间,即为合同工期。可以用竣工时间(合同工期)来判定承包商是否延误工期。

(5) 施工工期

指从开工日期到项目通过竣工验收移交,工程接收证书中注明的竣工口止这一时间段。可以用施工工期与竣工时间(合同工期)对比,若施工工期长于竣工时间,说明承包商延误工期,等于竣工时间,说明按时完工,若短于竣工时间,则说明承包商提前竣工。

(6) 缺陷通知期

指从竣工日期算起,通知工程或分项存在缺陷的期限,在此期间应完成工程接收证书中注明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。这个期限双方在附录中可以约定,工程师也可以根据具体情况予以延长。这个期限与我国规定的质保期相类似。

(7) 合同的有效期

从双方签订合同开始到承包商提交的“结清单”生效而且雇主支付为止的这段时间为合同的有效期,此期间,合同对双方均有约束力。它包括了施工期、缺陷通知期等。

5. 价款与支付相关的概念

1) 中标合同金额

指中标函中所认可的工程施工、竣工和修补任何缺陷所需的费用。这实质上是中标的承包商的投标价格。此时成为双方签合同时的可接收价款。在合同履行中,此金额会发生变化的,究其原因主要有以下几个方面的影响因素:

(1) FIDIC 施工合同条件一般运用于大型复杂的施工采用单价合同承包。这样,承包商根据工程量清单来报价,由于工程量随着合同的履行可能会发生的变化,而单价合同的支付的原则是按承包商实际完成工程量乘以所报单价结算工程款,因而,投标时的中标合同会发生变化。

(2) 可调价合同

大型复杂工程的工程较长,通用条件中包括合同工期内因物价变化对施工成本产生影响后计算调价费用的条款,每次支付工程进度款时均要考虑约定可调价范围内项目当地市场价格的涨落变化。而这笔调价款没有包含在中标价格内,仅在合同条款中约定了调价原则和调价费用的计算方法。这说明单价在一定的条件下也会发生变化。

(3) 发生应由雇主承担责任的事件

合同履行过程中,可能因雇主的行为若他应承担风险责任的事件发生后,导致承包商增加施工成本,合同相应条款都规定应对承包商受到的实际损害给予补偿。

(4) 承包商的质量责任

如承包商提供的不合格材料和工程的重复检验由承包商承担。

承包商没有改正忽视质量的错误行为。当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场,以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程,雇主可以雇佣其他人完成,该项费用应从承包商应得款扣回,一般从保留金中扣。

折价接收部分有缺陷工程,某项处于非关键部位的工程施工质量未达到合同规定的标准,如果雇主和工程师经过适当考虑后,确信该部分的质量缺陷不会影响总体工程的运行安全,为了保证工程按期发挥效益,可以与承包商协商后折价接收。

(5) 承包商延误工期或提前竣工。当承包商提前竣工, 他可能获得提前竣工奖, 当承包商延误工期将受到罚款。

(6) 包含在中标合同价中的暂定金是雇主一笔备用资金, 由工程师来控制使用, 承包商不一定能得到。

以上几个方面的因素都会影响到承包商最终得到的合同价款, 因而中标的合同价款是会发生变化的。

2) 合同价格

指按照合同条款的约定, 承包商完成工程建造和缺陷责任后, 对所有合格工程有权获得的全部工程支付, 实质上是工程结算时, 发生的应由雇主支付的实际价格, 可以简单理解为完工后的“竣工结算价款”。

3) 费用

指承包商在场内外发生的(或将发生的)所有合理开支, 包括管理费和类似支出, 但不包括利润。

4) 暂列金额

它是合同中明文规定的一项雇主备用资金, 一般情况下包括在合同价款, 出现下列情况时, 可以动用暂列金, 由工程师来控制使用。

(1) 工程实施过程中可能发生雇主方负责的应急费/不可预见费(contingency costs), 如计口上涉及的费用。

(2) 在招标时, 对工程的某些部分, 雇主方还不可能确定到使投标者能够报出固定单价的深度。

(3) 在招标时, 雇主方还不能决定某项工作是否包含在合同中。

(4) 对于某项作业, 雇主方希望以指定分包商的方式来实施。

5) 保留金

合同中约定在每月进度款扣取的用于保证承包商在合同履行过程中恰当履约的一笔金额, 其数目大小由双方约定。若承包商认真履约, 则这笔保留金应返还。其作用类似我国规定的质保金, 但保留金作用人一些, 它不仅用于承包商担保保修义务, 而且担保在合同履行中恰当履约。

6) 期中支付证书

由承包商按合同规定申请期中付款要求, 经工程师审核验收的向承包人期中付款的凭证, 这些证书都是临时性的。其作用类似于国内进度付款证书。

7) 最终付款证书

工程通过了缺陷通知期, 工程师签发了履约证书后, 由承包商提交的最终付款申请(即“结清单”)。经工程师审核的向承包商签发最后支付的凭证。在此证书中包括承包人完成工程应得的所有款项, 以及扣除期中支付款项后最后应由雇主支付的款额。

6. 指定分包商

1) 概念

指定分包商是由雇主(或工程师)指定、选定, 完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。合同条款规定, 雇主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供

材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。

2) 设置指定分包商的原因

合同内规定有承担施工任务的指定分包商,大多因雇主在招标阶段划分合同时,考虑到某些部分施工的工作内容有较强的专业技术要求,一般承包单位不具备相应的能力,但如果以一个单独的合同对待又限于现场的施工条件或合同管理的复杂性,工程师无法合理地进行协调管理,为避免各独立合同之间的干扰,则将这部分工作发包给指定分包商实施。由于指定分包商是与承包商签订分包合同,因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位,对其施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中。

3) 指定分包商的特点

虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位,但二者并不完全一致,主要差异体现在以下几个方面:

(1) 选择分包单位的权利不同。承担指定分包工作任务的单位由雇主或工程师选定,而一般分包商则由承包商选择。

(2) 分包合同的工作内容不同。指定分包工作不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入间接费、管理费、利润、税金的工作,因此不损害承包商的合法权益,但对指定分包商的管理费可以在投标报价时考虑。而一般分包商的工作则为承包商承包工作范围的一部分。

(3) 工程款的支付开支项目不同。为了不损害承包商的利益,给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。而对一般分包商的付款,则从工程量清单中相应工作内容项内支付。

(4) 雇主对分包商利益的保护不同。尽管指定分包商与承包商签订分包合同后,按照权利义务关系他直接对承包商负责,但由于指定分包商终究是雇主选定的,而且其工程款的支付从暂列金额内开支,因此,在合同条件内列有保护指定分包商的条款。通用条件规定,承包商在每个月末报送工程进度款支付报表时,工程师有权要求他出示已按指定分包合同给指定分包商付款的证明。如果承包商没有合法理由而扣押了指定分包商上个月应得工程款的话,雇主有权按工程师出具的证明从本月应得款内扣除这笔金额直接支付给指定分包商。对于一般分包商则无此类规定,雇主和工程师不介入一般分包合同履行的监督。

(5) 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外,对指定分包商的任何违约行为给雇主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼,承包商不承担责任。如果一般分包商有违约行为,雇主将其视为承包商的违约行为,按照主合同的规定追究承包商的责任。

5.2.4 合同中各方的工作责任与权利

1. 雇主

1) 雇主的风险

在 FIDIC 施工合同条件中,雇主与承包商风险责任的划分总体原则是一个有经验的承包商在投标时能否合理预见此风险,若不能合理预见,在基准日期之后发生了应由雇主来承担,否则应由承包商承担。按此原则,雇主承担的风险有:

(1) 合同中直接规定的风险

合同通用条件第 17.4 条规定雇主的风险有:

- ① 战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动。
- ② 工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权,或内战。
- ③ 承包商人员及承包商和分包商的其他雇员以外的人员在工程所在国内的暴乱、骚动或混乱。
- ④ 工程所在国内的战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性引起的污染,但可能由承包商使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外。
- ⑤ 由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波。
- ⑥ 除合同规定以外雇主使用或占有的永久工程的任何部分。
- ⑦ 由雇主人员或雇主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计。
- ⑧ 不可预见的、或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用。

(2) 不可预见的物质条件

① 不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件,但不包括气候条件。

② 承包商及时发出通知。遇到上述情况后,承包商递交给工程师的通知中应具体描述该外界条件,并说明原因为什么承包商认为是不可预见的。发生这类情况后承包商应继续实施工程,采用在此外界条件下合适的以及合理的措施,并且应遵守工程师给予的任何指示。

③ 工程师与承包商进行协商并作出决定。判定原则是:

A. 承包商在多人程度上对该外界条件不可预见。事件的原因可能属于雇主风险或有经验的承包商应该合理预见,也可能双方都应负有一定责任,工程师应合理划分责任或责任限度。

B. 不属于承包商责任的事件影响程度,评定损害或损失的额度。

C. 与雇主和承包商协商或决定补偿之前,还应审查是否在工程类似部分(如有时)上出现过其他外界条件比承包商在提交投标书时合理预见的物质条件更为有利的情况。如果在一定程度上承包商遇到过此类更为有利的条件,工程师还应确定补偿时对因此有利条件而应支付费用的扣除与承包商作出商定或决定,并且加入合同价格和支付证书中(作为扣除)。

D. 但由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少,即如果承包商不依据“不可预见的物质条件”提出索赔时,不考虑类似情况下有利条件承包商所得到的好处,另外对有利部分的扣除不应超过对不利补偿的金额。

(3) 其他风险

① 外币支付部分由于汇率变化的影响。当合同内约定给承包商的全部或部分付款为某种外币,或约定整个合同内始终以基准日承包商报价所依据的投标汇率为不变汇率按约定百分比支付某种外币时,汇率的实际变化对支付外币的计算不产生影响。若合同内规定按支付日当天中央银行公布的汇率为标准,则支付时需随汇率的市场浮动进行换算。由于合同期内汇率的浮动变化是双方签约时无法预计的情况,不论采用何种方式,雇主均应承包汇率实际变化对工程总造价影响的风险,可能对其有利,也可能不利。

② 法令、政策变化对工程成本的影响。如果基准日后由于法律、法令和政策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由雇主给予补偿。若导致施工成本的减少,也由雇主获得其中的好处,如施工期内国家或地方对税收的调整等。

2) 提供施工现场

雇主应按照约定的时间向承包商提供现场,若没有约定则雇主应依据承包商提交的进度计划,按照施工的要求来提供。

雇主不能按时提供现场,给承包商造成损失,承包商可以向雇主提出索赔。

3) 提供协助配合的义务

在国际工程承包中,承包商的许多工作可能涉及工程所在国的机构批复文件,对于当地的相关机构,雇主比较熟悉,FIDIC 合同条件中规定雇主应配合承包商办理此类事项。

主要表现在:

(1) 雇主承诺配备相关人员,配合承包商的工作及时与各方沟通,并遵守现场有关安全和环保规定。

(2) 帮助承包商获得工程所在国(一般是雇主国)的有关法律文本。

(3) 协助承包商办理相关证照,如劳动许可证、物资进出口许可证、营业执照及安全、环保方面的证照等。

4) 提交资金安排计划

合同条件中规定,如承包商提供了进度及资金需求计划并要求雇主提交其资金安排计划,则雇主应在 28 天内向承包商提供合理证据,证明其资金到位有能力向承包商支付。若其资金安排有重大变化,则应通知承包商。这一作法在国内我们是值得借鉴的。

5) 终止合同的权利

(1) 可以终止合同的情况。承包商有下列情况雇主可以终止合同:

① 不按规定提交履约保证金或接到工程师的改正通知后仍不改正。

② 放弃工程或公然表示不再继续履行其合同义务。

③ 没有正当理由,拖延开工,或者在收到工程师关于质量问题方面的通知后,没有在 28 天内整改。

④ 没有征得同意,擅自将整个工程分包出去,或将整个合同转让出去。

⑤ 承包商已经破产、清算、或承包商已经无法再控制其财产的类似问题等。

⑥ 直接或间接向工程有关人员行贿,引诱其做出不轨之行为或言不实之词,包括承包商雇员的类似行为,但承包商支付其雇员的合法奖励则不在之列。

(2) 终止合同程序

发生上述任何一种情况后,雇主提前 14 天通知承包商终止合同并将承包商驱逐出场;若出现上述⑤、⑥两种情况,则通知承包商立即终止合同,不需提前 14 天通知。

(3) 相关责任

① 上述终止合同的原因均系承包商造成,因而承包商承担一切责任,并按工程师的要求,在撤场后将有关物品、承包商的文件以及其他设计文件提交工程师。

② 雇主可以自行或安排其他人完成工程,并有权使用承包商提交给工程师的物品和资料。同时雇主有权扣押承包商的一切物品,根据情况来处理这些物品,如果承包商欠雇主资金则雇主有权将其物品变更,得到价款优先受偿。

6) 索赔的权利

若承包商不当履行合同或出现应由承包商承担责任的事件,给雇主造成损失,则雇主可向承包商索赔。

2. 承包商

1) 遵纪守法

合同条件中要求承包商在履行合同期间,应遵守适用的法律,特别是与本工程建设相关的法律法规等。承包商应缴纳各项税费,按照法律关于工程设计、实施和竣工以及修补任何缺陷等要求,办理各种证照。

2) 承包商一般义务

根据合同通用条件的第4.1条规定,承包商基本义务主要有:

(1) 承包商应根据合同和工程师的指令来施工和修复缺陷。

(2) 承包商应提供合同规定的永久性设备和承包商的文件。

(3) 承包商应提供其实施工程期间所需的一切人员和物品。

(4) 承包商应为其现场作业以及施工方法的安全性和可靠性负责。

(5) 承包商为其文件,临时工程,以及永久设备和材料的设计负责,但不永久工程的设计或规范负责,除非有明确规定。

(6) 工程师随时可以要求承包商提供施工方法和安排等内容;如果承包商随后需要修改,应事先通知工程师。

本款还规定了另一种情况,即如果合同要求承包商负责设计某部分永久工程,承包商执行该设计的程序如下:

① 承包商应按合同规定的程序向工程师提交有关设计的承包商的文件。

② 这些文件应符合规范和图纸,并用合同规定的语言书写;这些文件还应包括工程师为了协调所需要的附加资料。

③ 承包商应为设计的部分负责,并在完成后,该部分设计应符合合同规定这部分应达到的目标。

④ 在竣工检验开始之前,承包商应向工程师提交竣工文件和操作维护手册,以便雇主使用;不提交这些文件,该部分工程不能认为完工和验收。

3) 提交履约保证

承包商在收到中标函之后的28天之内向雇主提交履约保证,出具保证的机构应征得雇主的认可,并且来自工程所在国或雇主批准的其他辖区。

履约保证的有效期一般到缺陷通知期结束,在雇主收到了工程师签发的履约证书之后21天内将履约保证退还给承包商。

要求承包商提交履约保证的目的就是保证承包商按照合同履行其合同义务和职责。否则,雇主就可据此向承包商索赔,这种做法在国内也常常采用。

4) 安全、安保及环保责任

(1) 安全责任。FIDIC 施工合同中有关承包商的安全责任规定与国内相似,即承包商对现场施工安全负责,如要求承包商遵守一切适用于安全的规章,应照管好有权进入现场的一切人员的安全,提供现场围栏、照明等。

(2) 安保责任。承包商应负责现场的安全保卫工作,如防止无权进入现场的人员进入现场,防止偷盗和人为破坏等。

(3) 环保责任。承包商应负责施工过程中的环境保护工作,如应采取一切措施保护场内外环境,控制施工中的噪音、污染,应保证施工过程中向空中排放的散发物、地面排污等不超过标准。

5) 工程分包。FIDIC 施工合同条件允许承包商进行合法的分包,作为一般的工程分包及分包商的选择,与国内相类似。其主要规定有:

(1) 承包商不得将整个工程分包出去。

(2) 承包商应对分包商的一切行为和过失负责。

(3) 除非合同中有明确约定分包的内容,否则分包应经雇主的同意,并且应至少提前 28 天通知工程师分包商计划开始分包工作的日期以及开始现场工作的日期。

(4) 从合同关系的角度来看,由于分包商与雇主没有直接的合同关系因而分包商不能直接接受雇主的工程师或代表下达的指令。

(5) 总承包商应对现场的协调管理负责。

6) 文物保护责任

在施工中,发现了文物,承包商应作以下的工作并有相关的权利:

(1) 承包商应立即通知工程师,并且采取合理的措施保护文物;

(2) 若因施工中遇到文物使承包商遭受了工期延期和多开支的费用可以向雇主提出索赔。

7) 终止合同的权利

(1) 可以终止合同的情况

① 如果就雇主不提供资金证明之问题,承包商发出暂停工作的通知,而通知发出后 42 天内,仍没有收到任何合理证据。

② 工程师在收到报表和证明文件后 56 天内没有签发有关支付证书。

③ 承包商在期中支付款到期后的 42 天内仍没有收到该笔款项。

④ 雇主严重不履行其合同义务。

⑤ 雇主不按合同规定签署合同协议书,或违反合同转让的规定。

⑥ 如果工程师暂停工程的时间超过 84 天,而在承包商的要求下在 28 天内又没有同意复工,如果暂停的工作影响到整个工程时,承包商有权终止合同。

⑦ 雇主已经破产、被清算、或已经无法再控制其财产等。

(2) 终止合同的程序

发生以上七种情况中的任何一种,承包商可以终止合同。在①~⑤种情况发生后提前 14 天通知雇主,合同终止,对⑥、⑦两种情况承包商发出通知后立即终止合同。

(3) 责任承担

很显然承包商终止合同的责任在雇主,因而雇主应承担一切责任,如支付违约金、支付赔偿金等,承包商在合同中应有的权利不受影响。当然承包商此时也应尽一定的义务,如果停止进一步的工作应保护生命财产和工程的安全,凡是得到了支付的承包商的文件,永久设备、材料,都应移交给雇主。

8) 索赔的权利

若雇主不当履行合同或出现应由雇主承担责任的事件,给承包商造成损失,则承包商可向雇主索赔。

3. 工程师

1) 工程师的职责和权力

从工程师的定义及雇主人员的组成来看,工程师是受雇于雇主而且是属于雇主的人员,这样就淡化了其“独立性”因而其职责和权力有一些特殊的规定:

(1) 工程师应履行合同中规定的职责,并可以行使合同明文规定和必然隐含的赋予他的权力。

(2) 工程师无权更改合同,无权解除雇主和承包商的任务和责任。

(3) 在工程承包合同签订之后,没有承包商的同意雇主不得进一步限制工程师的权力。

(4) 无论是工程师行使权力还是履行职责,均视为是为雇主做的工作。

2) 工程师的委托

在合同履行中,工程师可以委托相关的人员行使其部分职权,合同条件中对其委托作了相关的规定,主要内容如下:

(1) 工程师可以随时将其有关权力和职责委托给下属人员,也可以撤回,这种委托或撤回应以书面形式,并在雇主和承包商均收到书面通知后生效。

(2) 工程师通过了有效的委托后,其委托的下属人员发布的各种指令的效力与工程师下达的完全一样。

(3) 承包商对其委托的助理人员的决定或指令有异议的,可以向工程师提出,工程师应立即确认、撤回或修改。

3) 工程师的指示

合同条件中规定,为了实施工程所需,工程师可以根据合同随时向承包商签发指示和有关图纸,对于这些指示承包商应遵照执行,若工程师的指示构成了变更,影响了工期和费用,则可按工程变更来处理,给予承包商工期、费用的补偿。

工程师的指示一般应以书面的形式签发,必要时也可以口头指示。此时,承包商应在接到口头指示后的两个工作日内,主动将自己记录的口头指示以书面形式报告给工程师,要求工程师确认,若工程师收到后两个工作日不答复,则承包商记录的口头指示视为是工程师发布的书面指示。

4) 工程师的易人

在合同管理中,若雇主不满意工程师的工作,他可以更换工程师,但应至少提前 42 天将拟替代人的名字、地址及其相关经验通知承包商。

5) 工程师的决定

在合同管理中,工程师在很多情况下可以对双方的行为作出自己的决定,这是工程师的一项权力,但是工程师在作决定时合同条件中作了相关规定,其主要内容有:工程师在作涉及双方利益的决定时,应首先与双方沟通力争达成一致,若双方不能达成一致,工程师可以根据合同结合实际情况,公正合理地作出自己的决定并通知双方,若双方仍有异议,则双方可自行协商或选择 DAB 或仲裁来解决。从这里可知,工程师所作的决定不一定是

最终的决定。

5.2.5 合同中质量管理条款及内容

1. 施工阶段的质量管理

1) 承包商的质量管理体系

通用条件规定,承包商应按照合同的要求建立一套质量管理体系,以保证施工符合合同要求,在每一工作阶段开始实施之前,承包商应将所有工作程序的细节和执行文件提交工程师,供参考。工程师有权审查质量管理体系的任何方面,包括月进度报告中包含的质量文件,对不完善之处可以提出改进要求。由于保证工程的质量是承包商的基本义务,当其遵守工程师认可的质量体系施工,并不能解除依据合同应承担的任何职责、义务和责任。

2) 施工放线

通用条件规定,承包商应按合同规定或工程师通知的原始数据进行放线并应对雇主方提供的原始数据准确性进行核实,若雇主(工程师)提供了错误的信息,作为一个有经验的承包商无法合理发现,并且无法避免有关延误和费用发生,则承包商可以向雇主索赔工期、费用和利润。

当然,承包商的索赔要获得成功必须是以下三种条件:

- (1) 雇主提供的错误数据导致有工期损失和额外费用。
- (2) 承包商尽力核实数据而无法合理发现此类错误。
- (3) 承包商应及时发生了索赔意向和索赔通知。

3) 工艺、材料、设备质量控制

(1) 一般要求

对于工艺、材料、设备的质量通用条件中对承包商提出了几条原则性的要求:

① 若合同中有具体要求规定,承包商应按此具体方式来实施,这里主要体现在规范的规定中,承包人按照规范中的标准执行即可。

② 若没有明确的要求,则应按照公认的良好惯例,以恰当的施工工艺和谨慎的态度去实施,同时应使用恰当配备的设施和无害材料来实施。

③ 对于材料质量的控制,承包商在材料用于工程之前,应向工程师提交有关材料的样品和资料,取得工程师的同意,这些样品包括承包商自费提供的厂家的标准样品及合同中约定的其他样品。

(2) 质量的检查与检验

检查与检验是控制质量的主要方法和手段之一,同时检查与检验的含义各不相同,检验是深层次的检查,有时需要借助专门的仪器和装置进行,对此通用条件对质量的检查与检验有不同的要求和规定。

① 检查方面的规定

A. 雇主的人员(包括工程师)有权在一切合理的时间内进入现场,以及项目设备和材料的制造基地进行检查测量永久性设备和材料的用材及制造工艺和进度。承包商应予以配合协助,这一规定是规定了雇主的人员有权进入现场进行跟踪检查的权力。

B. 任何一项隐蔽工程在隐蔽之前,承包商应通知工程师验收,同时工程师也不得无故延误,若工程师不要求检查应及时通知承包商。若没有通知工程师检查,工程师有权要

求承包商自费打开已经覆盖的工程,供检查并自己恢复原状,这一规定实质是检查隐蔽工程的程序,其作法与国内是相同的。

② 检验方面的规定

A. 合同明文规定要检验的均应检验。同时还可能包括工程师所作出的额外检验即超出约定的检验,检验相关的费用应由此额外检验的结果来判定。若合格,则雇主承担责任,不合格则承包商承担责任。

B. 承包商应为检验提供服务,主要包括:人员、设施仪器、消耗品等。

C. 对于永久设备、材料及工程的其他部分检验,承包商与工程师应提前商定检验的时间和地点,若工程师参加检验,应在此时间前 24 小时告知承包商,若工程师不参加,承包商可以自行检验,查验结果有效,等同于工程师在场。

(3) 检验不合格的处理与补救

在检验检查中若发现设备、材料、工艺有缺陷或不符合合同的要求,工程师可以要求承包商更换修改,承包商应按要求予以更换或修改,直到达到规定的要求,若承包商更换的材料或设备需重新检验的,应当重检,所需的检验费应由承包商承担。

对于检查检验过的材料、设备或工艺等,若事后工程师发现仍存在问题,则工程师有权作出指示,要求对此作出补救工作,如工程师可以要求承包商换掉不符合要求的材料和设备,对不符合要求的工作一律返工。若承包商不执行工程师的指示,雇主可雇人来完成相关的工作,此费用一般从承包商的保留金中开支。

这“补救工作”的规定,是国际工程中的典型规定,即工程师的认可和批准,不解除承包商的任何合同责任和义务,承包商是质量的第一创造者和责任人,他应向雇主提供符合合同约定的工程。

4) 对承包人施工设备的管理

(1) 承包商自有的施工设备。承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料,一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除运送承包商人员物资的运输车辆以外,其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权,但未经过工程师的批准,不能将其中的任何一部分运出施工现场。作出上述规定的目的是为了保证本工程的施工,但并非绝对不允许在施工期内承包商将自有设备运出工地,某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间,如果承包商的其他合同工程需要使用时,可以向上工程师申请暂时运出。当工程师依据施工进度计划考虑该部分机械暂时不用而同意他运出时,应同时指示何时必须运回以保证本工程的施工之用,要求承包商遵照执行。对于后期施工不再使用的设备,竣工前经过工程师批准后,承包商可以提前撤出工地。

(2) 要求承包工增加或更换施工设备。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

2. 工程变更管理

1) 工程变更的范围

由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进度展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:

(1) 对合同中任何工作量的改变。

(2) 任何工作质量或其他特性的变更。

(3) 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变,第(2)和(3)属于重大的设计变更。

(4) 删减任何合同约定的工作内容,省略的工作应是不再需要的工程,不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。

(5) 进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工验收、钻孔和其他检验以及勘察工作。

(6) 改变原计划的施工顺序或时间安排。

2) 变更程序

(1) 指示变更。工程师在雇主授权范围内根据施工现场的实际情况,在确属需要时有权发布变更指示。指示的内容应包括详细的变更内容、变更项目的施工技术要求和相关部门文件图纸,以及变更处理的原则。

(2) 要求承包商递交建议书后再确定的变更。其程序为:

① 工程师将计划变更事项通知承包商,并要求他递交实施变更的建议书。

② 承包商应尽快予以答复。

③ 工程师作出是否变更的决定,尽快通知承包商说明批准与否或提出意见。

④ 承包商在等待答复期间,不应延误任何工作。

⑤ 工程师发出每一项实施变更的指示,应要求承包商记录支出费用。

⑥ 承包商提出的变更建议书,只是作为工程师决定是否实施变更的参考。除了工程师作出指示或批准以总价方式支付的情况外,每一项变更应依据计量工程量进行估价和支付。

3) 变更估价

(1) 变更估价的原则

计算变更工程应采用的费率或价格,可分为三种情况:

① 变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价,就应以该费率计算变更工程费用。实施变更工作未导致工程施工组织和施工方法发生实质性变动,不应调整该项目的单价。

② 工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。

③ 变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平一致的原则,确定新的费率或价格。

(2) 删减原定工作后对承包商的补偿

工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作,合同价格中包括的直接费用部分没有受到损害,但摊销在该部分的间接费、税金和利润则实际不能合理回收。因此承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明资料,工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额加入到合同价内。

4) 承包商申请的变更

承包商根据工程施工的具体情况,可以向工程师提出对合同内任何一个项目或工作的详细变更请求报告。未经工程师批准承包商不得擅自变更,若工程师同意,则按工程师发布的变更指示的程序执行:

(1) 承包商提出变更建议。承包商可以随时向工程师提交一份书面建议,承包商认为

如果采纳其建议将可能:

- ① 加速完工。
- ② 降低雇主实施、维护或运行工程的费用。
- ③ 对雇主而言能提高竣工工程的费用。
- ④ 为雇主带来其他利益。

(2) 承包商应自费编制此类建议书。

(3) 如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变,通用条件的条款规定,如果双方没有其他协议,承包商应设计该部分工程,如果他不具备设计资质,也可以委托有资质单位进行设计。变更的设计工作应按合同中承包商负责设计的规定执行,包括:

① 承包商应按照合同中说明的程序向工程师提交该部分工程的承包商的文件。

② 承包商的文件必须符合规范和图纸的要求。

③ 承包商应对该部分工程负责,并且该部分工程完工后应适合于合同中规定的工程的预期目的。

④ 在开始竣工检验之前,承包商应按照规范规定向工程师提交竣工文件以及操作和维护手册。

(4) 接受变更建议的估价

① 如果此改变造成该部分工程的合同价值减少,工程师应与承包商商定或决定一笔费用,并将之加入合同价格。这笔费用应是以下金额差额的一半(50%)。

A. 合同价的减少——由此改变造成的合同价值的减少,不包括依据后续法规变化作出的调整和因物价浮动调价所作的调整;以及

B. 变更对使用功能的影响——考虑到质量、预期寿命或运行效率的降低,对雇主而言已变更工作价值上的减少(如有时)。

② 如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对雇主的好处,则没有该笔奖励费用。

3. 竣工验收阶段质量管理

1) 验收的程序及要求

承包商完成工程准备好相应的竣工验收资料(如竣工验收报告、操作维护手册等)后,将准备好进行竣工验收的日期提前21天通知工程师,说明此日后已准备好进行竣工验收。工程师应指示在此日后的14天内某一天开始验收,具体日期由工程师确定。

工程通过了验收达到了合同规定的竣工要求后,如果承包商认为在14天内工程将完成并能准备好供雇主接收,可以向工程师申请颁发工程接收证书;工程师接到申请后28天内,若认为满足竣工和移交条件则应颁发工程接收证书,证书中注明工程完工日期,若工程师在接到承包商的申请后28天既不签发接收证书也没有对承包商的申请提出疑问,并且此时工程或某一段基本符合合同的规定,则可视上述28天的最后一天接收证书已经签发。此时,工程的照管责任由承包商转移给雇主。

2) 延误检验

(1) 若由于雇主的原因使竣工验收不能进行,那么承包商可以向雇主提出工期和费用索赔。

(2) 如果由于承包商的原因导致无故延误检查, 工程师可以要求承包商在工程师发出通知后的 21 天内检查。否则, 工程师可以自行进行竣工检验, 检验的费用和风险由承包商承担。

3) 特殊情况下接收证书的颁发

(1) 部分工程接收。FIDIC 合同条件中规定, 若部分工程完工, 雇主可以提前使用该工程, 但应在工程师签发了该部分接收证书后才可以。若工程师未签发工程接收证书, 雇主使用了该工程, 视为在开始使用日已经被雇主接收, 承包商对工程的照管责任转移给雇主, 承包商此时可以要求工程师为该部分工程签发一份接收证书, 工程师应该签发。

(2) 雇主的负责原因导致不能正常检验, 致使竣工检验在 14 天内不能进行, 则应在本应该完成竣工检验的那一天, 视为雇主接收了相应的工程或区段, 工程师应签接收证书。这里所说的 14 天指的是承包商准备好开始进行竣工检验的前一天之后的 14 天, 例如承包商确定 7 月 1 日后他将准备好随时检验, 若由于雇主负责的原因导致到 7 月 15 日仍不能检验, 则从 7 月 16 日起视为工程移交给了雇主。

4) 未能通过检验的处理

(1) 重新检验。若某个区段或部位未通过第一次检验, 承包商可以对缺陷进行修复和改正, 在相同的检验条件下, 进行重新检验。

(2) 重复检验未能通过的处理

当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时, 工程师应有权选择以下任何一种处理方法:

① 指示再进行一次重复的竣工检验。

② 如果由于该工程缺陷致使雇主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益, 拒收整个工程或区段(视情况而定), 在此情况下, 雇主有权获得承包商的赔偿。包括:

A. 雇主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用。

B. 拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。

③ 颁发一份接收证书(如果雇主同意的话), 折价接收该部分工程。合同价格应按照可以适当弥补由于此类失误而给雇主造成减少的价值数额予以扣减。

4. 缺陷通知阶段质量管理

1) 承包商的主要责任

(1) 完成颁发工程接收证书时未完成的扫尾工作。

(2) 修复雇主方在缺陷通知期内通知的缺陷, 并达到合同的要求, 若未能在合理的时间修复工程出现的问题, 雇主可以确定一个截止日期要求承包商完成, 否则雇主就可以采取以下的任何一种措施:

① 可以委托其他人完成此项工作, 费用由承包商承担。

② 要求工程师确定合理的合同价格的扣减。

③ 若出现的缺陷或损害实质上使雇主丧失了工程或其他任何主要部分的使用价值时, 可以终止合同, 收回所有支付的工程款, 并要求承包商支付因其工程建设的融资费, 工程拆除费等。

当然这时强调的是这种缺陷的出现应是承包商的责任造成雇主损失, 才可行使这样

的权力。

(3) 按工程师的要求将不符合合同规定的永久设备、材料从现场移走并替换。

2) 履约证书的颁发

若工程圆满通过了缺陷通知期,且承包商完成了各项扫尾工作,工程师应在期满后的 28 天内签收履约证书,同时将副本提交给雇主。

履约证书的颁发标志着承包商完成了合同中规定的施工任务,标志着承包商对工程质量责任的结束,同时雇主应在证书颁发后的 21 天内退还承包商的履约保函。

3) 承包商应注意的问题

(1) 在缺陷通知期间,若工程出现了相关问题,承包商有责任根据工程师的要求对缺陷原因进行调查。

(2) 收到了履约证书后的 28 天内应将留存在现场的承包商的设备、剩余材料、垃圾和废墟等清理走。否则,雇主可将此类物品出售或处理掉,进行现场整理,而雇主完成以上工作的费用由承包商支付。

5.2.6 合同中进度管理条款及内容

1. 开工

根据合同通用条件第 8.1 条的规定,工程开工日应是承包商收到中标函后的 42 天内的某一日期,并且由工程师至少提前 7 天将此日期通知承包商,如果专用条件中双方另有约定,则按约定的时间开工,开工日是计算施工期限的起点。

对于承包商,收到开工通知后应积极准备尽快地组织开工,若由于雇主的原因,不能不签发开工通知,导致承包商无法合理地安排开工,最终导致人窝工、机械闲置,则承包商可以向雇主索赔费用及工期的补偿。

2. 承包商提交施工进度计划

1) 承包商提交计划

承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的 42 天内(合同未作约定)开工,工程师则应至少提前 7 天通知承包商开工日期。承包商收到开工通知后的 28 天内,按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划,说明为完成施工任务而打算采用的施工方法、施工组织方案、进度计划安排以及按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表。

2) 计划包含的内容

(1) 实施工程的进度计划。视承包工程的范围不同,可能还涉及到设计进度(如果包括部分工程的施工图设计)、材料采购计划、永久工程设备的制造、运到现场、施工、安装、调试和检验各个阶段的预期时间(永久工程设备包括在承包范围内)。

(2) 每个指定分包商施工各阶段的安排。

(3) 合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。

(4) 保证计划实施的说明文件:

① 承包商各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述。

② 各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。

3) 进度计划的确认。承包商有权按照他认为最合理的方法进行施工组织,工程师不应

干预。工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及以下几个方面:

- (1) 计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同约定一致。
- (2) 承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现。
- (3) 承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等。

3. 工程师对施工进度监督

1) 进度监督的方式——月进度报告

为了便于工程师对合同的履行进行有效的监督和管理,协调各合同之间的配合,承包商每个月向工程师提交进度报告,说明前阶段的进度情况和施工中存在的总问题,以及下一阶段的实施计划和准备采取的相应措施。进度报告的内容包括:

- (1) 设计(如有时)、承包商的文件、采购、制造、货物运达现场、施工、安装和调试的每阶段,以及指定分包商实施工程的这些阶段进展情况的图表与详细说明。
- (2) 表明制造(如有时)和现场进展状况的照片。
- (3) 与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比,以及开始制造、承包商的检查、检验、运输和到达现场的实际或预期日期。
- (4) 说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量。
- (5) 若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书。
- (6) 安全统计,包括涉及环境和公共关系方面的任何危险事件与活动的详情。
- (7) 实际进度与计划进度的对比,包括可能影响按照合同完工的任何事件和情况的详情,以及为消除延误而正在(或准备)采取的措施等。

2) 施工进度计划的修订

当工程师发现实际进度与计划进度严重偏离时,不论实际进度是超前还是滞后于计划进度,为了使进度计划有实际指导意义,随时有权指示承包商编制改进的施工进度计划,并再次提交工程师认可后执行。新进度计划将代替原来的计划。

4. 暂停施工

1) 工程师提出的暂停施工

(1) 暂停施工程序。工程师可以随时指示承包商暂停施工,并将暂停施工的原因及处理的要求通知承包商,承包商暂停并维护好工程。

(2) 相关规定。若由于工程师提出的暂停施工的原因在雇主或非承包商的原因,给承包商造成了工期和费用损失的,则雇主应给予补偿。相反,若暂停施工是由承包商的原因造成,则承包商得不到相应的补偿。

(3) 超过 84 天的暂停施工

若工程师指示暂停施工超过 84 天,承包商可以要求工程师允许复工,在承包商提出复工要求后的 28 天内没有许可复工,则承包商可以将暂停的工作视为是删减了,可以不施工。若此时暂停涉及的是整个工程的暂停,则承包商可以向雇主发出终止合同的通知。这些规定在某种程度上是对承包商的一种保护。

2) 承包商提出的暂停施工

(1) 可以暂停施工的情况及程序

合同条件规定,在合同履行中出现下列情况或条件,承包商可以放慢施工进度或暂停

施工:

- ① 工程师没有按照规定的时间签收支付证书。
- ② 雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。
- ③ 雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。

出现了这些情况后,承包商欲暂停施工应提前 21 天通知雇主。

(2) 相关规定

① 在合同履行中即使承包商暂停施工了,仍有权得到对退付款享有的融资费以及终止合同的相关权利。

② 若承包商在发出终止合同之前,收到了相关的各类证书、证明或付款,则应尽快复工。

③ 承包商的暂停施工造成了其费用、工期的损失,则可以向雇主索赔。

5. 工期顺延

通用条件明确规定,在合同履行中出现下列情况工期可以顺延:

- (1) 延误发放图纸。
- (2) 延误移交施工现场。
- (3) 承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误。
- (4) 不可预见的外界条件。
- (5) 施工中遇到文物和古迹对施工进度干扰。
- (6) 非承包商原因检验导致施工的延误。
- (7) 发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化。
- (8) 施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响。
- (9) 由于传染病或政府行为导致工期的延误。
- (10) 施工中受到雇主或其他承包商的干扰。
- (11) 施工涉及有关公共部门原因引起的延误。
- (12) 雇主提前占用工程导致对后续施工的延误。
- (13) 非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行。
- (14) 后续法规调整引起的延误。
- (15) 发生不可抗力事件的影响。

6. 竣工日期

项目通过了竣工验收后工程师颁发工程接收证书,在接收证书中工程师注明项目的竣工日期。一般来说,项目竣工的条件有完成了合同约定的工作内容,并符合合同对工程质量的要求,承包商向工程师申请验收,而且验收通过即可认为项目全部或部分竣工。对于竣工日期一般为承包商申请验收的日期,有时工程师可以根据实际情况在接收证书中指明竣工日期,开工日与竣工日之间的时间为施工期,可以用施工期与竣工时间作对比判定承包商是否延误工期,若施工期长于竣工时间,则说明延误工期,施工期短于竣工时间,则说明提前竣工,施工期等于竣工时间,说明按时完工。竣工日之后,项目就进入到缺陷通知期。

7. 缺陷通知期的延长

项目竣工之日后,项目就进入到缺陷通知期,缺陷通知期的长短双方可以根据上体情况来约定,如半年、1年等。若因承包商的原因在缺陷通知期内出了问题,导致工程或区段无法按预期目的使用,雇主有权对缺陷通知期延长,但是缺陷通知期的延长不得超过两年。

若由于雇主负责的原因导致暂停了材料和永久设备的交付或安装,在此类设备、材料约定的缺陷通知期届满2年后,承包商不再承担任何修复缺陷的义务。

5.2.7 合同中支付管理条款及内容

FIDIC 施工合同中,支付一般有一个阶段,开工前雇主可能向承包商支付预付款(动员预付款),在施工中支付进度款,在工程通过了竣工检验后进行竣工结算和最终结算。

1. 期中支付

1) 预付款

在国际工程承包中,一般在项目施工的启动阶段,承包商需要投入大笔的资金,为了帮助解决承包商启动资金的困难,因而 FIDIC 施工合同条件中规定,雇主应向承包商支付一定数额预付款,故此时的预付款,又可称为动员预付款。

(1) 支付的额度和条件

动员预付款支付的具体情况如支付比例、分期支付的次数、支付时间、支付货币及货币比例等,由双方来确定,承包商应提交预付款保函。

承包商得到第一笔预付款的条件有:

- ① 向工程师提出了预付款申请。
- ② 雇主收到了承包商提交的履约保证。
- ③ 雇主收到了一份金额与货币类型相同的预付款保函。

这样,工程师收到了支付申请后的一段时间内,可以签收预付款凭证,雇主支付预付款。

(2) 预付款的扣还

- ① 起扣。自承包商获得工程进度款累计总额(不包括预付款的支付和保留金的扣减)达到合同总价(减去暂列金额)10%那个月起扣。其计算式如下:

$$\frac{\text{工程师签证累计支付款总额} - \text{预付款} - \text{已扣保留金}}{\text{接受的合同价} - \text{暂定金额}} = 10\%$$

- ② 每次支付时的扣减额度。本月证书中承包商应获得的合同款额(不包括预付款及保留金的扣减)中扣除 25% 作为预付款的偿还,直至还清全部预付款。即:

每次扣还金额 = (本次支付证书中承包商应获得的款额 - 本次应扣的保留金) × 25%

若在整个工程的接收证书签发之前,或发生终止合同或发生不可抗力之前预付款还没有偿还完,此类事件发生后,承包商应立即偿还剩余部分。

2) 用于永久工程的设备和材料预付款

在 FIDIC 合同条件中,为了帮助承包商解决订购大宗材料和设备占用资金周转的困难,

规定雇主在一定条件下应向承包商支付材料、设备预付款。

(1) 支付额度及条件

通用条件中规定一般材料设备预支额度为其费用的 80%，作为承包商可得到这笔预付款的条件有：

- ① 此类材料、设备属于投标附录中所列的起运后支付预付款的材料设备。
- ② 材料、设备运抵现场并经验收合格。
- ③ 材料、设备的质量和储存条件符合技术条款的要求。
- ④ 承包商按要求提交了订货单及收据价格证明文件。

满足以上条件后，承包商申请工程师签发付款文件并与进度款同期支付。

(2) 材料设备预付款的返还

通用条款规定，当已预付款项的材料或设备用于永久工程，构成永久工程合同价格的一部分后，在计量工程量的承包商应得款内扣除预付的款项，扣除金额与预付金额的计算方法相同。专用条款内也可以约定其他扣除方式，如每次预付的材料款在付款后的约定月内(最长不超过 6 个月)，每个月平均扣回等。

3) 暂定金

暂定金是雇主的一笔备用资金，一般包含在承包商的投标报价中，成为其整个报价的一部分。暂定金的使用由工程师来控制。暂定金主要涉及某些变更工作和指定分包商的工作。承包商能得到暂定金的开支应满足两个条件：一是工程师下达指令，要求承包商实施该工作，二是实施的工作属于暂定金额的工作。

同时工程师有权要求承包商提交有关的报价单、收票、凭证、账目、收据等来证明承包商完成该项工作的实际费用。由此可见，暂定金额虽然包含在报价中，但承包商不一定能得到。

4) 计日工费

在履行合同履行中，可能会出现一些额外的零星工作，此时工程师可以下达变更指令，要求承包商按计日工作方式来实施此类工作，其计价应按照包括在合同中的计日工作计划表进行估价，若完成此类工作涉及到订购货物，承包商应向工程师提交报价单，在申请支付时还应提交各种货物的发票、凭证以及账单或收据，同时承包商应向工程师提交一式三份的精确报表，此表中应包括此工作中使用的各项资源详细资料：

- ① 承包商人员的姓名、职业和使用时间。
- ② 承包商设备和临时工程的标识、型号和使用时间。
- ③ 所用的生产设备和材料的数量和型号。

承包商的申请表经工程师同意后，承包商可以向工程师申请签发计日工的付款凭证，计日工费用一般从暂定金中开支。

5) 支付款的调整

(1) 因法律改变的调整。在基准日期之后，因工程所在国的法律发生变动(包括施用新的法律、废除或修改现有法律)或对此类法律的司法解释或政府官方解释发生变动，从而影响了承包商履行合同义务，导致工程施工费用的增加或减少，则应对合同价款进行调整。若立法改变导致费用增加了，则承包商可以通过索赔来要求增加费用，工期增加了，则承包商可以通过索赔来要求增加费用延长工期，若导致费用降低了，则雇主应签证说明费用

降低,同样可以通过索赔来要求减少对承包商的支付。

(2) 因物价浮动的调整

对于施工期较长的合同,为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险,在合同内要约定调价的方法。通用条款内规定的调价公式(5-1)示:

$$P_n = a + b \times \frac{L_n}{L_0} + c \times \frac{M_n}{M_0} + d \times \frac{E_n}{E_0} + \dots \quad (5-1)$$

式中

P_n ——第 n 期内完成工作以相应货币所估算的合同价值所采用的调整系数,这个期间通常是 1 个月,除非投标函附录中另有规定;

a ——在数据调整表中规定的一个系数,代表合同支付中不调整的部分占的比例;

b 、 c 、 d ——数据调整表中规定的一个系数,代表与实施工程有关的每项费用因素的估算比例,如劳务、设备和材料等,其中 $a+b+c+d+\dots=1$;

L_0 、 E_0 、 M_0 ——第 n 期间使用的现行费用指数或参照价格,以该期间(具体的支付证书的相关期限)最后一日之前第 49 天当天对于相关表中的费用因素适用的费用指数或参照价格确定;

L_0 、 E_0 、 M_0 ——基本费用参数或参照价格。

6) 保留金

保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在雇主手中,作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。当承包商有一般违约行为使雇主受到损失时,可从该项金额内直接扣除损害索赔费。例如,承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位,雇主雇用其他人完成后,这笔费用可从保留金内扣除。

(1) 保留金的约定。承包商在投标书附录中按招标文件提供的信息和要求确认了每次扣留保留金的百分比和保留金限额。每次月进度款支付时仅扣留的百分比一般为 5%~10%,累计扣留的最高限额为合同价的 2.5%~5%。

(2) 每次中期支付时扣除的保留金。从首次支付工程进度款开始,用该承包商完成合格工程应得款加上因后续法规政策变化的调整和时常价格浮动变化的调价款为基数,乘以合同约定保留金的百分比作为本次支付时应扣留的保留金。逐月累计扣到合同约定的保留金最高限额为止。

(3) 保留金的返还。扣留承包商的保留金分两次返还:

① 颁发工程接收证书后的返还:

A. 颁发了整个工程的接收证书时,将保留金的前一半支付给承包商。

B. 如果颁发的接收证书只是限于一个区段或工程的一部分,则

$$\text{返还金额} = \text{保留金总额} \times \frac{\text{移交工程区段或部分的合同价值}}{\text{最终合同价值的估算值}} \times 40\%$$

② 保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还:

A. 整个合同的缺陷通知期满,返还剩余的保留金。

B. 如果颁发的履约证书只限于一个区段,则在这个区段的缺陷通知期满后,并不全部返还该部分剩余的保留金:

$$\text{返还金额} = \text{保留金总额} \times \frac{\text{移交工程区段或部分的合同价值}}{\text{最终合同价值的估算值}} \times 40\%$$

7) 进度款的支付

(1) 承包商提付款报告

每个月的月末, 承包商应按工程师规定的格式提交一式 6 份本月支付报表。内容包括提出本月已完成合格工程的应付款要求和对应扣款的确认, 一般包括以下几个方面:

- ① 本月完成的工程量清单中工程项目及其他项目的应付金额(包括变更)。
- ② 法规变化引起的调整应增加和减扣的任何款额。
- ③ 作为保留金扣减的任何款项。
- ④ 预付款的支付(分期支付的预付款)和扣还应增加和减扣的任何款额。
- ⑤ 承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额。
- ⑥ 根据合同或其他规定(包括索赔、争端裁决和仲裁), 应付的任何其他应增加和扣减的款额。

⑦ 对所有以前的支付证书中证明的款额的扣除或减少(对已付款支付证书的修正)。

(2) 工程师签证。工程师接到报表后, 对承包商完成的工程项目的质量、数量以及各项价款的计算进行检查。若有疑问时, 可要求承包商共同复核工程量。在收到承包商的支付报表后 28 天内, 按检查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。工程师可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括:

① 合同内约定有工程师签证的最小金额时, 本月应签发的金额小于签证的最小金额, 工程师不出具本月进度款的支付证书。本月应付款结转下月, 超过最小签证金额后一并支付。

② 承包商提供的货物或施工的工程不符合合同要求, 可扣发修正或重置相应的费用, 直到修整或重置工作完成后再支付。

③ 承包商未能按合同规定进行工作或履行义务, 并且工程师已经通知了承包商, 则可以扣留该工作或义务的价值, 直至工作或义务履行为止。

工程进度款支付证书属于临时支付证书, 工程师有权对以前签发过的证书中发现的错、漏或重复进行更正或修改, 承包商也有权提出更改或修正, 经双方复核同意后, 将增加或扣减的金额纳入本次签证中。

(3) 雇主支付。承包商的报表经过工程师认可并签发工程进度款的支付证书后, 雇主应在接到证书后及时给承包商付款。雇主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度报告后的 56 天。

2. 竣工结算

(1) 承包商报送竣工报表

颁发工程接收证书后的 84 天内, 承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表, 报表内容包括:

- (1) 到工程接收证书中指明的竣工日止, 根据合同完成全部工作的最终价值。
- (2) 承包商认为应该支付给他的其他款项, 如要求的索赔款、应退还的部分保留金等。
- (3) 承包商认为根据合同应支付给他的估算总额。所谓“估算总额”是这笔金额还未

经过工程师审核同意。估算总额应在竣工结算报表中单独列出,以便工程签发支付证书。

2) 竣工结算与支付

工程师接到竣工报表后,应对照竣工图进行工程量详细核算,对其他支付要求进行审查,然后市依据检查结果签署竣工结算的支付证书。此项签证工作,工程师也应以收到竣工报表后 28 天内完成。雇主根据工程师的签证予以支付。

3. 最终结算

最终结算是指颁发履约证书后,对承包商完成全部工作价值的详细结算,以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实,确定合同的最终价格。

颁发履约证书后的 56 天内,承包商应向工程师提交最终报表草案,以及工程师要求提交的有关资料。最终报表草案要详细说明根据合同完成的全部工程价值和承包商依据合同认为还应支付给他的任何进一步款项,如剩余的保留金及缺陷通知期内发生的索赔费用等。

工程师审核后与承包商协商,对最终报表草案进行适当的补充或修改后形成最终报表。承包商将最终报表送交工程师的同时,还需向雇主提交的一份“结清单”,进一步证实最终报表中的支付总额,作为同意与雇主终止合同关系的书面文件。工程师在接到最终报表和结清单附件后的 28 天内签发最终支付证书,雇主应在收到证书后的 56 天内支付。只有当雇主按照最终支付证书的金额予以支付并退还履约保函后,结清单才生效,承包商的索赔权也即行终止。

5.2.8 合同中其他管理性条款及内容

1. 保险

1) 保险总体要求

在 FIDIC 施工合同(1999 版)条件中,没有明确哪一方投保,但对保险作了以下的总体要求:

(1) 若承包商投保,办理保险时应遵循雇主批准的条件,这些条件应与双方在承包商中标前谈判中商定的投保条件一致。

(2) 若雇主投保,则应按双方在专用条件中列出的具体条件投保。

(3) 若保险合同中的被保险人同时为雇主和承包商,则任何一方在发生与自己有关的保险事件时,均可单独用此保险合同,向保险人提出索赔。

(4) 若保险合同中的被保险人还包括其他被保险人,则除雇主为他的人员去进行保险索赔外,其他情况由承包商负责处理,这些所谓的“其他被保险人”无权直接与保险公司处理索赔事宜。

(5) 投保一方应按投标函附录中的时间规定,向另一方提交办理保险的的证据以及保险单的复印件,同时通知工程师。

(6) 若按约定应当办理保险的一方没有办理保险或保险持续有效,或没有按规定向另一方提供办理保险的有关情况,则另一方可以去办理保险,支付保险费,并有权从投保方收回该费用,合同价款相应进行调整。

(7) 若发生了相关风险造成了一定的损失,没能得到有效得到保险公司的赔付情况,则双方根据合同约定的义务和责任来承担该损失。

(8) 工程在实施中有些情况发生了变化, 可能导致与投保时提供给保险公司的情况不一致, 则投保方应及时通知保险公司, 做出相应的调整, 使保险合同持续有效。

虽然在合同条件中没有明确哪一方投保, 按照惯例在国际工程承包中一般由承包商办理投保, 当然, 保险费用由雇主承担。对于某项复杂而且规模较大, 承包商较多时, 一般由雇主统一办理保险, 这样不仅有利于节约投资费用, 而且有利于管理。

2) 工程和承包商设备保险

在保险中, 财产保险的对象主要有工程本身、相关的永久设备、材料及承包商的施工设备, 因而, 合同条件中对此保险作了以下的规定:

(1) 投保方应为工程本身、永久材料、设备及承包商的施工设备办理保险, 投保金额不能低于其重置成本、拆迁费及相应的利润额。

(2) 使保险的有效期限一直持续到颁发履约证书的日期为止。

(3) 除非在专用条件中另有规定, 此处有关工程和承包商设备的保险应满足下列要求:

① 应由承包商作为投保方办理和维护。

② 应由共同有权从保险人处得到赔偿的各方联名投保; 所得到的理赔款应作为专款用于修复损失或损害的内容。

③ 保险应覆盖“雇主的风险”以外的全部风险造成的损失以及对由于雇主使用或占用工程另一部分造成的工程某一部分的损失或损害。

(4) 此处的保险、保险人不承担以下的损失、损害和修复:

① 由于设计、材料、工艺原因导致处于缺陷状态的工程部分, 但对于缺陷状态直接导致其他工程部分受到的损失或损害, 除下面第②项的情况外, 仍需要保险。

② 因修复处于缺陷状态的工程部分而导致其他部分工程的损失或损害。

③ 雇主已经接收的部分工程, 除非该部分工程的损害责任应由承包商承担。

④ 仍没有运到工程所在国的物品, 但不得违背通用条件第 14.5 款[拟用于工程的永久设备和材料]的规定。

3) 人员伤亡有财产损害险

FIDIC 施工合同条件中所列的“人员伤亡及财产损害险”主要指的是第三方责任险, 即在投保时, 投保人应投第三方责任险, 这样对承包商在履约的过程中可能造成的第三方人员伤亡或财产损失, 就可以将此风险转移给保险公司, 以避免或减少合同双方对此承担的责任。这种投保额应不低于投标函附录中规定的数额, 若专用条款中没有明确投保人, 则一般由承包商以合同双方的名义办理保险。

4) 承包商人员的保险

承包商应为其雇用的任何人员办理保险, 同时应保障雇主和工程师, 当然由于雇主或其人员的过错或渎职造成的损害不包含其中。这种保险的有效期限为其雇员从事项目工作的全部时间内有效, 对于分包商的人员, 由分包商办理保险。

2. 不可抗力

1) 不可抗力的范围

通用条件第 19.1 条规定: 施工中的不可抗力是指某种异常事件或情况, 这些包括:

(1) 一方无法控制的。

(2) 双方在签订合同前,不能对之进行合理准备的。

(3) 发生后,该方不能合理避免或克服的。

(4) 不能主要归因于他方的。

只要满足上述(1)-(4)项的条件,不可抗力可以包括但不限于下列各种异常事件或情况:

① 战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行为。

② 叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内战。

③ 承包商人员和承包商及其分包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工。

④ 战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染,但可以因承包商使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外。

⑤ 自然灾害,如地震、飓风、台风或火山活动。

2) 不可抗力发生后各方的工作

(1) 通知对方。若一方遇到不可抗力后,导致其无法履行合同则应在 14 天内通知对方,并说明哪些义务不能履行,发出通知后,该方可以免于此义务的履行。

(2) 采取措施减少损失。发生不可抗力后,各方应采取措施,将此事件造成的损失降到最低程度,包括自己的和对方的。若不可抗力事件结束了,一方应向另一方发出通知,这一条规定是基于合同双方在诚信的原则下面应有的义务,我国的合同法也有这样的规定。

3) 不可抗力的后果及处理

(1) 承包的索赔。若承包商受到了不可抗力的影响,首先可以进行工期索赔,要求延长工期,对于费用索赔若是由于前述“不可抗力范围”中的(1)(2)(3)(4)造成的,并有(2)(3)(4)类情况发生在工程所在国,则承包商可以进行费用索赔,因为这些因素是一个有经验的承包商在投标时不能合理预见的,所以应由雇主来承担相关责任。

(2) 对分包商的影响。不可抗力若影响到了分包商,分包商可以通过分包合同向承包商索赔,若其索赔的额度大于承包商向雇主的索赔,则超出的这一部分由承包商承担。

(3) 不可抗力致使合同无法履行的处理。①当不可抗力发生后,若其持续的时间很长,任何一方可在满足下列规定的前提下向对方发出终止合同的通知,若因不可抗力事件连续使合同不能履行超过 84 天或间断影响超过 140 天,即可发生终止合同通知,通知发出后 7 天合同终止生效,此时,工程师应立即确定承包商完成的工作价值,并签发支付证书。②若对于双方不可控制的事件发生,如不可抗力发生,使得双方无法履行合同,符合当地法律法规规定的可以解除合同的条件,当事人双方可以解除合同,但应该支付给承包商已完工程的价款,工程师也应及时审核并签收支付凭证。

3. 索赔管理

1) 索赔程序

(1) 承包商应在引起索赔的事件或情况发生后 28 天内向工程师提交索赔通知,承包商还应提交一切与此类事件或情况有关的任何其他通知,以及索赔的详细证明报告。

(2) 承包商应做好用以证明索赔的同期记录。工程师在收到上述通知后,在不事先承认业主责任的情况下,监督此类记录,并可以指令承包商保持进一步的同期记录。承包

商应按工程师的要求提供此类记录的复印件,并允许工程师审查所有这类记录。

(3) 提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生 42 天之内,或在工程师批准的其他合理时间内,承包商应向工程师提交一份索赔报告,详细说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额。

(4) 工程师在收到索赔报告或该索赔的任务进一步的详细证明报告后 42 天内,或在承包商批准的其他合理时间内,应表示批准或不批准,并就索赔的原则作出反应。

(5) 工程师根据合同规定确定承包商可获得的工期延长和费用补偿。如果承包商提供的详细报告不足以证明全部的索赔,则他仅有权得到已被证实的那部分索赔;对于已被证实的索赔金额应列入每份支付证明中。

(6) 索赔的丧失和被削弱。如果承包商未能在引起索赔的事件或情况发生后 28 天向工程师提交索赔通知,则承包商的索赔权丧失。

2) 承包商可以引用的索赔条款

承包商可以直接引用和间接引用的条款分别见表 5-1,表 5-2。

表 5-1 承包商索赔可直接引用的条款

编号	条款号	条款主体内容	有可能调整的内容
1	1.9	延误的图纸或指示	C+P+T
2	2.1	进入现场的权利	C+P+T
3	3.3	工程师的指示	C+P+T
4	4.6	合作	C+P+T
5	4.7	放线	C+P+T
6	4.12	不可预见的外界条件	C+T
7	4.24	化石	C+T
8	7.2	样本	C+P
9	7.4	检验	C+P+T
10	8.3	进度计划	C+P+T
11	8.4	竣工时间的延长	T
12	8.5	由公共当局引起的延误	T
13	8.8 & 8.9 & 8.11	工程暂停: 暂停引起的后果: 持续的暂停	C+T
14	9.2	延误的检验	C+P+T
15	10.2	对部分工程的验收	C+P
16	10.3	对竣工检验的干扰	C+P+T
17	11.2	修补缺陷的费用	C+P
18	11.6	进一步的检验	C+P
19	11.8	承包商的检查	C+P
20	12.4	省略	C
21	13.1	有权变更	C+P+T
22	13.2	价值工程	C

续表

编号	条款号	条款主体内容	有可能调整的内容
23	13.5	暂定金额	C+P
24	13.7	法规变化引起的调整	C+T
25	13.8	费用变化引起的调整	C
26	15.5	雇主终止合同的权利	C+P
27	16.1	承包商有权暂停工作	C+P+T
28	16.2&16.4	承包商终止合同：终止时的支付	C+P
29	17.3&17.4	雇主风险：雇主的风险造成的后果	C+(P)+T
30	17.5	知识产权与工业产权	C
31	18.1	有关保险的具体要求	C
32	19.4	不可抗力引起的后果	C+T
33	19.6	可选择的终止、支付和返回	C
34	19.7	根据法律解除履约	C

表 5-2 承包商的隐含索赔条款

编号	条款号	条款主体内容	可以调整的内容
1	1.3	通讯联络	C+P+T
2	1.5	文件的优先次序	C+T
3	1.8	文件的保管和提供	C+P+T
4	1.13	遵守法律	C+P+T
5	2.3	雇主的人员	T-C
6	2.5	雇主的索赔	C
7	3.2	工程师的授权	C+P+T
8	4.2	履约保证	C
9	4.10	现场数据	C+T
10	4.20	雇主的设备和免费提供的材料	C+P+T
11	5.2	对指定的反对	C+T
12	7.3	检查	C+P+T
13	8.1	工程开工	C+T
14	8.12	复上	C+P+T
15	12.1	需测量的工程	C+P
16	12.3	估价	C+P

注：C、P、T 分别表示成本、利润和工期。

4. 合同争议的解决

FIDIC(1999 年版)施工合同条件第 20.2~20.8 条对合同争议的解决作出了详细的规定，有关争议解决的方式有：提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、双方协商及仲裁。

(1) 提交工程师决定。FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一就是建立以工程师为核心的管理模式, 因而不论是承包商的索赔还是雇主的索赔首先提交给工程师。任何一方要求工程师作出决定时, 工程师应与双方协商一致, 若未能达成一致, 则工程师按照合同根据公正的原则作出决定(应当说明的是这里工程师的决定指的是合同履行过程中的相关决定, 不是争端的解决)。

(2) 提交争端裁决委员会决定。双方对于合同的任何争端, 包括对工程师签发的证书、作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时, 可以将争议提交给争端裁决委员会决定。收到申请后的 84 天内争端裁决委员会应作出决定, 此时任何一方对裁决不满意可以在收到决定后的 28 天内将不满意的意见通知另一方。

(3) 双方协商。对争端裁决委员会的决定不满意, 双方开始争端前应努力友好解决争端, 可以在不少于 56 天的时间内进行, 若协商不成, 可以提出仲裁。

(4) 仲裁。合同条件中所建议的双方最终解决争议的方式是仲裁。仲裁规则应采用国际商会的规则, 就争端涉及的问题工程师有权被唤作证人。若仲裁在工程进行中开始的, 则合同各方应继续履行合同义务, 不受仲裁的影响。

复习思考题

1. 简述 FIDIC 第四版合同条件及适用范围。
2. FIDIC 在 1999 年出台了哪几个合同条件? 简述其特点和适用范围。
3. 简述 FIDIC 合同中雇主和承包商的主要权利和义务。
4. FIDIC 施工合同条件中质量、进度及支付管理的内容有哪些?
5. FIDIC 施工合同条件中规定的争议解决的方式有几种?
6. 什么叫不可抗力? 合同中规定的不可抗力的内容有哪些? 其风险如何承担?

第6章 工程合同索赔管理

教学提示:本章介绍了索赔的定义、分类、特点、作用及条件;详细阐述了索赔的原因、程序及索赔时使用的各种文件;重点论述了工期索赔、费用索赔的处理与计算方法,并结合算例和实际案例来分析;最后介绍了反索赔的概念及其处理的方法。

教学要求:通过本章教学应使学生了解索赔的概念、分类及特点;熟悉索赔与反索赔的程序。

6.1 索赔概述

6.1.1 索赔的概念及特征

1. 索赔的定义

索赔(claim)一词具有较为广泛的含义,其一般含义是指对某事某物权利的一种主张、要求和坚持等。建设工程索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是应由合同对方应承担责仟或风险的事件造成损失后,向对方提出补偿的权利要求。在工程建设的各个阶段,都有可能发生索赔,但在施工阶段的索赔发生较多。

索赔具有广义和狭义两种解释:广义的索赔是指合同双方向对方提出的索赔,既包括承包商向业主的索赔,也包括业主向承包商的索赔;狭义的索赔一般指承包商向业主的索赔。

2. 索赔的特征

在工程建设合同履行过程中,索赔是不可避免的。从索赔的定义可以归纳出以下基本特征。

(1) 索赔的依据是法律法规、合同文件及工程惯例

合同当事人一方另一方索赔必须有合理、合法的证据,否则索赔不可能成功。这些证据包括合同履行地的法律法规及政策和规章、合同文件及工程建设交易习惯。当然最主要的依据是合同文件。

(2) 索赔是双向的

基于合同中,当事人双方平等的原则,承包商可以向发包方索赔,发包方也可以向承包商索赔。由于在索赔处理的实践中,发包方向承包商索赔处于有利的地位,他可以直接从支付给承包商的工程款中扣取相关费用,以实现索赔的目标,而承包商向发包方索赔相对而言实现较困难一些,因而通常所理解的索赔是承包商向发包方的索赔,也就是前面所述的狭义索赔。

承包商的索赔范围非常广泛,一般认为只要是因非承包商自身责任造成其工期延长或成本增加,都有可能向发包方提出索赔。有时发包方违反合同,如未及时交付施工图纸、提供满足条件的施工现场、决策错误等造成工程修改、停工、返工、窝工及未按合同规定支付工程款等,承包商可向发包方提出赔偿要求。有时发包方并未违反合同,而是由于其他原因,如合同范围内的工程变更、恶劣气候条件影响、国家法律、法规修改等造成承包商损失或损害的,承包商也可以向发包方提出补偿要求,因为这些风险应由发包方承担。

(3) 与合同对比,索赔一方必须有损失

这种损失可能是经济损失或权利损害。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支;权利损害是指虽然没有经济上的损失,但造成了某方权利上的损害,如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影响,承包商有权要求工期延长等。因此发生了实际的经济损失或权利损害,应是一方提出索赔的一个基本前提条件。没有实际损失,索赔不可能成功。这与承担违约责任不一样,一方违约了,没有给对方造成损失,同样应向对方承担责任,如支付违约金等。

(4) 索赔应由对方承担责任或风险事件造成,索赔一方无过错

这一特征也体现了索赔成功的一个重要条件,即索赔一方对造成索赔的事件不承担责任或风险,而是根据法律法规、合同文件或交易习惯应由对方承担风险,否则索赔不可能成功。当然由对方承担风险但不一定对方有过错,如物价上涨,发生不可抗力等,均不是发包人的过错造成,但這些风险应由发包人承担,因而若发生此类事件给承包商造成损失,承包商可以向发包方索赔。

(5) 索赔是一种未经对方确认的单方行为

一方面,在合同履行过程中,只要符合索赔的条件,一方对另一方的索赔可以随时进行,不必事先经过对方的认可,至于索赔能否成功及索赔值如何则应根据索赔的证据等具体情况而定。另一方面,单方行为含义指一方对另一方的索赔何时进行,哪些事件可以进行索赔,当事人双方事先不可能约定,只要符合索赔的条件,就可以启动索赔程序。

基于上述对索赔特征的分析可以知道,实质上索赔是一种正当的权利或要求,是合情、合理、合法的行为,它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付,不是无中生有、无理争利。索赔同守约、合作并不矛盾、对立,索赔本身就是市场经济中合作的一部分,只要是符合有关规定的、合法的或者符合有关惯例的,就应该理直气壮地、主动地向对方索赔。对一个承包商而言,只有善于索赔,才能维护自身的合法权益,才能取得更大的利润。

3. 索赔与违约责任的比较

合同在订立与履行过程中,当事人可以约定违约责任来约束双方的行为,以保证合同目标的实现,索赔的处理同样是当事人实现自己权益的一种重要的合同管理途径。但两者在法律概念及处理方式上不同。

(1) 索赔事件的发生,可以是一定的行为,也可以是非当事人的行为造成,如物价上涨,不可抗力事件发生等,均非当事人的行为造成,但是承包商可以向发包方索赔费用和要求延长工期;而追究违约责任,必然是当事人行为造成,而且是违反了合同约定的内容,否则不能追究违约责任。

(2) 索赔事件的发生可以是当事人一方引起的,也可以是非当事人引起的,当事人可能

有过错,也可能没有过错。而追究违约责任必须是当事人的行为造成,而且有过错。

(3) 索赔的成功必须以索赔一方有实际损失为前提之一,没有损失索赔不可能成功。因为索赔具有补偿性。而违约责任的追究只要当事人有违约过错行为发生,无论是否给对方造成损失均应承担责任,因为违约责任具有惩罚性,如一方违约应向另一方支付违约金等。

(4) 索赔事件的发生,不一定在合同文件中有规定,而合同违约责任,必然在合同中有约定。因而索赔的依据,不仅仅是合同文件,还包括法律法规及工程交易习惯等,而追究违约责任的主要依据是合同文件。

6.1.2 索赔的分类

1. 按索赔的依据分类

(1) 合同内索赔。合同内索赔是指索赔所涉及的内容可以在合同条款中找到依据,并根据合同规定明确划分责任。一般情况下,合同内索赔的处理和解决要顺利一些。

(2) 合同外索赔。合同外索赔是指索赔的内容和权利难以在合同条款中直接找到依据,但可从合同引申含义和合同适用法律或政府颁发的有关法规及相关的交易习惯中找到索赔的依据。

2. 按索赔当事人分类

(1) 承包商与发包方间的索赔。这种索赔一般与工程计量、工程变更、工期、质量、价格等方面有关,有时也与工程中断、合同终止有关。

(2) 承包商与分包商间的索赔。在总分包的模式下,总承包商与分包商之间可能就分包工程的相关事项产生索赔。

(3) 承包商与供货商间的索赔。他们之间可能因产品或货物的质量不符合技术要求,数量不足或不能按时交货或不能按时支付货款产生索赔。

(4) 业主与监理单位间的索赔。在监理合同履行中因双方的原因或单方原因使合同不能得到很好的履行或外界原因如政策变化、不可抗力等而产生的索赔。

3. 按索赔的目的分类

(1) 费用索赔。在合同履行中,由于非自身的原因而应由对方承担责任或风险情况,使自己有额外的费用支付或损失,可以向对方提出费用索赔。如工程量增加,承包商可以向发包方提出费用补偿的索赔要求。

(2) 工期索赔。这里主要指出现了应由发包方承担风险责任的事件影响了工期,承包商可以向发包方提出工期补偿的索赔要求。

4. 按索赔事件的性质分类

(1) 工程延误索赔。因业主未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因业主指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包商对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。

(2) 工程变更索赔。由于业主或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程施工顺序等,造成工期延长和费用增加,承包商对此提出索赔。

(3) 工程终止索赔。由于业主违约或发生了不可抗力事件等造成工程非正式终止,承包商因蒙受经济损失而提出索赔。

(4) 工程加速索赔。由于业主或监理工程师指令承包商加快施工进度,缩短工期,引起承包商人、财、物的额外开支而提出的索赔。

(5) 意外风险和不可预见因素索赔。在工程实践中,因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包商通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。

(6) 其他索赔。如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法规变化等原因引起的索赔。

5. 按索赔处理的方式分类

(1) 单项索赔。单项索赔是针对某一干扰事件提出的,在影响原合同正常运行的干扰事件发生时或发生后,由合同管理人员立即处理,并在合同规定的索赔有效期内向业主或监理工程师提交索赔要求和报告。

(2) 综合索赔。综合索赔又称一揽子索赔,一般在工程竣工前和工程移交前,承包商将工程实施过程中因各种原因未能及时解决的单项索赔集中起来进行综合考虑,提出一份综合索赔报告,由合同双方在工程交付前后进行最终谈判,以一揽子方案解决索赔问题。这种索赔由于复杂,涉及的索赔值大,不易解决,因而在实践中最好能及时作好单项索赔,尽量不采用综合索赔。

6.1.3 索赔的作用及条件

1. 索赔作用

(1) 索赔是合同全面、适当履行的重要保证。

合同一经当事人双方签订,即对双方产生相应的法律约束力,双方应认真履行自己的责任与义务。索赔是合同法律效力的具体体现,并且由合同的性质决定。如果没有索赔和关于索赔的法律规定,则合同形同虚设,对双方都难以形成约束,这样合同的实施得不到保证,就不会有正常的社会经济秩序。索赔能对违约者起警戒作用,使他考虑到违约的后果,以尽力避免违约事件发生。

所以索赔有助于工程中双方更紧密地合作,有助于合同目标的实现。

(2) 索赔是落实和调整合同双方经济责任、权利、利益关系的手段,也是合同双方风险分担的又一次分配,离开了索赔,合同责任就不能全面体现,合同双方的责、权、利关系就难以平衡。

(3) 索赔是合同和法律赋予受损者的权利。

对承包商来说,是一种保护自己、维护自己正当权益、避免损失、增加利润的手段。在现代承包工程中,特别是在国际承包工程中,如果承包商不能进行有效的索赔,不精通索赔业务,往往会使损失得不到合理的、及时的补偿,从而不能进行正常的生产经营,使自身遭受更大的损失。

(4) 索赔对提高企业和工程项目管理水平起着促进作用。

要想索赔取得成功,必须加强工程项目管理,特别是合同管理,加练内功提高自身的

管理水平。

(5) 索赔可促使工程造价更加合理。

施工索赔的正常开展,把原来打入工程造价的一些不可预见费用,改为按实际发生的损失支付,有助于降低工程报价,使工程造价更趋合理。

2. 索赔的基本条件

在合同履行过程中,当事人一方另一方索赔应满足一定的条件才可能获得成功。这些最基本的要求与条件及其相关的内容见表 6-1。

表 6-1 索赔的基本条件

要 求	内 容
客观性	(1) 干扰事件确实存在 (2) 干扰事件的影响存在 (3) 造成工期拖延,承包商损失 (4) 有证据证明
合法性	按合同、法律或交易习惯规定应予补偿
合理性	(1) 索赔要求符合合同规定 (2) 符合实际情况 (3) 索赔值的计算符合以下几方面 ① 符合合同规定的计算方法和计算基础 ② 符合公认的会计核算原则 ③ 符合工程惯例 (4) 干扰事件、责任、干扰事件的影响与索赔值之间有直接的因果关系,索赔要求符合逻辑
及时性	(1) 出现索赔事件应提出索赔意向通知 (2) 索赔事件结束后的一段时间内应提出正式索赔报告 如国内施工合同文本规定应在出现索赔事件后的 28 天内提意向通知,索赔事件结束后的 28 天内提正式索赔报告,否则失去索赔的机会

6.2 索赔程序及文件

6.2.1 一般程序

1. 索赔工作程序

索赔程序一般是指从出现索赔事件到最终处理全过程所包括的工作内容及工作步骤。其详细的步骤如图 6.1 所示(这里主要指承包商向业主的索赔)。

由图 6.1 知,承包商向业主索赔的主要步骤有:

(1) 提出索赔意向通知。

向业主或工程师就某一个或若干个索赔事件表示索赔愿望、要求或声明保留索赔的权

利。索赔意向的提出是索赔工作程序中的第一步，其关键是抓住索赔机会，及时提出索赔意向。

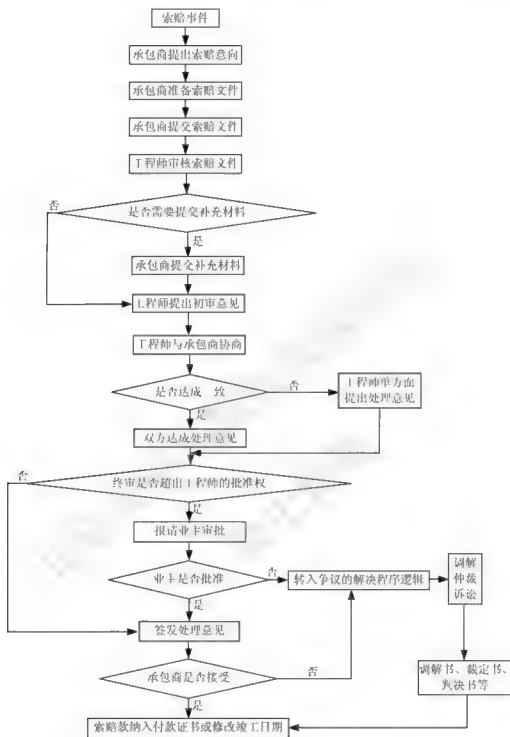


图 6.1 索赔工作程序

(2) 准备索赔资料及文件。

在提出了索赔意向通知后,承包商应就索赔事件收集相关资料,跟踪和调查影响事件,并分析其产生的原因,划分责任,实事求是地计算索赔值,并起草正式的索赔报告。

(3) 提交正式索赔报告。索赔报告应在合同规定的时间内向业主或工程师提交,否则,可能会失去索赔的机会。

(4) 工程师(业主)对索赔报告审核。工程师(业主)审核索赔是否成立。索赔要成立必须满足以下条件。

① 索赔一方有损失。如承包商应有费用的增加或工期损失。

② 这种损失足应由业主承担责任或风险的事件所造成的,承包商没有过错。

③ 承包商及时提交了索赔意向通知和索赔报告。

这三个条件没有先后主次之分,必须同时满足,承包商的索赔才可能成功。

(5) 索赔的处理与解决。

工程师应及时公正合理地处理索赔,在处理索赔要求时,应充分听取承包商的意见并与承包商协商,若协商不一致,工程师可以单方作出处理意见。

(6) 业主批准。工程师在签发完处理意见后报业主审核或批准。

(7) 业主与承包商协商。

若双方均不能接受工程师的处理意见,也不能达成一致。为此双方就索赔事件产生了争议或纠纷,此时,按争议的解决方式来处理索赔事件。

2. 施工合同条件中规定的程序

1) 国内施工合同文本规定的程序

《施工合同文本》第三十六条规定的程序如下:

(1) 当一方同另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

(2) 发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其它情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。

① 索赔事件发生 28 天内,向工程师发出索赔意向通知。

② 发出索赔意向通知后 28 天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

③ 当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终止后 28 天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

④ 工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于 28 天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复,视为该项索赔已被认可。

(3) 因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

2) FIDIC(1999 年版)施工合同条件规定的程序

(1) 承包商应在引起索赔的事件或情况发生后 28 天内向工程师提交索赔通知, 承包商还应提交一切与此类事件或情况有关的任何其他通知, 以及索赔的详细证明报告。

(2) 承包商应做好用以证明索赔的同期记录。工程师在收到上述通知后, 在不事先承认业主责任的情况下, 监督此类记录, 并可以指令承包商保持进一步的同期记录。承包商应按工程师的要求提供此类记录的复印件, 并允许工程师审查所有这类记录。

(3) 提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生 42 天之内, 或在工程师批准的其他合理时间内, 承包商应向工程师提交一份索赔报告, 详细说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额。

(4) 工程师在收到索赔报告或有关该索赔的任务的进一步详细证明报告后 42 天内或在承包商批准的其他合理时间内, 应表示批准或不批准, 并就索赔的原则作出反应。

(5) 工程师根据合同规定确定承包商可获得的工期延长和费用补偿。如果承包商提供的详细报告不足以证明全部的索赔, 则他仅有权得到已被证实的那部分索赔; 对于已被证实的索赔金额应列入每份支付证明中。

(6) 索赔的丧失和被削弱。如果承包商未能在引起索赔的事件或情况发生后 28 天内向工程师提交索赔通知, 则承包商的索赔权丧失。

6.2.2 索赔报告

1. 索赔报告的形式及内容

索赔报告, 它是合同一方对对方提出索赔的书面文件, 它全面反映了一方当事人对一个或若干个索赔事件的所有要求和主张, 对方当事人也是通过对索赔报告的审核、分析和评价来作认可、要求修改、反驳甚至拒绝索赔要求, 索赔报告也是双方进行索赔谈判或调解、仲裁、诉讼的基础, 因此索赔报告的表达与内容对索赔的解决有重大影响, 索赔方必须认真编写索赔报告。

(1) 对于一般的单项索赔, 其报告的形式及内容见表 6-2。

表 6-2 单项索赔报告的一般格式

序号	索赔报告构成	一般内容
1	题目	如关于×××事件的索赔
2	事件	详细描述事件过程, 双方信件交付、会谈, 并指出对方应承担风险或风险的证据等
3	理由	主要是法律依据、合同条款和工程惯例等
4	结论	损失或损害及其大小, 提出索赔的具体要求
5	损失估价	列出损失费用的计算方法、计算基础等, 并计算出损失费用的大小
6	延期计算	列出工期延长的计算方法、计算公式等, 并计算出要求延长的天数
7	附录	各种证据、文件等

(2) 对于综合索赔报告,其形式和内容可结合具体情况来确定,实质是将许多未解决的单项索赔加以分类和综合整理而形成。一般应包括以下几个方面的内容。

- ① 索赔致函,向对方提出索赔的主张、声明等。
 - ② 索赔事件描述,包括发生的原因、责任或风险承担的分析与认定。
 - ③ 索赔要求,包括各索赔事件引起的费用与工期索赔值。
 - ④ 费用和工期索赔值的详细计算过程及依据。
 - ⑤ 分包商索赔。
 - ⑥ 各种有效的、合法的、及时的证据及证明资料等附件。
- 主要包括合同文件、政策法规法规及工程惯例、现场记录、往来函件和工程照片等。

(3) 我国《建设工程监理规范》规定的形式及内容。

在我国 2000 年出台的《建设工程监理规范》(GB 50319-2000)对工期索赔与费用索赔申请表的形式作了规定。

① 工程临时延期申请表(A7),即工期索赔的形式如下:

工程临时延期申请表

工程名称: _____	编号: _____
致: _____ (监理单位) 根据施工合同条款 _____ 条的规定,由于 _____ 原因,我方申请工程延期,请予以批准。	
附件: 1. 工程延期的依据及工期计算	
合同竣工日期: _____ 申请延长竣工日期: _____	
2. 证明材料	
承包单位 _____ 项目经理 _____ 日 期 _____	

② 费用索赔申请表(A8),即费用索赔的形式如下:

费用索赔申请表

工程名称:	编号:
致: (监理单位) 根据施工合同条款_____条的规定, 由于_____原因, 我方要求索赔金额(大写)_____, 请予以批准。 索赔的详细理由及经过: 索赔金额的计算: 附: 证明材料	
承包单位 _____ 项目经理 _____ 日 期 _____	

2. 索赔报告的编写要求

索赔报告是向对方索赔的最重要文件, 因而应有说服力, 合情合理, 有理有据, 逻辑性强, 能说服工程师、业主, 从而使索赔获得成功。编写索赔报告应满足下列要求。

1) 索赔事件真实, 符合实际

这是索赔的基本要求, 关系到索赔一方的信誉和索赔的成功。一个符合实际的索赔报告, 可使审阅者看后的第一印象是合情合理, 不会立即予以拒绝。相反如果索赔要求缺乏根据, 漫天要价, 使对方一看就极为反感, 甚至连其中有道理的索赔部分也被置之不理, 不利于索赔问题的最终解决。

2) 说服力强, 责任分析清楚明确

一般索赔报告中针对的干扰事件是由对方应承担责任或风险引起的, 应充分引用合同文件中的有关条款, 为自己的索赔要求引证合同依据, 将风险责任推给对方。特别注意的是在报告中不可用含混的语言和自我批评的语言, 否则, 会丧失在索赔中的有利地位。

3) 索赔值计算准确

索赔报告中应完整列入索赔值的详细计算资料, 计算结果要反复校核, 做到准确无误。计算上的错误, 尤其是扩大索赔款的计算错误, 会给对方留下恶劣的印象, 对方会认为提出的索赔要求太不严肃, 其中必有多处弄虚作假, 会直接影响索赔的成功。

4) 简明扼要, 条理清楚, 逻辑清楚

索赔报告在内容上应组织合理、条理清楚, 各种定义、论述、结论正确, 逻辑性强, 既能完整地反映索赔要求, 又要简明扼要, 使对方很快理解索赔的要求及理由。

索赔报告的逻辑性, 主要在于将索赔要求(工期延长和费用增加)与干扰事件、责任、合同条款、影响连成一条打不断的逻辑链。

6.2.3 索赔策略

索赔策略是经营策略的一部分。对某一个具体的索赔事件往往没有预定的、特定的解决方法及结果, 它往往受到双方签订的合同文件、各自的管理水平和索赔能力及处理问题的公正性和合理性的影响。对于成功的索赔不仅要充分的证据、理由和依据, 索赔艺术技巧与策略也是影响索赔能否成功及达到预期目的的重要因素。

1. 确定索赔目标

(1) 提出任务, 确定索赔目标。

索赔目标即索赔的基本要求和索赔的最终期望值。它的确定应根据合同实施情况及承包商的实际损失确定, 尊重客观情况实事求是, 不能弄虚作假, 应充分分析目标实现的可能性。

(2) 分析索赔目标实现的基本条件。

(3) 分析索赔实现可能面临的风险。

目标实现面临着许多风险。在索赔处理期间, 在履行合同时出现失误, 可能成为另一方反驳的攻击点。如承认没有及时索赔, 没能完成合同规定的工程量, 没有能够达到质量标准等。这些都会影响索赔目标的实现, 因而承认应通过有效的管理来逃避这些风险。

2. 分析对方

古人云: “知己知彼, 百战不殆”。因而在索赔的处理过程中, 首先分析对方的兴趣和利益所在, 充分利用这一点, 可以使索赔处理的谈判在一个友好的气氛中进行, 并通过分析对方的利益所在, 研究双方的利益一致性和矛盾性, 使对方在感兴趣的地方作出让步。其次分析对方的商业习惯、文化特点等, 在索赔处理中, 充分尊重对方的价值观念、文化传统、社会心理, 甚至索赔处理者的个人兴趣, 这样有利于索赔目标的实现。

3. 把握索赔的艺术与技巧

(1) 正确把握提出索赔的时机。

索赔过早提出, 往往容易遭到对方反驳或在其他方面可能施加的挑剔、报复等; 过迟提出, 则容易留给对方超过索赔有效期的借口使索赔要求遭到拒绝, 因此索赔方必须在索赔时效范围内适时提出。

(2) 索赔谈判中注意方式方法。

合同一方向对方提出索赔要求, 进行索赔谈判时, 措辞应婉转, 说理应透彻, 以理服人, 而不是得理不让人, 尽量避免使用抗议式提法, 既要正确表达自己的索赔要求, 又不伤害双方的和气和感情, 以达到索赔的良好效果。

(3) 索赔处理时作适当必要的让步。

在索赔谈判和处理时应根据情况作出必要的让步, 扔“芝麻”抱“西瓜”, 有所失才

有所得。可以放弃金额小的小项索赔，坚持索赔值大的索赔。

6.3 索赔值的计算

6.3.1 计算理论分析

1. 索赔事件

1) 定义

索赔事件又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的那类事件。不断地追踪、监督索赔事件就是不断地发展索赔机会。

2) 索赔事件表现形式

在工程建设合同履行的实践中，常见的索赔事件如下。

(1) 业主未按合同规定的时间和数量交付设计图纸和资料，未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，造成工程拖延和费用增加。

(2) 工程实际地质条件与勘察不一致。

(3) 业主或工程师变更原合同规定的施工顺序，打乱了工程施工计划。

(4) 设计变更、设计错误或业主、工程师错误的指令或提供错误的数据等造成工程修改、返工、停工或窝工等。

(5) 工程数量变化，使实际工程量与原定工程量不同。

(6) 业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。

(7) 业主或工程师指令增加额外工程。

(8) 业主指令工程加速。

(9) 不可抗力因素。

(10) 业主未及时支付工程款。

(11) 合同缺陷，如条款不完善、错误或前后矛盾，双方就合同理解产生争议。

(12) 物价上涨，造成材料价格、工人工资上涨。

(13) 国家政策、法令修改，如增加或提高新的税费、颁布新的外汇管制条例等。

(14) 货币贬值，使承包商蒙受较大的汇率损失等。

2. 索赔事件的影响分析

在工程实施及合同履行中，有许多索赔事件（干扰事件）发生，这些干扰事件的发生原因很复杂，但其对合同履行的影响从责任或风险的承担角度看，可以分成三大类：第一类是应由业主承担的责任或责任风险，如物价的变化、工程设计变更、工程师的不当行为等；第二类是应由承包商承担的责任或风险，如延误工期、分包人的违约、质量不合格等；第三类是应由业主与承包商双方各自承担风险的事件，如洪水、地震等自然灾害，这些干扰事件造成的影响由各自承担责任，当然若工期受到影响应顺延工期。

这些事件对合同的影响程度可以以一种状态进行分析，分析各种干扰事件的实际影响，从而准确计算工期与费用索赔值。这三种状态是合同状态、可能状态和实际状态。

1) 合同状态

(1) 含义:不考虑任何干扰事件的影响,仅对签订合同时的状态进行分析,得到相应的工期与价格,即为合同状态。

合同确定的工期和价格是针对“合同状态”(即合同签订时)的合同条件、工程环境和实施方案。在工程施工中,由于干扰事件的发生,造成“合同状态”的变化,原“合同状态”被打破,应按合同规定,重新确定合同工期和价格。新的工期和价格必须在“合同状态”的基础上分析计算。

合同状态(又被称为计划状态或报价状态)的计算方法和计算基础是极为重要的,它是整个索赔值计算的基础。

(2) 合同状态的分析基础。从总体上说,合同状态是重新分析合同签订时的合同条件、工程环境、实施方案和价格。其分析基础为招标文件和各种报价文件,包括合同条件、合同规定的工程范围、工程量表、施工图纸、工程说明、规范、总工期、双方认可的施工方案和施工进度计划以及人力、材料、设备的需要量和安排、里程碑事件和承包商合同报价时的价格水平等。

2) 可能状态

在考虑非承包商应承担的责任或风险干扰事件对合同状态的影响后,重新分析计算得到的工期与价格,这种情况实质仍为一种计划状态,是合同状态在受非承包商应承担责任的干扰事件影响后的可能情况,因而称为可能状态。从合同履行来看,是承包商完成合同任务业主应承担承包商的工期及价格。

3) 实际状态

在合同履行中,考虑所有的干扰事件对合同状态的影响后,重新分析计算得到的工期及价格,这种状况称为实际状态。即合同履行完后的实际工期和价格。

4) 三种状态分析

(1) 实际状态和合同状态之差即为工期的实际延长和成本的实际增加量。这里包括所有因素的影响,如业主责任、承包商责任、其他外界干扰的责任等。

(2) 可能状态和合同状态结果之差即为按合同规定承包商真正有理由提出工期和费用索赔的部分。它可以直接作为工期和费用的索赔值。

(3) 实际状态和可能状态结果之差为承包商自身责任造成的损失和合同规定的承包商应承担的风险。它应由承包商自己承担,得不到补偿。这里还包括承包商投标报价失误造成的经济损失。

因而,索赔值的计算主要是计算出可能状态与合同状态之间工期与价格(费用)差值,此差值为索赔值。

6.3.2 工期索赔值的计算

1. 工程延期分类及处理

1) 按延期原因分

(1) 业主及工程师原因引起的延期。主要表现为:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。

这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。

(2) 承包商的原因引起延误,其主要表现有:施工组织不当,如出现窝工或停工待料现象,质量不符合合同要求而造成的返工,资源配置不足,如劳动力不足,机械设备不足或不配套,技术力量薄弱,管理水平低,缺乏流动资金等造成的延误,开工延误,承包商雇佣分包商或供应商引起的延误等。

显然上述延误难以得到业主的谅解,也不可能得到业主或工程师给予延长工期的补偿。

(3) 不可控制的因素导致的延误。其主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、判乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障碍引起的延误等。

这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。

2) 按工程延误的可能结果划分

(1) 可索赔工期的延误。一般是由业主或工程师的原因造成及不可抗力因素造成的工期延误应顺延工期。

(2) 不可索赔的延误。一般应由承包商承担责任或风险事件造成的,即使是工期受到了影响,也不顺延工期。

3) 按延误事件的时间关联性分

(1) 单一延误:单一延误是指在某一延误事件从发生到终止的时间间隔内,没有其他延误事件的发生,该延误事件引起的延误称为单一延误。是否顺延工期,根据影响原因分析,若是,业主应承担赔偿责任或风险事件造成的,应顺延。否则不顺延。

(2) 共同延误:当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时,这些事件引起的延误称为共同延误。共同延误的补偿分析比单一延误要复杂些。图 6.2 中列出了共同延误发生的部分可能性组合及其索赔补偿分析结果。在业主引起的或双方不可控制因素引起的延误与承包商原因引起的延误同时发生时,即可索赔延误与不可索赔延误同时发生时,则可索赔延误就变成不可索赔的延误,这是工程索赔的惯例之一。

(3) 交叉延误:当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时,称为交叉延误。由于工程项目是一个复杂的系统工程,影响因素众多,常常会出现多种原因引起的延误交织在一起,这种交叉延误的补偿分析比较复杂。但这种情况与实际相符合,实际中单一延误和共同延误情况出现相对较少。对于交叉延误,是否可以索赔可能会出现以下几种情况,如图 6.3 所示。具体分析如下。

① 在初始延误是由承包商原因造成的情况下,随之产生的任何非承包商原因的延误都不会对最初的延误性质产生任何影响,直到承包商的延误缘由和影响已不复存在。因而在该延误时间内,业主原因引起的延误和双方不可控制因素引起的延误均为不可索赔延误。见图 6.3 中的(1)-(4)。

② 如果在承包商的初始延误已解除后,业主原因的延误或双方不可控制因素造成的延误依然在起作用,那么承包商可以对超出部分的时间进行索赔。在图 6.3 中(2)和(3)的情况下,承包商可以获得所示时段的工期延长,并且在图中(4)等情况下还能得到费用补偿。

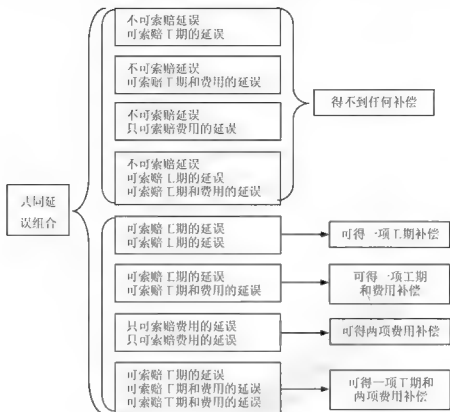


图 6.2 共同延误组合及其补偿分析

③ 反之，如果初始延误是由于业主或工程师原因引起的，那么其后由承包商造成的延误将不会使业主摆脱(尽管有时或许可以减轻)其责任。此时承包商将有权获得从业主的延误开始到延误结束期间的工期延长及相应的合理费用补偿，见图 6.3 中的(5)~(8)所示。

④ 如果初始延误是由双方不可控制因素引起的，那么在该延误时间内，承包商只可索赔工期，而不能索赔费用，见图 6.3 中的(9)~(12)。只有在该延误结束后，承包商才能对业主或工程师原因造成的延误进行工期和费用索赔，见图 6.3 中的(12)所示。

2. 计算方法

1) 分清责任

在处理工期索赔时，首先分清引起工期延误的原因，若由承包商自身原因造成的，则不能索赔，只有由业主应承担风险的事件造成的，才可以索赔。

2) 网络的计算法

(1) 计算合同状态下的工期(T_c)。

(2) 计算可能状态下的工期(T_k)，即考虑在合同履行过程中，应当由业主承担责任或风险的干扰事件对工期的影响而确定的工期值。

(3) 计算实际状态下的工期(T)，即考虑所有干扰事件对工期影响而确定的工期值。

(4) 分析判断。

① 可索赔的工期值

$$\Delta T = T_k - T_c \quad (6-1)$$

式中 ΔT ——可索赔工期值;
 T_c ——合同状态下的工期;
 T_k ——可能状态下的工期。

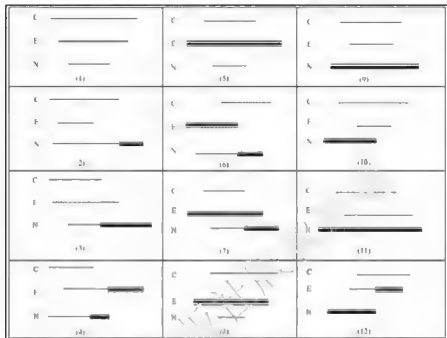


图 6.3 工程延误的交叉与补偿分析

注: C 为承包商原因造成的延误; E 为业主或工程原因造成的延误; N 为双方不可控制因素造成的延误。——为不可得到补偿的延期; ———为可以得到时间补偿的延期; ———为可以得到时间和费用补偿的延期。

② 是否延误工期的判断

$$\Delta t = t - T_k \quad (6-2)$$

式中 t ——实际状态下的工期;
 Δt ——工期延误或提前值。

若 $\Delta t < 0$, 则提前竣工;

$\Delta t = 0$, 则按时完工;

$\Delta t > 0$, 则延误工期。

3) 比例类推法

在实际工程中, 若干扰事件仅影响某些单项工程、单位工程或部分分项工程的工期, 要分析它们对总工期的影响, 可采用较简单的比例类推法。比例类推法可分为两种情况。

(1) 按工程量进行比例类推。即根据已知的工程量及对应的工期来计算增加的工程量应延长的工期。

(2) 按造价进行比例类推法。根据已知的合同价款及对应的工期, 来计算增加完成价款应增加的工期值。

比例类推法有以下的特点: 计算较简单、方便, 但有些情况可能不适用, 计算不太合理和科学, 如业主要求变更工程施工次序, 业主要求加速施工等, 不适合此方法。另外当计划中的非关键工作工程量增加或造价增加, 由于时差的存在, 不一定影响工期, 若仍按这种方法就不合理, 因而对于比例类推法从理论上应用较少。

4) 算例

【算例一】某施工网络计划如图 6.4 所示, 在施工过程中发生以下的事件:

A 工作因业主原因晚开工 2 天;

B 工作承包商只用 18 天便完成;

H 工作由于不可抗力影响晚开工 3 天;

G 工作由于工程师指令晚开工 5 天。

试问, 承包商可索赔的工期为多少天?




图 6.4 某工程施工计划

解: (1) 求合同状态下的工期 T_c 。

利用网络计划的标号法可求得 $T_c = 68$ 天, 如图 6.4 所示。

(2) 求可能状态下的工期 T_k , 即求非承包商应承担责任的干扰事件影响下的工期, 如图 6.5 所示。




图 6.5 可能状态工期计算

由图上计算知, $T_k=75$ 天

(3) 求 ΔT

$$\Delta T = T_k - T_c = 75 - 68 = 7 \text{ 天}$$

即承包商可索赔的工期为 7 天。

【算例二】某工程基础中,出现了不利的地质障碍,工程师指令承包商进行处理,土方工程量由原来的 2760m^3 增至 3280m^3 ,原定工期 45 天,同时合同约定 10%范围内的工程量增加为承包商承担的风险,试求承包商可索赔的工期为多少天?

解: (1) 可索赔工期的工程量为:

$$Q = 3280 - 2760(1 + 10\%) = 244\text{m}^3$$

(2) 按比例法计算可索赔工期为:

$$\Delta T = 45 \times \frac{244}{2760(1 + 10\%)} = 3.62 \text{ 天} \approx 4 \text{ 天}$$

6.3.3 费用索赔值的计算

1. 索赔费用分类及构成

1) 按索赔费用内容分

(1) 人工费。主要包括人工单价上涨增加费用,人工窝工费,人工工时增加引起的费用,人工劳动效率降低引起的人工费损失等。

(2) 材料费。主要包括材料用量增加的费用,材料价格上涨增加的费用,材料库存时间延长增加的保管费。

(3) 机械费。主要包括机械台班上涨增加费用,作业时间额外增加使用费用,机械闲置费用及机械进出场费等。

(4) 管理费。包括现场管理费和企业管理费,现场管理费主要包括管理人员工资,食宿设施和交通通信费用增加等,企业管理费主要包括办公费用、差旅费、通信费和职工福利费等。

(5) 利润。包括合同变更利润、工程延期利润机会损失、合同解除利润和其他利润补偿等。

(6) 其他应予以补偿的费用。包括利息、分包费、保险费及各种担保费等。

2) 按引起索赔事件分

对于不同的索赔事件,将会有不同的费用构成内容,索赔方应根据索赔事件的性质,分析其具体的费用构成内容。表 6-3 列出了不同索赔事件可能的费用项目。

3) 按可索赔费用的性质分

(1) 额外工作费用索赔。如工程量增加使承包商多作了工作,这种费用索赔一般包括利润。

(2) 损失索赔。如在合同履行中,由于物价的变化使承包商的施工成本增加,承包商机械闲置,人工窝工等造成承包商的额外损失,承包商可以向业主索赔这方面的损失。

表 6-3 索赔事件及费用项目构成

索赔事件	可能的费用项目	说明
工程 延误	(1) 人工费增加	包括工资上涨、现场停工、窝工、生产效率降低, 不合理使用劳动力等损失
	(2) 材料费增加	因工期延长引起的材料价格上涨(材料品种、用量变化)
	(3) 机械设备费	设备因延期引起的折旧费、保养费、进出场费或租赁费等
	(4) 现场管理费增加	包括现场管理人员的工资、津贴等, 现场办公设施, 现场日常管理费支出, 交通费等
	(5) 因工期延长的通货膨胀使成本增加	
	(6) 相应保险费、保函费增加	工期延长增加保险、保函费用
	(7) 分包商索赔	分包商因延期向承包商提出的费用索赔
	(8) 总部管理费分摊	因延期造成公司总部管理费用增加
	(9) 推迟支付引起的汇率率损失	工程延期引起支付延迟
	(10) 利息	不能按时得到工程款导致不能按时还贷而增加利息
工程 加速	(1) 人工费增加	因业主指令工程加速造成增加劳动投入, 不经济地使用劳动力, 生产效率降低, 节假日加班
	(2) 材料费增加	不经济地使用材料, 材料提前交货的费用补偿, 材料运输费增加
	(3) 机械设备费	增加机械投入, 不经济地使用机械
	(4) 因加速增加现场管理费	也应扣除因工期缩短减少的现场管理费
	(5) 资金成本增加	费用增加和支出提前引起负现金流量所支付的利息
工程 中断	(1) 人工费增加	如留守人员工资, 人员的遣返和重新招雇费, 对工人的赔偿等
	(2) 机械使用费	设备闲置费, 额外的进出场费, 租赁机械的费用等
	(3) 保函费、保险费、银行手续费	
	(4) 贷款利息	
	(5) 总部管理费	
	(6) 其他额外费用	如停工、复工所产生的额外费用, 工地重新整理等费用
工程量 增加 变更	费用构成与合同报价相同	合同规定承包商应承担一定比例(如 5%, 10%)的工程量增加风险, 超出部分才予以补偿 合同规定工程量增加超出一定比例时(如 15%~20%)可调整单价, 否则合同单价不变

2. 费用索赔的计算

1) 计算原则

在整个索赔处理中,费用索赔是重点和最终目标。由于干扰事件(索赔事件)的复杂性,因而对承包商费用索赔的影响计算和定量分析影响是非常大的,在工程实践中,对于费用索赔的计算必须采用人家公认的方法及计算原则,否则,索赔可能得不到批准,对于费用索赔值的计算一般应遵循以下几条原则。

(1) 遵守合同、交易习惯及法规。即在索赔处理中应符合合同条件,分清当事双方的责任,按照合同、交易习惯及现行的法规所确定的方法来计算费用索赔值。对于由承包商自己应承担责任造成的费用增加应从损失计算值中扣除。在费用索赔中应作到有理有据,遵守双方的约定。

(2) 实事求是的原则。索赔成功的一个重要条件就是索赔方必须有损失而且是由对方应承担责任的索赔事件(干扰事件)引起的。因而,承包商在计算费用索赔值时,应以干扰事件对承包商造成的实际成本和费用影响为基础,不能不诚信地过分夸大损失值,使自身收到额外的收益。这种损失可能包括承包商的直接损失和间接损失。

(3) 有理有节的原则。在索赔处理中,承包商应选择合理的计算方法,让工程师、业主接受和认可。当然,有些时候可以适当将损失值计算大一些,给工程师、业主处理索赔留下空间。同时,在最终解决索赔过程中,必要时可以作让步,以换取对方的信任,从而达到“放小抓大”的效果。

2) 计算方法

(1) 人工费的计算。人工费可按式 6-3 计算。

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \quad (6-3)$$

式中 L ——可索赔的人工费;

L_1 ——人工单价上涨费用;

L_2 ——人工工作量增加费用;

L_3 ——人工窝工费用;

L_4 ——人工工效降低费用。

以下几种情况发生,承包商可以索赔人工费。

① 因业主增加额外工程,或因业主、工程师原因造成工程延误,导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长。

② 工程所在国法律、法规、政策等变化而导致承包商人工费用方面的额外增加,如提高当地雇佣工人的工资标准、福利待遇或增加保险费用等。

③ 若由于业主或工程师原因造成的延误或对工程的不合理干扰打乱了承包商的施工计划,致使承包商劳动生产率降低,导致人工工时增加的损失,承包商有权向业主提出生产率降低损失的索赔。

④ 由于业主原因导致不能按时作业,人工出现窝工,可索赔人工窝工费。

⑤ 业主要求加速施工,不合理使用人工导致人工效率降低,可以索赔费用。

【算例三】 某木窗帘盒施工, 长度 10 000m, 合同中约定用工量为 2498 个工日, 工资为 40 元/工日。实际中, 由于业主供应材料不符合要求, 使承包商的实际用工为 2700 个工日, 同时, 实际的工资上涨到 43 元/工日。合同中双方约定工日数及工资可按实际情况调整。试求在此情况下承包商可索赔的总费用, 并分析此费用的构成。

解: (1) 求索赔费

原合同价为: $2498 \times 40 = 99\,920$ 元

实际结算价为: $2700 \times 43 = 116\,100$ 元

所以可索赔总费用 $\Delta C = 116\,100 - 99\,920 = 16\,180$ 元

(2) 分析索赔费用的构成

按实际工资及实际用工的结算款为: $2700 \times 43 = 116\,100$ 元

按计划工资考虑实际用工的价款为: $2700 \times 40 = 108\,000$ 元

按计划工资考虑合同用工合同价款为: $2498 \times 40 = 99\,920$ 元

由已知条件可知, 承包商索赔的人工费用由两个部分构成, 一部分是由于人工工资涨价的费用, 其值为 $116\,100 - 108\,000 = 8100$ 元; 另一部分是由于业主提供的原材料不符合要求, 人工工效降低的费用, 其值为 $108\,000 - 99\,920 = 8080$ 元, 这两部分共计 $8100 + 8080 = 16\,180$ 元。与第一步中计算的总索赔费用相等。

(2) 材料费计算。材料费用索赔可按式 6-4 计算。

$$m = m_1 + m_2 + m_3 \quad (6-4)$$

式中 m ——可索赔的材料费用;

m_1 ——材料用量增加费用;

m_2 ——材料价格上涨费用;

m_3 ——材料库存时间延长保管费等。

在以下几种情况下, 承包商可提出材料费的索赔。

① 由于业主或工程师要求追加额外工作、变更工作性质、改变施工方法等, 造成承包商的材料耗用量增加, 包括使用数量的增加和材料品种或种类的改变。

② 在工程变更或业主延误时, 可能会造成承包商材料库存时间延长、材料采购滞后或采用代用材料等, 从而引起材料单位成本的增加。

(3) 机械费用计算。机械费用索赔可按式(6-5)计算。

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 \quad (6-5)$$

式中 E ——可索赔的机械费用;

E_1 ——机械作业台班增加费用;

E_2 ——机械台班上涨费用;

E_3 ——机械作业效率降低损失费用;

E_4 ——机械闲置费用, 一般包括折旧费和租赁费;

E_5 ——机械设备进出场费的增加。

一般在下列情况下,可以索赔机械费用。

- ① 由于设计变更引起的工程量增加,使机械作业时间增加。
- ② 由于业主应承担风险或风险干扰事件发生使工期延长导致机械台班费上涨。
- ③ 由于业主应承担风险或风险事件发生导致施工机械的闲置而发生的费用。
- ④ 由于业主要求加速施工,不合理使用机械设备而发生的费用损失。

(4) 管理费计算。

① 现场管理费:现场管理费是某单个合同发生的、用于现场管理的总费用,一般包括现场管理人员的费用、办公费、差旅费、工具用具使用费、保险费、工程排污费等。现场管理费的索赔计算一般有以下两种情况。

A. 直接成本增加的现场管理费索赔计算,可以用索赔事件的直接费乘以现场管理率,而现场管理费率要以合同中的现场管理费总额除以该合同工程直接成本。其计算见式(6-6)。

$$MF(c) = C_1 \times \frac{F_0}{C_0} \quad (6-6)$$

式中 $MF(c)$ ——索赔的现场管理费;

C_1 ——索赔事件的直接成本;

F_0 ——合同中总的现场管理费;

C_0 ——合同中总直接成本。

【算例四】某工程承包合同,价款2100万,其中利润占5%,总部管理费150万,现场管理费250万。在合同履行中,新增加工程的直接费为400万,试计算应索赔的现场管理费为多少?

解:合同中利润为

$$I = \frac{5\%}{1+5\%} \times 2100 = 100(\text{万})$$

则合同中的直接成本 $C_0 = 2100 - 100 - 150 - 250 = 1600(\text{万})$

合同中总现场管理费 $F_0 = 250(\text{万})$

根据式(6-6)得

$$MF(c) = C_1 \times \frac{F_0}{C_0} = 400 \times \frac{250}{1600} = 62.5(\text{万})$$

即可为索赔的现场管理费为62.5万元。

B. 由于工期延长引起现场管理费的索赔。利用合同中约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期来计算。其计算式见式(6-7)。

$$MF(T) = \Delta T \times \frac{F_0}{T_0} \quad (6-7)$$

式中 $MF(T)$ ——因工期延长索赔现场管理费;

ΔT ——顺延工期;

T_0 ——合同工期;

F_0 ——同式(6-6)。

② 总部管理费:总部管理费是承包商企业总部发生的、为整个企业的经营运作提供支持和提供服务所发生的管理费用,一般包括总部管理人员费用、企业经营活动费用、差旅交通费、办公费、固定资产折旧、修理费、职工教育培训费用、保险费等。

对于总部管理费一般采取分摊方法计算,主要有以下两种方法。

A. 总直接费分摊法。分摊方法是首先将承包商的总部管理费在所有合同工程之间分摊,求出承包商单位直接费的总部管理费率(f),然后在每一个具体的索赔合同中的各项目之间分摊。即求出索赔合同对应的索赔直接费总额,利用此直接费总额乘以总部管理费率(f)。其计算见式(6-8)、式(6-9)。

$$f = \frac{\text{总部管理费总额}}{\text{合同期承包商完成总直接费}} \quad (6-8)$$

$$\text{索赔合同总部管理费} = f \times \text{索赔合同索赔的直接费} \quad (6-9)$$

式中 f ——单位直接费对应总部管理费率。

【算例五】某工程承包合同,索赔的直接费为40万元,在此期间该承包商完成其他合同的总直接费为160万元,已知在此期间,该承包商发生总部管理费为10万元。试计算此承包合同应索赔的总部管理费。

解:根据式(6-8)、式(6-9)知

$$f = \frac{10}{40+160} \times 100\% = 5\%$$

可索赔的总部管理费 = $40 \times 5\% = 2$ 万元

B. 日费率分摊法。这种方法的基本思路是按合同额分配总部管理费,再用日费率计算应分摊的总部管理费索赔值。其计算公式为:

$$\text{争议合同应分摊的总部管理费} = \frac{\text{争议合同额} P}{\text{合同期承包商完成的合同总额} P} \times \text{同期总部管理费总额} \quad (6-10)$$

$$\text{日总部管理费率} = \frac{\text{争议合同应分摊的总部管理费}}{\text{合同履行天数}} \quad (6-11)$$

$$\text{总部管理费索赔额} = \text{日总部管理费率} \times \text{合同延误天数} \quad (6-12)$$

【算例六】某工程承包合同,合同工期为240天,实施过程中由于业主原因延期60天,在此期间,承包商的经营状况如表6-4所示。试计算争议合同应索赔总部管理费额。

解: 索赔合同分摊总部管理费 = $\frac{20}{60} \times 3 = 1$ (万)

$$\text{日总部管理费率} = \frac{10000}{240+60} = 33.33 \text{ 元/天}$$

$$\text{索赔总部管理费} = 33.33 \times 60 = 2000 \text{ 元}$$

表 6-4 承包商经营状况

合 同 项 目	争议合同	其他合同	全部合同
合同额	20 万	40 万	60 万
实际直接总成本	18 万	32 万	50 万
当期总部管理费			3 万
总利润			7 万

(5) 利润。对于利润损失的索赔，一般只有承包商作了额外的与工程相关的工作才能得到，如由于设计变更，导致工程量增加，不仅可以索赔成本、管理费，而且可以索赔利润。对下列几种情况，承包商可以提出利润索赔。

- ① 因设计变更等变更引起的工程量增加。
- ② 施工条件变化导致的索赔。
- ③ 施工范围变更导致的索赔。
- ④ 合同延误导致机会利润损失。
- ⑤ 合同终止带来预期利润损失等。

对于 FIDIC(1999 版)施工合同条件，可以索赔的情况见表 6-5。

表 6-5 可以合理补偿承包商索赔的条款

序号	条款号	主要内容	可补偿内容		
			工期	费用	利润
1	1.9	延误发放图纸			
2	2.1	延误移交施工现场	✓	✓	✓
3	4.7	承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误	✓	✓	✓
4	4.12	不可预见的外界条件	✓	✓	✓
5	4.24	施工中遇到文物和古迹	✓	✓	
6	7.4	非承包商原因检验导致施工的延误	✓	✓	✓
7	8.4(a)	变更导致竣工时间的延长	✓		
8	(c)	异常不利的气候条件	✓		
9	(d)	由于传染病或其他政府行为导致工期的延误	✓		
10	(e)	业主或其他承包商的干扰	✓		
11	8.5	公共当局引起的延误	✓		
12	10.2	业主提前占用工程		✓	✓
13	10.3	对竣工检验的干扰	✓	✓	✓
14	13.7	后续法规的调整	✓	✓	
15	18.1	业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分		✓	
16	19.4	不可抗力事件造成的损害	✓	✓	

3. 费用索赔综合计算案例

【案例一】某施工单位与业主按 GF-1999-0201 合同签订施工承包工程合同,施工进度计划得到监理工程师的批准如图 6.6 所示[单位:天]。




图 6.6 某工程施工进度计划

施工中, A、E 使用同一种机械, 其台班费为 500 元/台班, 折旧(租赁)费为 300 元/台班, 假设人工工资 40 元/工日, 窝工费为 20 元/工日。合同规定提前竣工奖为 1000 元/天, 延误工期罚款 1500 元/天 [各工作均按最早时间开工]。

施工中发生了以下的情况。

(1) A 工作由业主原因晚开工 2 天, 致使 11 人在现场停工待命, 其中 1 人是机械司机。
(2) C 工作原工程量为 100 个单位, 相应合同价为 2000 元, 后设计变更工程量增加了 100 个单位。

(3) D 工作承包商只用了 7 天时间。

(4) G 工作由于承包商原因晚开工 1 天。

(5) H 工作由于不可抗力发生, 增加了 4 天作业时间, 场地清理用了 20 工日, 问在此计划执行中, 承包商可索赔的工期和费用各为多少?

解:

1. 工期顺延计算

(1) 合同工期

计算如图 6.7 所示, $T_c = 41$ 天




图 6.7 可能状态下的网络图

(2) 可能状态下的工期

A 作业持续时间: $8+2=10$ 天;

C 工作持续时间: $6+6=12$ 天;

H 工作持续时间: $12+4=16$ 天;

计算如图 6.7 所示, 可能状态下工期为: $T_k=47$ 天

(3) 可索赔工期为: $47-41=6$ 天;

2. 费用索赔(或补偿)的计算

(1) A 工作: $(11-1) \times 20 + 2 \times 300 = 1000$ 元

(2) C 工作: $2000 \times \frac{100}{100} = 2000$ 元

(3) 清场费: $20 \times 40 = 800$ 元

(4) 机械闲置的增加:

按原合同计划, 闲置时间: $14-8=6$ 天

考虑了非承包商的原因闲置时间: $22-10=12$ 天

增加闲置时间: $12-6=6$ 天

费用补偿: $6 \times 300 = 1800$ 元

(5) 奖励或罚款

实际状态的工期计算如图 6.8。




图 6.8 实际状态下的网络图

实际状态工期为 $t=45$ 天

$\Delta t = t - T_k = 45 - 47 = -2$, 小于零, 说明工期提前。

提前奖: $2 \times 1000 = 2000$ 元

所以可索赔及奖励的费用补偿为: $1000 + 200 + 800 + 1800 + 200 = 7600$ 元

【案例二】 某小型水坝工程采用 FIDIC 施工合同条件, 合同主要内容如下: 水坝土方填筑 $876\ 156\text{m}^3$, 砂砾石料 $78\ 500\text{m}^3$, 中标合同价 7 369 920 美元, 工期 1.5 年(18 个月)报价中: 工程除直接成本以外, 包括 12% 的现场管理费, 构成工地总成本, 另加 8% 的总部管理费及利润。

施工中: 工程师先后发布了几个变更令, 其中土料和砂砾料的运距及量都增加, 土料

增加量为 $40\,250\text{m}^3$ ，砂砾料增加量为 $12\,500\text{m}^3$ ，增加量的净直接费为 $3.6\text{ 美元}/\text{m}^3$ ， $4.5\text{ 美元}/\text{m}^3$ ；同时经工程师同意顺延工期 3 个月(包括工程量增加的时间)。

试问承包商可索赔费用为多少？[注：不考虑工程结算款的调价]

解：

1. 土料增加索赔费用

直接费： $3.6\text{ 美元}/\text{m}^3$

管理费： $3.6 \times 12\% = 0.43\text{ 美元}/\text{m}^3$

工地成本： $3.6 + 0.43 = 4.03\text{ 美元}/\text{m}^3$

利润及总管理费： $4.03 \times 8\% = 0.32\text{ 美元}/\text{m}^3$

合计综合单价： $4.03 + 0.32 = 4.35\text{ 美元}/\text{m}^3$

索赔额： $4.35\text{ 美元}/\text{m}^3 \times 40\,250\text{m}^3 = 175\,088\text{ 美元}$

2. 砾料增加索赔费用

直接费： $4.53\text{ 美元}/\text{m}^3$

现场管理费： $4.53 \times 42\% = 0.54\text{ 美元}/\text{m}^3$

利润及总管理费： $(4.53 + 0.54) \times 8\% = 0.41\text{ 美元}/\text{m}^3$

综合单价： $4.53 + 0.54 + 0.41 = 5.48\text{ 美元}/\text{m}^3$

索赔额： $5.48 \times 12\,500 = 68\,500\text{ 美元}$

3. 工期延长现场管理费索赔

(1) 新增工程量相当合同工期

$$\frac{18}{7\,369\,920} \times (175\,088 + 68\,500) = 0.6\text{ 个月}$$

(2) 其他原因造成工期延长 2.4 个月，则管理费为： $MF(T) = \Delta T \times \frac{F_0}{T_0}$

合同中总部管理费及利润： $7\,369\,920 \times \frac{8\%}{1+8\%} = 545\,920\text{ 美元}$

总现场管理费：

$$F_0 = (7\,369\,920 - 545\,920) \times \frac{12\%}{1+12\%} = 731\,143\text{ 美元}$$

批准现场管理费为： $2.4 \times \frac{731\,143}{18} = 97\,486\text{ 美元}$

4. 总的费用索赔额

总的费用索赔额为：

$$175\,088 + 68\,500 + 97\,486 = 341\,074\text{ 美元}$$

6.4 反 索 赔

6.4.1 概述

1. 反索赔的含义

反索赔是指一方提出索赔时,另一方对索赔要求提出反驳、反击,防止对方提出索赔,不让对方的索赔成功或全部成功,并借此机会向对方提出索赔以保护自身合法权益的管理行为。

在工程实践中,当合同一方提出索赔要求,作为另一方面对对方的索赔应作出如下的抉择:

如果对方提出的索赔依据充分,证据确凿,计算合理,则应实事求是地认可对方的索赔要求,赔偿或补偿对方的经济损失或损害,反之则应以事实为根据,以法律(合同)为准绳,反驳、拒绝对方不合理的索赔要求或索赔要求中的不合理部分,这就是反索赔。如可以全部或部分否定对方的索赔要求。

因而,反索赔不是不认可、不批准对方的索赔,而是应有理有据地反驳,拒绝对方索赔不合理的部分,进而维护自身的合法权益。

2. 反索赔的意义

在合同实施过程中,合同双方都在进行合同管理,都在寻找索赔机会。索赔事件发生后合同双方都企图推卸自己的合同责任,并向对方提出索赔。因此不能进行有效的反索赔,同样会蒙受经济损失,反索赔与索赔具有同等重要地位,其意义主要表现在以下几方面。

(1) 减少和防止损失的发生。如果不能进行有效的反索赔,不能推卸自己对于干扰事件的合同责任,则必须满足对方的索赔要求,支付赔偿费用,致使自己蒙受损失。由于合同双方利益不一致,索赔和反索赔又是一对矛盾。因而对合同双方来说,反索赔同样直接关系到工程效益的高低,反映着工程管理水平。

(2) 成功的反索赔有利于鼓舞管理人员的信心,有利于整个工程及合同的管理,提高工程管理的水平,取得在合同管理中的主动权。在工程承包中,常常有这种情况:由于不能进行有效的反索赔,一方管理者处于被动地位,工作中缩手缩脚,与对方交往诚惶诚恐,丧失主动权,这样必然会影响到自身的利益。

(3) 成功的反索赔工作不仅可以反驳、否定或全部否定对方的不合理要求,而且可以寻找索赔机会,维护自身利益。因为反索赔同样要进行合同分析、事实调查、责任分析、审查对方索赔报告。用这种方法可以摆脱被动局面,变不利为有利,使守中自固,能达到更好的索赔效果,并为自己索赔工作的顺利开展提供帮助。

3. 索赔与反索赔的关系

(1) 索赔与反索赔是完整意义上索赔管理的两个方面

即在合同管理中,既要作好索赔工作,又要作好反索赔工作,以最大限度维护自身利益。索赔表现为当事人自觉地将索赔管理作为工程及合同管理的重要组成部分,成立专门

机构认真研究索赔方法,总结索赔经验,不断提高索赔成功率,在工程实施过程中,能仔细分析合同缺陷,主动寻找索赔机会,为己方争取应得的利益;而反索赔在索赔管理策略上表现为防止被索赔,不给对方留下可以索赔的漏洞,使对方找不到索赔机会。在工程管理中体现为签署严密合理、责任明确的合同条款,并在合同实施过程中,避免己方违约。在反索赔解决过程中表现为,当对方提出索赔时,对其索赔理由予以反驳,对其索赔证据进行质疑,指出其索赔计算的问题,以达到尽量减少索赔额度,甚至完全否定对方索赔要求的目的。

(2) 索赔与反索赔是进攻与防守的关系

如果把索赔比作进攻,那么反索赔就是防御,没有积极的进攻,就没有有效的防御;同样,没有积极的防御,也就没有有效的进攻。在工程合同实施过程中,一方提出索赔,一般都会遇到对方的反索赔,对方不可能立即予以认可,索赔和反索赔都不太可能一次成功,合同当事人必须能攻善守,攻守相济,才能立于不败之地。

(3) 索赔与反索赔都是双向的,合同双方均可向对方提出索赔与反索赔

由于工程项目的复杂性,对于干扰事件常常双方都负有责任,所以索赔中有反索赔,反索赔中又有索赔。业主或承包商不仅要对方提出的索赔进行反驳,而且要防止对方对己方索赔的反驳。

6.4.2 反索赔的内容

反索赔的工作内容可包括两个方面:一是防止对方提出索赔;二是反击或反对方提出的索赔要求。

1. 防止对方提出索赔

这是一种积极防御的反索赔措施,其主要表现为以下几个方面。

(1) 认真履行合同,避免自身违约给对方留下索赔的机会。

这就要求当事人自身加强合同管理及内部管理,使对方找不到索赔的理由和依据。

(2) 出现了应由自身承担责任或风险的干扰事件时,给对方造成了额外的损失时,力争主动提出与对方协商提出补偿办法,这样作到先发制人,可能比被动等到对方向自己提出索赔对自身更有利。

(3) 在出现了双方都有责任的干扰事件时,应采取先发制人的策略,干扰事件(索赔事件)一旦发生应着手研究、收集证据。先向对方提出索赔要求,同时又准备反驳对方的索赔。这样做的作用有,可以避免超过索赔有效期而失去索赔机会,同时可使自身处于有利地位,因为对方要花时间和精力分析研究己方的索赔要求,可以打乱对方的索赔计划。再者可为最终解决索赔留下余地。因为通常在索赔的处理过程中双方都可能作让步,而先提出索赔的一方其索赔额可能较高而处在有利位置。

2. 反击对方的索赔

为了减少己方的损失必须反驳对方的索赔。反击对方的措施及注意的问题上要有以下几个方面。

(1) 利用己方的索赔来对抗对方的索赔要求,抓住对方的失误或不作为行为对抗对方的要求。如我国合同法中依据诚实信用的原则,规定了当事人双方有减损义务,即在合同

履行中发生了应由对方承担责任或风险的事件使自身有损失时,这时受损这一方应采取有效的措施使损失降低或避免损失进一步的发生,若受损方能采取措施但没有采取措施,使损失扩大了,则受损一方将失去补偿和索赔的权利,因而可以利用此原则来分析索赔方是否有这方面的行为,若有,就可对其进行反驳。

(2) 反驳对方的索赔报告,找出理由和证据,证明对方的索赔报告不符合事实情况、不符合合同规定、没有根据、计算不准确,以推卸或减轻自己的赔偿责任,使自己不受或少受损失。

(3) 在反索赔中,应当以事实为依据,以法律(合同)为准绳,实事求是地有理有据地认可对方合理的索赔,反驳拒绝对方不合理的索赔,按照公平、诚信的原则解决索赔问题。

6.4.3 反索赔的程序与报告

1. 反索赔程序

与索赔一样,反索赔要取得成功也应坚持一定的工作程序认真分析对方的索赔报告,否则不可能成功。反索赔的一般工作程序如图 6.9 所示。

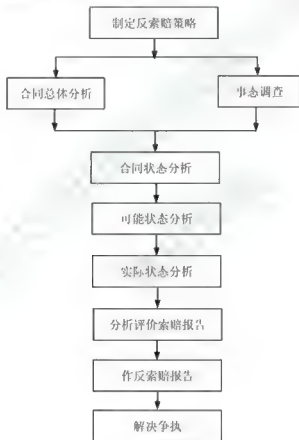


图 6.9 反索赔步骤

1) 制订反索赔策略和计划

这就要求反索赔一方应加强工程管理与合同分析,并利用以往的经验,对对方在哪些

地方、哪些事件可能提出索赔进行预测,制定相应的应急反索赔计划,一旦对方提出索赔要求后,结合实际的索赔要求以及反索赔的应急计划来制定本次反索赔的详细计划和方法。

2) 合同总体分析

要对索赔事件产生的原因进行合同分析,索赔是否符合合同约定、法律法规及交易习惯。同时通过对这些索赔依据的分析,寻找出对方不利的条款或相关规定,使对方的要求无立足之地。

3) 索赔事件调查与取证

反索赔的处理中,应以各种实际工程资料作为证据,用以对照索赔报告所描述的事情经过和所附证据。通过调查可以确定干扰事件的起因、事件经过、持续时间、影响范围等真实详细的情况,以反驳不真实、不肯定、没有证据的索赔事件。

在此应收集整理所有与反索赔相关的工程资料。

4) 三种状态的分析

在上述调查取证分析的基础上进行合同状态、可能状态和实际状态的分析与计算,以便确定对方应得到的索赔值和己方反驳的底线。

5) 索赔报告的反驳与分析

在 3)、4) 两步的工作基础上,对对方的索赔报告进行反驳和分析,指出其不合理的地方。

对方索赔报告的反驳核查,可以从以下几个方面进行。

(1) 索赔要求或报告的时限性。审查对方在干扰事件发生后,是否在合同规定的索赔时限内提出了索赔要求或报告,如果对方未能及时提出书面的索赔要求和报告,则将失去索赔的机会和权利,对方提出的索赔则不能成立。

(2) 索赔事件的真实性。索赔事件必须是真实可靠的,符合工程实际状况,不真实、不肯定或仅是猜测甚至无中生有的事件不能提出索赔,索赔当然也就不能成立。

(3) 干扰事件原因、责任分析。如果事件责任是由于索赔者自己疏忽人意、管理不善、决策失误或因其自身应承担的风险等造成,则应由对方自己承担损失,对方的索赔不能成立。如果合同双方都有责任,则应按各自的责任大小分担损失。只有确属是自己一方的责任时,对方的索赔才能成立。

(4) 索赔理由分析。索赔理由分析,就是分析对方的索赔要求是否与合同条款或有关法规一致,是否符合工程交易习惯,所受损失是否属于应由对方负责的原因所造成。即应分析对方索赔的依据是否充分,否则就可以否定对方的索赔要求。

(5) 索赔证据分析。索赔证据分析,就是分析对方所提供的证据是否真实、有效、合法,是否能证明索赔要求成立。证据不足、不全、不当、没有法律证明效力或没有证据,索赔是不能成立的。

(6) 索赔值的审核。对于对方合理的索赔,应对其索赔值进行审核,防止对方夸大计算。此时审核的重点主要有以下几点。

① 各数据的准确性。对索赔报告中所涉及到的各个计算基础数据都须作审查、核对,以找出其中的错误和不恰当的地方。

② 计算方法的合理性。索赔通常都用分项法计算,但不同的计算方法对计算结果影响很大。在实际工程中,这方面争执常常很人,对于重大的索赔,须经过双方协商谈判才能

对计算方法达成一致,特别对于总部管理费的分摊方法,工期拖延的费用索赔计算方法等。

③ 计算本身是否正确。主要审核计算中计算的数值、小数点及单位是否有误。若最终结果的小数点错一位,那么会使反索赔前功尽弃。

6) 起草并提交反索赔报告

2. 反索赔报告

反索赔报告是对反索赔工作的总结,向对方(索赔者)表明自己的分析结果、立场,对索赔要求的处理意见以及反索赔的证据。根据索赔事件性质,索赔值的大小、复杂程度及对索赔认可程度的不同,反索赔报告的内容不同,其形式也不一样。目前对反索赔报告没有一个统一的格式。但作为一份反索赔报告应包括以下内容。

(1) 向索赔方的致函。在这份信函中表明反索赔方的态度和立场,提出解决双方有关索赔问题的意见或安排等。

(2) 合同责任的分析。这里对合同作总体分析,主要分析合同的法律基础、合同语言、合同文件及变更、合同价格、工程范围、工程变更补偿条件、施工工期的规定及延长的条件、合同违约责任、争执的解决规定等。

(3) 合同实施情况简述和评价。主要包括合同状态、可能状态、实际状态的分析。这里重点针对对方索赔报告中的问题和干扰事件,叙述事实情况,应包括三种状态的分析结果,对双方合同的履行情况和工程实施情况作评价。

(4) 对对方索赔报告的分析。主要分析对方索赔的理由是否充分,证据是否可靠可信,索赔值是否合理,指出其不合理的地方,同时表明反索赔方处理的意见与态度。

(5) 反索赔的意见和结论。

(6) 各种附件。主要包括反索赔方提出反索赔的各种证据资料等。

6.5 索赔(反索赔)案例

6.5.1 国内工程施工索赔(反索赔)案例

索赔起因,错综复杂

1993年4月4日,中建一局四公司副总经济师陆富才专程从北京飞往上海,到上海市建设(现改名建纬)律师事务所拜访素不相识的朱树英律师,聘请朱律师到北京去承办一个复杂而标的巨大的拖欠工程款索赔案子。

案情错综而复杂

一局四公司于1988年2月14日与北京新万寿宾馆有限公司(下称新万寿宾馆)签订了建筑工程承包合同,合同规定:一局四公司承建新万寿宾馆,建筑面积36 015平方米,1988年2月15日开工,1990年2月15日竣工。承包总价为2227.5万美元,其中500万美元折合人民币给付。

工程于1990年8月15日竣工交付使用后,新万寿宾馆拖欠工程尾款161.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币,合计168.8万美元、106万人民币;此外还有应

签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万元。

一局四公司催讨这笔巨额拖欠款先后花了两年的时间，无数次函、派人上门催讨，先后找过中国建筑工程总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、建设部等各级政府主管部门，均无效果。

面对如此复杂而困难重重的案情，朱律师并没有畏难或推托的表示，只是平静地问了一句：“那么，我们自己有什么欠缺，或者说对方为什么不付款呢？”

“对方最主要的理由有两条，一是说我方延误工期。工期确实比合同晚了半年，但施工中遇到‘6·4动乱’，而且我们有充分的理由；二是说工程质量有问题，突出的是‘红水’问题，即宾馆水管放出的水含铁锈，但这个问题的责任在甲方，我们也有足够的证据。”

陆富才告诉朱律师，在作了各种努力都无法解决争议的情况下，一局四公司唯一的选择只能是通过法律手段来保护企业的利益。陆富才还告知，一局四公司在北京有常年法律顾问，对选择律师已经作了权衡和比较。他希望朱律师万勿推辞，如果答应接案，一局四公司立即可以作决定。

朱律师从陆总带来的一大堆材料中找出了工程合同。合同第二十五条规定：“有关本合同的争论，或发生的索赔赔偿，或违反本合同的事项，当无法在互相协商的基础上求得解决时，甲、乙任何一方均可提请在北京的中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会仲裁，双方执行该委员会的仲裁。”看到这样的规定，朱树英的眉头又一紧。这无疑在本案的程序问题上又增加了新的复杂性，新万寿宾馆虽为中外合资企业，但属于中国法人。中国法人之间能否适用涉外仲裁？即使贸促会受理仲裁，裁决决定法院是否会执行？

这个案件的办案困难和复杂程度都显而易见，但朱树英仍然当即决定受理。

先易后难：拖欠索赔款分段起诉

1993年4月10日晚，朱树英飞抵北京。

第二天，朱树英和一局四公司的陆总及有关人员研究案情和案件材料，确定对策。朱律师很快提出了一个完整的方案。

(一) 解决纠纷的程序问题，即能否仲裁，仲裁决定能否执行，仲裁条款法院能否受理，这一系列问题由律师负责解决。

(二) 案件涉及两个不同性质的诉讼请求，第一部分是拖欠的工程款包括已经签证的部分，属于返还之诉。这部分情况相对比较简单，要求一局四公司迅速整理出有关证据，而应签证而未获签证的索赔款，属于确认之诉，需要有足够、完整的证据材料，这是相当复杂而困难的工作，要求公司就每一项索赔提供详细的原始材料。

(三) 先易后难，起诉分段进行。第一部分尽快起诉，第二部分在证据搜集充分后以补充诉讼请求方式提出。

(四) 认真分析被告可能提出的答辩理由，提前做好证据的准备工作，对被告可能提出的反诉请求，事先做好对策。

(五) 在正式起诉前，由一局四公司向朱律师出具全权委托书，由律师出面对方当事人起诉前协商解决争议的最后努力。

一局四公司完全同意律师提出的方针和对策。案件的起诉准备工作有条不紊。

4月12日，由一局四公司盖章、法定代表人袁宗旺签名的全权委托书给了朱律师明确

的授权:

“自 1993 年 4 月 12 日起,本公司将有关新万寿宾馆工程款事宜全权委托上海市建设律师事务所朱树英律师处理,律师有权根据法律在授权范围内采取一切必要的措施。”

朱树英凭此委托书,以律师事务所的名义及时向新万寿宾馆发出了要求限期还款的律师公函。

经与中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会、北京市中级人民法院、北京市高级人民法院、国家最高人民法院联系后了解到:贸促会仲裁委员会可以受理本案,但不能保证裁决结果能够由北京市中级人民法院协助执行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十七条第一款第二项之规定,北京市中级人民法院将不予执行两个中国法人之间的涉外裁决决定。同时,根据本案的具体情况,北京市中级人民法院的态度是:如果当事人向法院起诉,法院可能受理。与此同时,一局四公司经过初步整理,已经把第一部分诉讼的证据搜集齐全,第二部分索赔款一共有 167 项,正在加紧搜集、整理证据。

4 月 16 日,新万寿宾馆向一局四公司复函,措辞严厉。函称:“贵我双方都应以求同存异的态度和实事求是的精神寻求可以导致问题最终解决的切实可行的出路和办法,任何诉诸法律的手法都是不明智的、武断的,对事情的合理解决不会带来积极的影响和任何益处。贵方在此问题上采取何种态度,我方无权干涉。但我方愿在此重申,任何与事实相悖的一厢情愿都是不可能实现的。如果问题因此而变得复杂的话,我方不承担任何责任,贵方要通过法律程序解决此问题,我方无异议。”

复函中所说的“问题最终解决的切实可能的出路和方法”,是指对方在 1993 年 4 月 1 日在一份函件中提出的归还拖欠工程款 168.21 万美元和 106 万元人民币的分三年六期的还款计划。此计划不涉及巨额索赔款。

对方的态度和解决方案均为一局四公司所绝对不能接受。唯一的办法只有提起诉讼了。

1993 年 5 月 15 日,原告一局四公司向北京市中级人民法院提起诉讼,要求新万寿宾馆付款拖欠工程款 168.18 万美元、106 万元人民币,支付利息 41.28 万美元、36.22 万元人民币。按当时美元和人民币的比价,共计折合人民币约 1300 万元。

原告确定由朱树英律师和陆富才副总经济师担任诉讼代理人,并确定代理方式为特别授权的全权代理,代理人有权决定本案诉讼的一切事宜。

1993 年 7 月 14 日,原告再次向北京市中级人民法院增加诉讼请求,要求法院确认并判令被告支付工程增加款计美元 82.73 万元、人民币 423.02 万元,按当时美元和人民币的比价,合计折合人民币 880 万元。补充的诉讼请求附“增加工程款一览表”,共有索赔项目 102 项。原告的诉讼请求和补充诉讼请求共计折合人民币约 2200 万元。

在案件起诉准备阶段,朱树英先后两次到北京和一局四公司,同有关人员就本案的证据搜集工作和涉及的工程签证和索赔问题统一认识,统一工作步骤,并为此举办了专题讲座。

朱律师认为,工程签证和索赔是两个既有区别又相互联系的不同概念。工程签证是工程合同承包双方在施工过程中,按合同约定对支付有关费用、顺延工期、赔偿损失所达成的表示双方意见一致的补充协议,经书面确认的工程签证即可成为工程结算或最终增减工程造价的依据。追索工程签证款项在法律上是所有权已经确定的返还之诉,而工程索

赔则是工程合同承包双方中的任何一方因未能获得按合同约定支付的有关费用,顺延工期、赔偿损失的书面确认,因而在约定的期限内向对方提出赔偿请求的一种权利。这种权利在未获得对方确认之前,不能作为工程结算的依据。索赔的权利,在法律上是需要得到确认的、所有权尚未明确的确认之诉。

朱律师强调,本案提出的补充诉讼请求即工程索赔成败的关键完全看证据。因此,案件全部工作的重点在于整理、搜集使索赔能够成立的证据。

一局四公司虽然在新万寿宾馆施工中有严格的、一流的基础资料管理工作,但也存在着某些缺陷。在原告提出补充诉讼请求时,最初的索赔项目共有167项,经朱律师的分析、审查,认为65项缺乏证据不能成立。原先提出索赔项目的第1至第40项全部无法提出,原因是违反了合同规定的时效。原来,原、被告签订的《新万寿宾馆建筑安装工程施工合同书》第二十条“设计与设计变更”第3款规定:“由于本工程采用按初步设计图纸及说明书标准、固定总价一次包死的承包办法,因此甲方坚持按初步设计标准。乙方在收到施工图及说明书经交底后15天内,如对其所示工程标准有不同意见时,应用书面方式向甲方提出。逾期不提出书面意见,即认为该施工图及说明书设计标准符合初步设计标准。”索赔项目的前40项全部涉及到施工图与初步设计图纸在工程结构施工的差异,而现有的资料中找不出原告在收到施工图后15天内提出的书面异议或有关的证据。因此,根据工程索赔对于证据的基本要求,这40项索赔项目无法确立、无法提出主张。

朱律师要求,一局四公司的有关人员要在现有的、能够成立的索赔项目搜集、整理完整的证据材料的基础上,尽最大努力使之达成经得起检验的程度。搜集、分析、整理索赔项目的证据,是案件全部工作的重点。公司要统一部署,调集有关本案的所有原始材料,分门别类,专人负责。一局四公司完全采纳了律师的意见和要求,组成以睦富才为首的、由原承建工程施工的项目经理等人参加的证据整理小组,按索赔得以成立的要求整理提供证据。

一局四公司先后两次提出诉讼请求,一易一难的案情以及被告主体的高层次的诉讼活动,立即引起了受理案件的北京市中级人民法院的高度重视。案件立案时,法院原本已经确定了承办法官,后来调整为由经验丰富、理论功底深厚的崔学锋法官负责审理。经法院审查,本案符合立案条件,并将起诉状副本送达了被告。按我国《民事诉讼法》的规定,该案进入了规范而严格的诉讼程序。

针锋相对,被告反诉请求赔偿

新万寿宾馆方面已经作出了原告起诉的准备,对应诉也制定了对策。收到原告的起诉状副本后,被告委托了北京君和律师事务所的资深律师王亚东担任诉讼代理人。王亚东律师工作认真负责、经验丰富,在北京知名度很高,曾办理许多在京城有重大影响的案件。

1993年7月23日,被告新万寿宾馆作出书面答辩。针对原告的起诉,被告认为未交付剩余的工程款是因为“至今不具备支付条件”。理由有二:其一,被告认为“增项、减项部分如何计算,双方仍有异议”、双方在这些项目中虽有交涉,但“至今未达成一致意见,故涉及此方面款项是无法支付的。”其二,原告未按合同规定向被告交付有关资料。被告认为,原告未按合同规定履行交付竣工验收资料、进口设备附件及有关资料,据此,被告认为剩余工程款的支付还缺少必备条件。但被告没有就原告提出的支付数额和利息提

出异议。

被告在答辩状中仍以延误工期为由提出反诉。答辩状称：“合同规定的竣工时间是1990年2月15日。1989年12月28日，答辩人根据被答辩人延长工期的书面申诉，答复同意顺延工期3个月，即1990年5月15日为竣工日期。而被答复人实际竣工期为1990年11月25日，延误工期194天，合同第十八条工程奖罚第2条规定，‘因乙方原因工期逾期，乙方按对等比例付出罚金，即每天罚款为合同总额的万分之二，以人民币交纳。’第3条规定：‘罚金金额总数不超过合同总金额的百分之三，即66.5万美元。’按以上规定，被答辩人应支付罚金66.5万美元。答辩人对被答辩人应支付的以上罚金提出反诉请求。”

被告不仅在书面答辩中提出针锋相对的反诉请求，而且还以宾馆水锈严重影响正常营业为理由，向法院提出到宾馆实地考察的要求。

承办法官来到了地处首都机场附近将台路的高层四星级新万寿宾馆，在现场的确看到了宾馆的水管放出的水是含锈的红水。据被告介绍，由于本工程的一切材料、设备的供应及安装均包含在合同范围内，宾馆热交换器的质量问题导致水管锈蚀的责任应由负责总承包施工的原被告负责。被告还介绍，因为新万寿宾馆“有名”的红水问题，使许多客户不愿住宿，严重影响了宾馆的正常营业。

在原告诉起之后，朱树英就不断与法院保持电话联系。当了解到被告正在洽谈宾馆产权转让时，原告又于1993年5月22日向法院提出书面申请：“因被告正在着手转让新万寿宾馆产权的洽谈，为保证判决结果的顺利执行，根据民事诉讼法第92条之规定，原告请求法院对被告的财产采取保全措施，通知冻结被告开户银行，在诉讼期间被告不得实施转让或变卖大楼。”据朱树英分析，被告拖欠巨额工程款并非是有钱而不付，很可能是确实无力支付。现在，被告正在与第三方洽谈大楼转让事宜，对解决本案未必是坏事，只要转让洽谈成功，被告支付我方的钱款也落到了实处，因此，原告并未向法院正式办理保全手续和担保手续，只是要求法院通知被告银行，在诉讼期间不得实施转让行为，法院也接受了原告的要求，因为法院也认为诉讼期间不能改变涉及诉讼请求的标的物的所有权的状态。

在朱律师又一次与法官电话联系时，崔学锋法官问：“我在新万寿宾馆现场看到水管放出的水锈，而热交换器是由你方负责采购和安装的。现在被告提出这完全是你方的责任，对此你们怎样解释？”

“我们对这个问题已经准备了充分的证据。事实并非如被告所说的那样。在开庭时，如果被告提出这个问题，我们能够作出负责的解释。”朱律师回答。

“请问，法院对本案预计什么时候开庭？”

“我们正在研究，预计很快会组织开庭。至少会先组织双方调解一次。”

不久，原告接到通知，法院定于1993年9月17日上午9点开庭审理本案。

突出重点，全面完成举证工作

开庭之前，朱树英又一次来到北京。

一局四公司的证据整理小组经过1个多月的清理，把102项索赔项目的全部证据材料都准备得十分齐全。

看着这些有总有分、分门别类的原始证据材料，朱树英不由肃然起敬。

新万寿宾馆工程是一个建筑面积达36 015平方米的四星级宾馆，以合同工期交钥匙的

总承包方式,由一局四公司承建全部建筑安装工程,日本国鹿建设株式会社国际事业本部、北京华盛建筑开发公司联合进行施工监理。整个工程采取边设计边施工边修改的“三边”方式施工。工程在1988年2月15日开工前,建设单位只能提供初步设计和基础以下部分的施工图,地面施工图纸要等一局四公司将进口设备定型并提供资料后3个月才能供齐。但合同规定的总工期只有14个月,并且不考虑分批提供施工图对工期的影响。

这是一个工期紧、责任重的高难工程。在施工过程中,又遇1989年的政治动乱,施工受到严重影响,一局四公司在困难的情况下,不仅在1990年8月15日将工程交付建设单位使用,而且确保了工程质量,新万寿宾馆工程被北京市建设工程质量监督总站评为高优工程和北京市优质工程。

更难能可贵的是,一局四公司在高速优质完成新万寿宾馆工程施工的同时,资料管理工作也体现了与国际接轨的高水平。工程施工过程中实行每周例会制度,建设单位、监理单位、施工单位派代表参加。114次例会纪要的原始书面资料共344页,全部保存完整,而且字迹清晰,很少涂改,真实地再现了工程施工的全过程。这厚厚三大本由与会各方代表签字的例会纪要成为本案的重要证据来源。

此外,一局四公司还详细保存了整个施工过程中收受建设单位分批提供的所有施工图纸和设计修改图纸的原始记录及工程洽商记录。双方来往的全部来函、文件、专题会议纪要等书面资料。

因有这样完整的原始资料,一局四公司的资料整理人员根据律师的要求,将102项索赔项目、分别分为初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、建设单位的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录,增加费用或支出的原始合同、单证以及实物照片等类书面证据,有力地证明了索赔的成立。

一局四公司于1993年8月23日,又将第二批证据材料送交法院。这些材料包括全部索赔项目的证据和有关法规以及利息计算依据和明细共17卷计737页,连同第一批送交法院的资料,堆放的高度有1公尺。

在向法院递交了全部索赔项目的证据后,朱树英又提出,在开庭之前的工作重点要转移到反索赔的证据搜集整理,要针对被告提出的反诉赔偿的事实和理由,准备相应的答辩意见和证据材料。这些准备工作,为原告在整个案件的开庭审理中占据主动创造了条件。

1993年9月6日,朱树英再次飞抵北京。

9月7日,北京市中级人民法院借用一局四公司的会议室,组织原、被告双方以及代理律师参加的调解开庭。法官告知,鉴于双方曾多次自行协商调解,有调解解决本案的可能,因此在正式开庭审理之前,先由法院主持调解。因为本案工程大,诉讼标的也大,建议双方从大处着眼,算大帐,不要纠缠于具体细节。

原、被告双方都表示接受法院的调解。

调解庭整整开了一天。

原告方面依据充分的证据材料,一步一步摆事实、举证据,要求被告支付工程欠款和全部索赔款。而被告只同意支付工程欠款,以工期拖延和质量问题为由不同意支付索赔款。工期和质量问题成为双方争执的焦点,关键在于证据。

那么证据能够证明什么呢?

工期延误，全案被告造成

被告以原告延误工期为由提出反索赔 66.5 万美元的事实和理由是，合同规定工期自 1988 年 2 月 15 日至 1990 年 2 月 15 日。施工过程中，双方于 1989 年 12 月 28 日达成一致意见，同意工期顺延 3 个月，即 1990 年 5 月 15 日为竣工期。而原告实际竣工期为 1990 年 11 月 25 日，延误工期 194 天。按工程合同第十八条“工程奖罚”第 2 款规定，“因乙方(指原告)工期逾期，乙方按对等比例付出罚金，即每天罚款为合同总金额的万分之二，以人民币交纳。”合同第十八条第 3 款规定，“罚金金额总数不得超过合同总金额的百分之三，即 66.5 万美元。”据此，被告认为反索赔请求的证据是充分的、合法的。

原告认为被告的主张和理由根本不能成立。新万寿宾馆的工期延误，完全是因为被告严重违反合同规定而造成。

原告首先提出，工程实际竣工期不是 1990 年 11 月 25 日，而是 8 月 15 日，并举出了有关证据。

原告曾于 1990 年 8 月 15 日提出书面竣工报告，并交付被告验收。被告在竣工报告单上签字认可的时间是 8 月 15 日。当日，建设单位、监理单位、施工单位三方共计 14 人参加最后一次每周例会，会议纪要表明，工程竣工验收工作已安排总体道路，8 月底宾馆要配合亚运会试营业。同年 8 月 25 日，双方签署“建筑工程保修证书”。8 月 30 日宾馆开始试营业。原告向被告提出两个问题，如果现在要把竣工日期定于 1990 年 11 月 25 日，那么，宾馆从 8 月 30 日开始试营业、正式接待国内外宾客应如何解释？是谁授权允许被告在工程尚未竣工交付使用时就对外营业？

原告继续举证证明工程延误的原因是被告严重违反合同规定，没有履行自己应尽的义务而造成，这些证据一共有 11 个方面。

(一) 被告共有 9 次未按合同规定的期限拖延支付各阶段的工程款。

(二) 被告未按合同完成“三通一平”工作，施工临时供电直到开工后 49 天的 1988 年 4 月 6 日才正式接通。

(三) 被告提供 ± 0.00 楼板的施工图出图拖延 4 个月，施工停工待图，有 14 次每周例会纪要对此有原始记录。

(四) 合同规定工程地上建筑应于 1988 年 6 月 10 日开始施工，但被告办理的“地面工程开工审批表”到 1988 年 8 月 16 日才办妥手续。

(五) 被告提供的宾馆裙房及主楼的精装修图纸拖延 287 天，直到 1988 年 9 月 14 日才确定，严重影响该部分勤务员的正常施工。

(六) 因宾馆第一、二、十七层的机电管道标高设计错误，管道在吊顶之下无法施工，过 350 天才改正设计。

(七) 由被告供应的 487 套客房床头柜严重拖期，直到 1990 年 8 月 8 日还缺第 17 层客房所需部分，因床头柜内应安装客房内的全部电气 6 个控制系统，因此造成整个工程无法正常安装施工。

(八) 宾馆厨房部分最后设计出图拖期，图纸反复修改，直到 1990 年 5 月 16 日被告还要求厨房吊顶修改为入吊顶。

(九) 宾馆中央自控系统设计方案和技术参数，被告直到 1990 年 7 月 6 日才确定，严重影响工期。

(十) 被告单方面将工程合同中的自行车棚修改为抗震8级设防的宾馆附属用房, 应增加合同工期152天。

(十一) 双方协商一致工期延至1990年5月15日, 但此后被告还提出设计修改达70次, 原告提供了两份全面记录这70次设计修改的全部原始资料。

原告为证明工程的工期延误全系被告违约所造成, 举出了36份证据, 证明被告违约的上述11方面问题的客观存在。面对原告在被告据以反索赔的主要理由上的如此完整和充分的证据, 被告还有什么话好说呢?

水管锈蚀, 被告一意孤行所致

在本案审理过程中, 法官对全案印象最深刻的是宾馆“红水”问题。

被告在宾馆交付使用半年后, 就于1991年4月11日和1991年9月10日先后两次向原告发函, 提出8台热交换器因喷铜工艺不过关, 造成锈蚀红水现象的严重问题。因此, 热交换器和红水问题自然又成为原、被告对工程质量问题争论的主要焦点。

被告认为, 按合同第十五条约定: 合同要求原告供应国内优质产品。现由于热交换器的水管锈蚀造成红水, 其责任应由原告承担。

而原告却举出一系列的原始证据, 证明红水问题是因为设计单位和被告不听劝告、一意孤行所致。

根据原、被告工程合同的规定, 原告采购的设备必须按照施工图及说明书的设计要求, 本工程设计单位在设计要求上规定热交换器选用的标准图图已作成标准图。原告发现设计不合理, 即于1989年4月22日向被告提出书面请求, 建议采用新标准图。但设计院坚持采用原设计, 并为建设单位和监理单位所同意。

在建议未被采纳的情况下, 原告按工程合同的规定, 通过北京市设备成套局安排, 组织被告、中外监理单位和设计院共同到设计指定的北京市向阳环保设备厂进行考察。经被告、设计院和监理单位于1989年7月11日开会研究获得一致意见后, 向原告发来书面的《关于设备研究结果通知书》, 决定“有条件”地认可采用北京向阳厂产品。该通知书明确通知: “收到贵公司(指原告)1989年4月22日发来的关于设备请予研究的通知, 及6月17日到北京向阳厂参观, 经我们研究, 结果如下: 有条件认可。”

条件是设计院提出的, 共有5条。“第一条为, 热交换器内壁的铜喷涂0.3厚, 喷涂时存在不均匀, 为安全起见, 改为0.5厚。”通知书有设计院、监理单位有关人员和被告筹建处负责人的签名, 被告负责人的签名处还签了一段意见, “按7月11日会议记录, 浅海先生(指日方监理负责人)已与李工、季工、瞿工研究, 采用北京向阳环保设备厂设备, 在技术上没有问题, 请按李工第1条意见办”。

在经过严密的确认程序后, 原告按要求采用北京向阳环保设备厂生产的热交换器, 但是设备在投入运行半年之后就出现了红色锈水, 几经寻找, 最后查出原因是热交换器容器内壁喷铜表面剥落, 造成锈蚀。

根据上述事实 and 证据, 原告认为, 设计单位的意见代表了建设单位的意见。原告事先已明确要求采用新标准图, 而被告不听建议, 一意孤行听信错误设计, 造成现在的局面。原告在设备造型问题上必须服从设计要求是合同规定的, 不听原告劝阻执意选用作废的热交换器的型号及标准图是被告确定的, 说技术方面没有问题是被被告和监理、设计单位共同认定的。现在, 实践已经证明宾馆红水是由被告选定设备的工艺落后造成的质量问题, 这

怎能怪罪原告?怎能由原告来承担责任?

调解庭还涉及到其他的矛盾和争议,但在原告方面井井有条、丝丝入扣的大堆证据面前,辩论似乎是多余的。

调解庭虽然没有结果,但原告在法庭上占据了主动,这一点各方面都不持异议。

管理过硬,更能体现专业见长

此后,原告的证据整理小组有条有理地将开庭时涉及的所有问题整理了厚厚一叠有关的证据。

朱树英在离京返沪之前,又和一局四公司睦富才和其他有关人员再次开会,讨论案件的下步工作安排的做好正式开庭的准备工作。鉴于法官提出的国庆节前开庭的初步意见,决定了二条:

(一)整理反索赔问题的原始证据的工作,在9月23日之前送交法院。

(二)朱树英于9月22日左右再到北京作审核证据和开庭准备。

原告的行动一步紧似一步。9月22日,朱树英按时来到北京。9月23日,原告按时将有关反索赔的第三批证据送到法院。

此时,被告对案件的态度却发生了重要的变化。崔学锋法官转告了被告方面的意见:为表示解决问题的诚意,可在问题未解决之前先支付50万美元;同意支付所有的工程欠款,利息按合同规定从1990年8月15日计算;增加工程款部分,当时没有签证的,只要是客观存在的,可协商支付。质量有问题的设备由原告负责调换,设备购置费用可以协商;工期延误期限可减少到3个月。

法官建议,在国庆节前再调解两次,同时提请原告认真考虑具体方案,要求原告也作出相应的姿态,促使调解成功。

得知被告的态度和要求,原告的公司领导和证据整理小组的同志群情振奋,两年半悬而未决的、可以完全纳入公司纯利润的新万寿宾馆工程拖欠款的彻底解决,终于有了转机 and 希望。

经过深入研究,原告一局四公司也调整了诉讼策略,确定了调解让步的范围和步骤。

在法院主持下,9月29日,在又一次调解中,原被告双方终于达成如下调解协议:

(一)新万寿公司于本调解书送达后十日内给付中建一局四公司工程款,美元1439118元,人民币5019105元,利息美元176947元、人民币528295元。

(二)中建一局四公司负责更换整流器并解决有关技术问题;负责使冷冻机正常运转,由新万寿公司购置热交换器,一局四公司负责免费拆装。

9月29日晚,朱树英如释重负飞回上海。

1993年10月8日,北京市中级人民法院下发(1993)中经初字第453号《民事调解书》。同年12月18日,被告按调解书的规定付清了全部款项,原告也按调解书的约定,免费拆装了8台热交换器。

追欠索赔款是一个专业法律问题,新万寿宾馆工程追欠索赔款的成功,一个重要的原因是找了一位懂行的专业律师。这一经验也值得所有准备拿起法律武器、保护自身合法权益的施工企业认真汲取。

同时,“中国建筑第一案”的前因后果均以事实雄辩地证明,只有注重企业内部的专业管理、同时注重法律手段的娴熟运用,施工企业才能从巨额工程款拖欠的困境中解脱出

来,才能在激烈竞争的市场环境中求得稳步、健康、长足的发展。

6.5.2 国际工程施工索赔(反索赔)案例

多工程项目工期延误的费用综合索赔

×××公司承建的某国建设部项目工期延误的费用索赔

索赔背景

××公司先后承建了×国建设部的十月六日城1000套住宅、十月六日城3000套住宅、萨达特城4000套住宅、萨达特城2000套住宅、萨达特城第二区工程、玛丽娜旅游村等六项工程。由于非承包商的原因,工期均有不同程度的延误,给××公司带来了巨大的额外损失。××公司以前的索赔,只是一些变更单项的索赔,而对工程延误引起的费用索赔,却很少进行,特别是对同一个业主的多工程的索赔更缺乏经验,因此,××公司聘请了英国高级律师参与此项索赔工作。

截止到1992年元月,××公司承建的×国建设部项目除十月六日城3000套住宅工程中的990套住宅和萨达特城第二区工程外,其余工程均已完工。由于××公司在萨达特城第二区工程中产生了亏损,要减少亏损,必须减少合同额,但是又没有充分的合同依据。于是,××公司通过全面布局,综合考虑,利用同一业主(×国建设部)的其他工程延误的费用索赔作为突破口,以求索赔额外损失来达到减少萨达特城第二区工程合同工作量的目标。

索赔过程

承包商向业主提出的工程延期的费用索赔报告如下:

1. 引言

××公司在十月六日城成功地完成了最早的1000套经济住宅工程,并在此基础上又承建了十月六日城3000套住宅工程、萨达特城4000套住宅工程、萨达特城2000套住宅工程。另外,承建了萨达特城第二区工程,在阿拉曼地区承建了玛丽娜旅游村工程。在这些合同实施过程中,由于非××公司的过失,工期严重拖延,使××公司遭受了重大损失。业主已经同意××公司延长工期,但对延期后实施这些工程所蒙受的损失至今没有任何补偿。××公司现提交关于工期延误费用索赔的报告,并不是想得到利润的补偿,而只是想得到实际施工中因工期延误而发生的额外支出。本索赔报告均以英镑(LE)为计算单位,所发生的美元部分费用,按1美元=3.33英镑兑换率计算。本索赔报告在计算利息时,按当地银行贷款平均年利率18%计算。

2. 工期延误

合同履行中工期延误情况见表6-6。

表 6-6 工期延误情况表

工程名称	合同完工日期	延期后的完工日期	延期天数
十月六日城 3000 套住宅工程	1991.1.22	1993.4.4	802
萨达特城 4000 套住宅工程	1989.7.7	1990.7.7 1991.6.15 1991.12.2	365 709 879
萨达特城 2000 套住宅工程	1990.2.16	1991.3.20 1991.10.12	397 618
萨达特城 第一工程	1989.9.21	1990.6.30 1992.10.13	314 1118
玛丽娜旅游村工程	1990.2.15	1990.6.30 1991.4.30	135 439

3. 索赔概述

截止 1992 年元月, ×× 公司因工期延误而产生的费用损失总额为 3439.658 9 万埃镑, 其费用构成见表 6-7。

表 6-7 损失费用构成

费用项目	金额(埃镑/万)
1. 人员来往机票费	273.823 0
2. 保函延期费	309.939 7
3. 劳动证、居住证办理延期费	19.348 3
4. 拖欠工程款利息	293.115 9
5. 防火、防盗保险费	30 094 4
6. 人工费上涨	674.657 5
7. 行政管理费增加	938.228 4
8. 材料费上涨	427.041 8
9. 埃镑贬值	244.915 8
10. 机械设备折旧	227.894 1
总计	3439 058 9

4. 索赔内容及计算

1) 人员来往机票费

由于施工日期延误, ×× 公司为完成剩余工程, 必须从其国内招来新的人员, 人员的来往机票, 增加了额外的开支, 其费用计算见表 6-8。

表 6-8 人员往来费索赔

工程名称	新来人数	每人来往机票费	人员来往票费 (LE) /万
①	②	③	④=②×③
十月六日城	70	单程机票费为	36.210 0
3000 套住宅工程	74	4015LE, 来往费用=4015	59.422 0
萨达特城	31	×2=8030LE	24.893 0
2000 套住宅工程	122		97.966 0
萨达特城第三区工程	44		35.332 0
玛丽娜旅游村工程			
合计	341		273.823 0

2) 保函延期费用

由于工期延误, ××公司为工程出具的履约保函必须相应延期, 用于工程施工的进口机械设备保函同样也须延期, 其产生的额外费用有:

(1) 履约保函保证金利息损失。××公司要求银行出具履约保函, ××银行要求××公司提供保函额度的 25% 的无息抵押金。工期延长, 抵押金无息期限延长, 使××公司受到额外的利息损失。履约保函金额为工程合同额的 5%。

(2) 履约保函和机械保函的延期费损失。工期延长, 履约保函和机械保函有效期必须相应延长。按当地有关规定, 保函有效期为一年, 每年必须延期一次。延期保函在银行、海关等部门要发生一系列延期手续费。

(3) 机械保函期所上交关税的费用损失。在每次机械保函延期时, 海关规定必须上交海关关税, 金额为机械设备保函金额的 20%。这样, 使××公司发生额外支出。

十月六日城 3000 套住宅:

合同金额 2028.633 5 万英镑, 履约保函金额 101.436 万英镑(20 286 335 × 5%), 机械设
备保函金额为 46.838 8 万英镑, 详见表 6-9。

表 6-9 机械设备保函费

序号	保函号	保函金额
1	86-63	4750USD
2	13224	67 100USD
3	86-73	37 225USD
4	880192	81 500LE
5	90-145	23 668LE
合计		468 388LE(1USD=3 33LE)

损失费用计算:

(1) 履约保函保证金利息:

$$1\ 014\ 316 \times 25\% \times 18\% \times (802 \div 356) = 10.028\ 2 \text{ 万英镑}$$

(工程延期 802 天, 年利率为 18%)

(2) 履约保函和机械设备保函延期费用:

从 1991 年 1 月到 1991 年 12 月, 实际发生保函延期费用为:

$$5668\text{LE}+14\,380\text{USD}=53\,553\text{ 英镑}$$

(原报告详细列出每次保函延期的日期、账号和费用, 这里从略)

预计到 1993 年 4 月还将发生 10.710 9 万英镑。

工期延误后共发生保函延期费 16.066 2 万英镑。

(3) 机械设备上保函延期时上交的关税损失:

工程延期 802 天, 机械设备每年延期一次, 共需延期三次。

上交的海关税: $468\,388 \times 20\% \times 3 = 28.100\,3$ 万英镑

因此, 由于保函延期发生的损失费用为:

$$10.028\,2 + 16.066\,2 + 28.103\,3 = 54.198\,7\text{ 万英镑}$$

(原报告中照此计算其他项目的保函延期费用, 详细计算从略)

此项保函延期费用索赔总计为 309.939 7 万英镑。

3) 劳动证、居住证办理延期费用

由于工期延误, $\times \times$ 公司根据当地规定必须为新来人员办理劳动证、居住证, 同时每年须延期一次。新来人员人数与第一项费用中的人数相同。

费用标准为:

劳动证: 新办费用为 209 英镑/每人, 延期费用为 106 英镑/每人;

居住证: 新办费用为 42 英镑/每人, 延期费用为 42 英镑/每人。

十月六日城 3000 套住宅工程:

工程延期 802 天, 劳动证及居住证需新办一次, 延期二次, 其费用为:

$$70 \times [209 + (106 \times 2) + (42 \times 3)] = 38\,290\text{ 英镑}$$

(原报告中照此计算其他工程的该项费用, 这里从略)

此项索赔费用总计为 19.348 3 万英镑。

4) 拖欠工程款利息

由于工程延期, 工程保留金也要相应地推迟支付, 给 $\times \times$ 公司带来损失。另外, 在合同执行过程中, 业主经常拖欠工程进度款的支付, 给 $\times \times$ 公司资金周转带来困难, 不得不从银行贷款完成工程, 引起了额外的支出。

(1) 保留金推迟支付的利息计算。

合同期内的保留金利息, 按合同完工工期结束时实际完成工程金额 5% 的保留金额, 时间按工期延长天数计算。

延期后保留金利息, 按剩余工程金额的 5% 的保留金金额, 时间按工期延长天数的一半计算。

合同完工工期结束时的实际完成工程金额是根据工程结算帐单统计得来的, 延期后剩余

工程金额是根据合同完工工期结束时剩余工程的盘点数得来的。

(2) 拖欠工程进度款利息计算。

按业主认可的工程进度款额及拖欠的实际天数计算。一般情况,业主应在结算日期后一个月内支付工程进度款,凡超出一个月均计算拖欠利息。详细计算从略,这是只统计出各工程最后其拖欠进度款的利息。

十月六日城 3000 套住宅工程合同工期结束时已完工程金额为 1 733.081 0 万英镑,剩余工程金额为 422.217 6 万英镑。

(1) 保留金推迟支付利息:

合同完工期内保留金利息:

$$1733.081\ 0 \times 5\% \times 18\% \times (802 \div 365) = 34.272\ 3 \text{ 万英镑}$$

延期后保留金利息:

$$422.217\ 6 \times 5\% \times 18\% \times (802 \div 2 \div 365) = 4.171\ 7 \text{ 万英镑}$$

保留金推迟支付利息合计 38.447 0 万英镑。

(2) 拖欠工程进度款利息:

统计各次工程进度款结算帐单,业主拖欠工程进度款的利息为 31.967 0 万英镑。

因此,该工程拖欠工程款利息共计 70.414 0 万英镑。

(原报告中照此计算其他工程的利息损失,这里从略)

此项索赔费用总计为 293.115 9 万英镑。

5) 防火、防盗保险费增加

合同规定,××公司每年必须对工程进行防火、防盗保险,工期延长,防、防盗保险次数增加,给××公司造成额外费用。

十月六日城 3000 套住宅工程:

延期后已经发生的保险费用见表 6-10。

表 6-10 保险费构成

保险名称	保险期限	保险金额(英镑)
防火保险	1990.11.13~1991.11.13	17 834
防火保险	1991.11.13~1992.11.13	5414
防盗保险		
合计		23 248

预计该工程结束还要支出保险费 5000 英镑。

因此,该工程防火、防盗保险费增加为 28 248 英镑。

(原报告照此计算其他工程增加的防火、防盗费用,这里从略)

此项索赔费用总计为 30.094 4 万英镑。

6) 人工费上涨

由于通货膨胀,生活费用上涨,当地政府规定每年给公职人员增加 15% 的基本工资。生活费用的上涨也导致包括建筑业在内的人工工资的增涨。因此,××公司也需要为其人

员增加工资。

人工费的增加按合同工期结束时剩余工程所需人工工日计算, 剩余勤务员每年按比例完成, 每天人工工资平均 12 英镑, 计算见表 6-11。

表 6-11 人工增加费计算

工程名称	剩余工程量(英镑)	所需工日数	人工单价	人工费上涨(英镑)
档次	①	②	③	④
十月六日城 3000 套住宅工程	422.217 6 万	13.413 8 万	12	$② \times ③ \times [(50\% \times 15\%) + (30\% \times 32.5\%) + (20\% \times 50.08\%)] = 44.412 0$ 万
其他工程计算				从略
合计				674.657 5 万英镑

注: 延期 802 天, 第一年完成剩余工程 50%, 第二年完成 30%, 第三年完成 20%。

第一年人工费上涨率为 15%, 第二年人工费上涨率为 $(1+15\%)^2 - 1 = 32.5\%$, 第三年人工费上涨率为 $(1+15\%)^3 - 1 = 50.08\%$ 。

此项索赔费用总计为: 674.657 5 万英镑。

7) 行政管理费的增加

工程工期延长, 造成 ×× 公司的现场、工程所在国经理部和总公司的管理费增加, 使完成工程增加了额外费用。

承包商分析了合同总价中各项费用所占的比例见表 6-12。

表 6-12 合同总价各项费用的构成

费用项目	总价的百分比(%)	说明
人工费	25	现场及经理部管理费中 1% 用于最初工程准备及工程结束时的退散费用, 不受延期影响
材料费	52	
机械设备费	4	
现场及经理部管理费	6	
总公司管理费	3	
利润	10	
合计	100	

从表 6-12 分析中, 可以看出, 只有占总价的 5% 现场及经理部管理费和占总价 3% 的总公司管理费受延期的影响, 工程项目的行政管理费增加按合同额的 8% $(5\% + 3\%)$ 乘以延长的天数占合同工期天数的百分比计算, 如表 6-13 所示。

8) 材料费上涨

合同规定, 业主只对工程中所用的钢材、水泥、门窗木材及玻璃等四大建材补偿其价格上涨的价差, 对其他材料不予补偿价差。但是, 由于工期延长, 市场其他建材价格也不断上涨, 给承包商完成工程造成了额外的损失。

通过对十月六日城 3000 套住宅的一栋 B 型住宅(合同规定的基本住宅形式)的所有材料价格的分析得出:

1986年所有材料费占合同总价52%；除四大建筑材料外的其他材料费占所有材料费的47.48%，其他材料价格每年平均长涨18.6%(计算这里从略)。

表 6-13 行政管理费增加

工程名称	合同额 (英镑/万)	合同工期(天)	延长天数	管理费占 合同额的 百分比	行政管理费增加 (英镑/万)
	①	②	③	④	①/②×③×④
十月六日城 3000 套住宅	2028.633 5	1095(3 年)	802		118.865 0
萨达特城 4000 套住宅	2838.734 5	1095(3 年)	879	8%	182.301 2
萨达特城 2000 套住宅	1218.532 5	1095(3 年)	618		55.017 6
萨达特城第二区	3992.723 7	703(2 年)	1118		489.190 7
玛丽娜旅游村	2412.239 8	912(30 月)	9439		92.853 9
合计					938.228 4

各项目的剩余工程量及每年完成工程的比例参见(六)人工费上涨索赔。

除四大建材之外的材料费上涨，十月六日城 3000 套住宅工程：

$$422.217 6 \times 52\% \times 47.48\% \times [(50\% \times 18.6\%) + (30\% \times 40.66\%) + (20\% \times 66.82\%)] \\ = 36.341 5 \text{ 万英镑}$$

注：40.66%=[(1+18.6%)² - 1] × 100%

$$66.82\%=[(1+18.6\%)^3 - 1] \times 100\%$$

(原报告中照此计算其他工程的除四大建材外材料费的上涨，这里从略)

此项索赔费用总计为 427.041 8 万英镑。

9) 英镑贬值引起的损失

因英镑不断贬值，工期延长后，使 × × 公司完成工程增加额外的费用。

按承包商与业主最早签订的十月六日城 1000 套住宅工程合同规定，支付美元部分占合同总价的 20%，各项工程项目的剩余工程量同前。

对于十月六日城 3000 套住宅工程：

1991 年 1 月 22 日，合同工期结束时，1USD=2.917LE，1993 年 4 月 4 日，工程完成时，预计 1USD=3.33LE。因英镑贬值引起的损失：

$$42.217 6 \times 20\% \times (3.33-2.917) \div 2.917=11.955 8 \text{ 万英镑}$$

(原报告中照此计算出其他工程因英镑贬值引起的损失，这里从略)

此项索赔费用总计为 244.915 8 万英镑。

10) 机械设备的折旧费用

因工期延长，承包商的机械设备，不断折旧，增加了额外的费用。机械设备的折旧以 5 年为标准，年折旧率为 20%，机械设备费用占合同总价的 4%(如前所述)。十月六日城 3000 套住宅工程机械设备折旧费为：

$$2028.633 5 \times 4\% \times 205 \times (802 \div 365) - 35.639 5 \text{ 万英镑}$$

(原报告中照此计算其他工程机械设备折旧费，这里从略)

此项索赔费用总计为 227.894 1 万英镑。

承包商在向业主提交了该索赔报告后,同业主进行了艰苦的索赔谈判。开始,业主拒绝对工期延误给予费用补偿,原因是业主认为这在该国没有先例。承包商据理力争,并聘请一位英国高级律师参与该项索赔。在最后一次有该国国务委员会法律部主任参加的索赔谈判中,该法律事务部主任才同意赔偿因非承包商原因引起的工期延误而产生的费用损失,但赔偿不按承包商提交的索赔报告中的金额赔偿,而是按合同工期结束后每个月的剩余工程量的0.6%赔偿,另外,再减少萨达特城第二区工程的部分工程量。

索赔开始

1. 由于合同中并未规定承包商提出索赔的时限,因此,承包商可以在工程结束后再提出综合索赔,而不致于使其索赔的权利受到限制。

2. 虽然合同中规定了对除四大建材外的其他材料的价格上涨不予补偿价差,但承包商也可在工程延期后向业主提出由于物价上涨引起的额外损失费用,尽管合同中没有明确规定。

3. 当承包商对当地的索赔不熟悉时,可借助于律师提供的法律服务,避免失误和盲目性,增加索赔谈判的力量和严肃性,给对方以无论采取何种方式也要解决索赔的印象。

4. 承包商可以在工程施工中及时提出单项索赔,也可在工程结束后提出综合索赔。

对于同一个业主的多个工程项目,在开展索赔时,还可统筹考虑,全面安排,相互配合,提出多工程的综合索赔,以增加谈判的力量和灵活性,提高承包商的索赔管理水平。例如:通过其他工程项目的费用索赔,达到萨达特城第二区工程合同额的减少,从而减少承包商在该工程上由于报价过低和自身管理原因造成的亏损。因此,索赔补偿也不一定是直接的费用补偿,从而增加了解决费用索赔的灵活性。

5. 通过对各工程合同工期结束后每个月剩余工程量的0.6%计算,可得该项赔偿总额约523万英镑。另外,通过减少萨达特城第二区工程合同工程量700万英镑(由于该工程严重亏损,投入资金为合同额的3~5倍),按投入资金是合同额4倍计算,可减少亏损2100万英镑,承包商的实际索赔总额为2623万英镑,基本上达到承包商的目的。

复习思考题

1. 简述索赔的含义、分类及特点。
2. 简述索赔与反索赔的一般程序及其报告的内容。
3. 分析交叉延误条件下工期和费用补偿的相关情况。
4. 简述索赔费用的组成及计算方法。
5. 辨析索赔和反索赔的关系。
6. 什么叫索赔事件?常见的索赔事件有哪些?
7. 简述工期索赔的分类及处理。
8. 结合所给出的案例,谈谈如何搞好索赔管理。

练 习 题

1. 某施工单位与业主按 GF-1999-0201 合同签订施工承包工程合同, 施工进度计划已得到批准如图 6.10 所示, 施工中 C、E 使用同一种机械, 其台班费为 500 元/台班, 折旧(或租赁)费为 300 元/台班, 假设人工工资为 40 元/工日, 窝工补偿为 20 元/工日, 合同规定, 提前奖为 1000 元/天, 延期罚款 1500 元/天, 各工作均按最早开始时间开工。




图 6.10 施工进度计划

施工发生了以下的情况:

- (1) A 工作由于业主原因晚开工 2 天, 致使有 10 人在现场停工待命。
- (2) C 工作原工程量 100 个单位, 相应的合同价为 2000 元, 后设计变更工程量增加了 100 个单位。
- (3) D 工作由于承包商加大施工力度缩短了 2 天。
- (4) G 工作由于承包商原因晚开工 1 天。
- (5) H 工作由于工程师的指令有误晚开工 1 天, 20 人停工。

问承包商可索赔的工期和费用各为多少?

2. 某工程项目的施工招标文件表明该工程采用综合单价计价方式, 工期为 15 个月。承包单位投标所报工期为 13 个月。合同总价确定为 8000 万元。合同约定: 实际完成工程量超过估计工程量 25% 以上时允许调整单价; 拖延工期每天赔偿金为合同总价的 1‰, 最高拖延工期赔偿金为合同总价的 10‰; 若能提前竣工, 每提前一天的奖金按合同总价的 1‰ 计算。

承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图 6.11 所示。




图 6.11 施工进度计划

施工过程中发生了以下4个事件,致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。

事件1: A、C两项工作为土方工程,工程量均为 16万 m^3 ,土方工程的合同单价为 16元/m^3 。实际工程量与估计工程量相等。施工计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为 32万 m^3 。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为 14元/m^3 。承包单位计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为 $1\text{万元/月}\cdot\text{台}$ 。

事件2: F工作,因设计变更等待新图纸延误1个月。

事件3: G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。

事件4: H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。

由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求:

(1) 顺延工期6.5个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。

(2) N工作的费用补偿= $16\text{元/m}^3 \times 32\text{万 m}^3 = 512\text{万元}$ 。

(3) 由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费 $5\text{月} \times 1\text{万元/月}\cdot\text{台} \times 1\text{台} = 5\text{万元}$ 。

问题:

(1) 对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。

(2) 根据总监理工程师认可的施工进度计划,应给施工单位顺延的工期是多少?说明理由。

(3) 确定应补偿承包单位的费用,并说明理由。

(4) 分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。

第7章 工程合同变更管理

教学提示: 工程变更是工程合同履行过程中的必然现象,对于任何一个建设项目而言,工程变更是不可避免的。如何激发合同主体各方在工程变更活动中的主观能动性,对工程变更实施有效的管理与控制,是衡量工程合同管理水平的重要方面。

教学要求: 通过本章教学应使学生了解工程变更的概念与分类及其主体各方在工程变更活动中的权利与义务,重点掌握设计变更和施工措施变更的内涵及其特点,工程变更价款的确定方法和基本的工程变更管理方法与控制程序。

7.1 工程变更的概念与分类

工程变更是建设项目合同管理的重要内容,是影响建设项目进度控制、质量控制和投资控制的关键因素。从纯技术层面分析,工程变更有广义和狭义之分,广义的工程变更包含合同变更的全部内容,如工程实施中形式的变更,工程量清单数量的增减,工程质量要求及相关技术标准的变动,法律的调整以及合同条件的修改等。而狭义的工程变更只包括传统的以工程变更形式变更的内容,如建筑物标高的变动,道路线形的调整,施工技术方案的变更等。从工程变更实施效果角度分析,工程变更有积极的和消极之分。积极的工程变更是指建设项目主体各针对建设项目合同控制目标所主动采取的通过优化设计和施工措施方案以及调整工程实施计划等手段以达到降低工程成本、提高工程质量和缩短建设工期的工程变更。如优化高速公路线形以及在房屋建筑工程现浇混凝土施工中采用冷轧带肋钢筋代替普通圆钢等工程变更均属于典型的积极的工程变更。消极的工程变更系指由于各类客观因素的影响(如设计错误、工程地质条件变化等),为保障建设项目顺利实施而必须作出调整的工程变更,消极的工程变更也包括建设项目主体各方违背诚信原则和建设项目合同控制目标所采取的不利于降低工程成本、有损工程质量和延误建设工期的工程变更。工程变更对建设项目的实施有着巨大的影响,消极的工程变更往往导致建设项目工期延误,投资失控以及对劳动生产率产生负面的影响。由工程变更演变而来的工程索赔,合同争端及诉讼加剧了业主与承包商之间的矛盾。由于上述种种原因,国内外建筑业一直致力于研究工程变更的起因及其对建设项目的影。美国建筑业纠纷避免和解决委员会这一私人协会于1995年估计,全美每年用于工程变更的费用超过600亿美元,还有更多的间接成本会由此上升,例如工程的延期或停工,紧缺物资的未充分利用以及其他机会成本。对工程变更的充分研究可以提供经验使得业主和承包商能更好地控制工程变更,减轻工程变更对建设项目的不良影响。由于建筑产品生产的独特属性以及各种主客观因素的影响,对任何一个建设项目而言,工程变更是不可避免的。因此,加强工程变更的管理与控制对实现建设项目合同管理目标具有重要的意义。

7.1.1 工程变更的概念

工程变更概念与内涵的准确把握是开展工程合同变更管理的基础。由于工程变更内容的复杂性,至今尚没有一个公认的确切定义。目前,国外研究文献对工程变更的定义通常包括以下4种:

- (1) 工程变更是指导致对项目初始范围,实施时间或价款调整的任何事件。
- (2) 工程变更是指对工程初始范围的所有改变。
- (3) 工程变更是指增减原合同范围或是影响完成原合同范围的时间和成本的更改或项目工序的改变。
- (4) 工程变更是指以下事件中的任何一项: (a) 合同中包括的任何工作内容的数量的改变(但此类改变不一定构成变更); (b) 任何工作内容的质量或其他特性的改变; (c) 任何部分工程的标高,位置和(或)尺寸的改变; (d) 任何工作的删减,但要交他人实施的工作除外; (e) 永久工程所需的任何附加工作,生产设备,材料或服务,包括任何有关的竣工试验,钻孔、其他试验和勘探工作; (f) 实施工程的顺序或时间安排的改变。

从上述各种定义可见,国外研究者对工程变更的理解亦是仁者见仁,智者见智。相比之下,第1种定义对工程变更的描述更为全面,涵盖了工程变更的几项主要内容。第4种定义对工程变更的定义则较为具体。此外,人们对工程变更概念的认识通常有一个误区,即将工程变更简单地等同于工程变更令,这种理解是不全面的,而且是有误的。工程变更令通常是指在合同条款约定的条件下,由双方签署的补偿承包商变更,追加工程,延误或其他共同议定的影响因素的正式文件。在缺乏双方共同协议的情况下,一些业主单方面发出变更指令,这些指令基于他们自己的估价来确认变更而且许可在协议达成或争端解决之前给予临时性进度支付。很显然,工程变更不等于工程变更令,工程变更应包括合同变更的全部内容。工程变更令只是工程变更的一个组成部分而不是全部。许多工程变更是由第三方原因引起,或属于推定变更的范畴。例如,业主坚持按原定工期完成工程,尽管承包商有权和件时间上的延期。承包商认为他已经按推定进行了加速施工或压缩工序作业时间,尽管他没有收到确切的加速施工指令。

7.1.2 工程变更的分类

工程变更的内涵十分丰富,可以从不同的角度加以分类。工程管理实践中,通常按照工程变更所包含的具体内容,将其划分为如下五个类别:

- (1) 设计变更。
- (2) 施工措施变更。
- (3) 计划变更。
- (4) 条件变更。
- (5) 新增工程。

1. 设计变更

设计变更是指建设工程施工合同履行过程中,由工程不同参与方提出,最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。设计变更包含的内容十分广泛,

是工程变更的主体内容。常见的设计变更有：因设计计算错误或图示错误发出的设计变更通知书，因设计遗漏或设计深度不够而发出的设计补充通知书，以及业主、承包商或监理方请求对设计所作的优化调整等。

2. 施工措施变更

施工措施变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、施工环境或施工条件的改变等因素影响，向监理工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。施工措施方案的变更应经监理工程师和业主审查同意后实施，否则引起的费用增加和工期延误将由承包方自行承担。重大施工措施方案的变更还应征询设计单位意见。在建设工程施工合同履行过程中，施工措施变更更存在于工程施工的全过程，如人工挖孔桩桩孔开挖过程中出现地下流沙层或淤泥层，需采取特殊支护措施，方可继续施工；公路或市政道路工程路基开挖过程中发现地下文物，需停工采取特殊保护措施；建筑物主体施工过程中，因市场供应原因引起的混凝土搅拌方式的调整等。

3. 条件变更

条件变更是指施工过程中，因业主未能按合同约定提供必须的施工条件以及不可抗力发生导致工程无法按预定计划实施。如业主承诺交付的工程后续施工图纸未到，致使工程中途停建，业主提供的施工临时用电因社会电网紧张而断电导致施工无法正常进行；特大暴雨或山体滑坡导致工程停工。这类因业主原因或不可抗力所发生的工程变更统称为条件变更。

4. 计划变更

计划变更是指施工过程中，业主因上级指令、技术因素或经营需要，调整原定施工进度计划，改变施工顺序和时间安排。如小区群体工程施工中，根据销售进展情况，部分房屋需提前竣工，另一部分房屋适当延迟交付，这类变更就是典型的计划变更。

5. 新增工程

新增工程是指施工过程中，业主扩大建设规模，增加原招标工程量清单之外的建设内容。

根据大量工程实践中存在的工程变更所揭示的特征，各类常见工程变更可从可控性、技术性、所处阶段、频率和来源方等五个不同层面加以描述。一般情况下，设计变更和施工措施变更的可控性强，其余变更的可控性一般或较弱。从技术性角度而言，设计变更的技术性强，施工措施变更次之，其余变更则较弱。从所处阶段分析，一般房屋建筑工程设计变更和施工措施变更涵盖工程施工的全过程，其余变更则主要发生在工程主体施工阶段和装饰施工阶段。从发生频率来看，设计变更最高，施工措施变更次之，其余变更则较低。从变更的来源方即提出(或引起)变更的主体观察，设计变更和施工措施变更范围最广，业主、承包方、监理方和设计方均可提出设计变更和施工措施变更要求，计划变更和新增工程一般由业主提出，条件变更则通常由业主或不可抗力引起。

7.2 合同主体各方在工程变更活动中的权利与义务

7.2.1 监理工程师在工程变更活动中的权利与义务

(1) 在专用条款授权的范围和规定的时限内审批承包人提出的工程变更建议书。若属设计变更,则需报设计单位确认后执行。对于超出专用条款授权范围的工程变更,监理工程师应在规定的时限内向发包人提出自己的审核意见。

(2) 监理工程师有义务独立地向发包人提出工程变更建议。

(3) 监理工程师有权利分享其所提出的工程变更给发包人带来的收益,分享方式及比例由双方在专用条款中约定。

7.2.2 发包人在工程变更活动中的权利与义务

(1) 在专用条款约定的范围和时限内审批承包人或监理工程师提出的工程变更建议书。若属设计变更,则需报设计单位确认后执行。

(2) 对设计单位直接发出的工程设计变更文件,应对其进行技术经济评价,在专用条款约定的时限内将评价结果反馈回设计单位,经设计单位再次确认或修改调整后组织承包人实施。

7.2.3 承包人在工程变更活动中的权利与义务

(1) 承包人有义务独立地向监理工程师或发包人提出工程变更建议。

(2) 承包人有权利分享其所提出的工程变更给发包人带来的收益,分享方式及比例由双方在专用条款中约定。

7.3 工程变更价款的确定

工程变更价款的确定,既是工程变更方案经济性评审的重要内容,也是工程变更后调整合同价款的重要依据。一般情况下,承包商在工程变更后规定的时间内应提出工程变更价款的报告,经监理工程师批准后方可调整合同价款。

国内现行建设工程施工合同条件和相关研究文献均有关于工程变更价款确定方法和原则的论述,其确定原则一般包括以下内容:

① 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款。

② 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。

③ 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经监理工程师确认后执行。

④ 承包商在双方确定变更后14天内不向监理工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

⑤ 监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认, 监理工程师无正当理由不确认时, 自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

⑥ 监理工程师不同意承包商提出的变更价款, 按关于合同争议的约定处理。

⑦ 因承包商自身原因导致的工程变更, 承包商无权要求追加合同价款。

FIDIC 组织 1999 年发布的《施工合同条件》(第 1 版)对工程变更的估价原则和程序亦作出了相应的约定。它同国内现行施工合同变更条款的不同之处是, FIDIC 合同规定, 当实际测量的工程量清单项目的工程量增减出现下列情形时, 应采用新的费率或价格:

- (1) 该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料表中所列数量的 10% 以上。
- (2) 此数量变化与该项工作上述规定的费率的乘积, 超过中标合同金额的 0.01%。
- (3) 此数量变化直接改变该项工作的单位成本超过 1%。
- (4) 合同中未规定该项工作为“固定费率项目”。

一些研究文献的研究结论表明, 确定工程变更的价格可包括如下四种方法:

- (1) 采用工程量清单中的综合单价或费率。
- (2) 根据工程所在地工程造价管理机构颁布的概预算定额, 工程量清单项目综合单价定额或工程量清单项目工料机消耗量定额确定。
- (3) 根据现场施工记录和承包商实际的人工、材料、施工机械台班消耗量以及投标书中的工料机价格, 管理费率和利润率综合确定。但是, 由于承包商管理不善, 设备使用效率降低以及工人技术不熟练等因素造成的成本支出应从变更价格中剔除。
- (4) 采用计日工方式。此方式适用于规模较小, 工作不连续, 采用特殊工艺措施, 无法规范计量以及附带性的工程变更项目。合同中未包括计日工清单项目的, 不宜采用计日工方式。

采用计日工方式计价的变更项目应按照包括在合同中的计日工清单表进行估价。监理工程师应做好施工现场原始记录, 承包商应向监理工程师提交每日的计日工报表, 准确填报前一日工作中使用的各项资源的详细资料, 如承包商人员的姓名、职业和使用时间; 承包商设备和临时工程的标识、型号和使用时间; 所用的生产设备和材料的数量及型号。监理工程师审核同意后, 作为支付工程进度款的依据。原计日工清单中缺项的资源项目, 承包商应在订购货物前提前向监理工程师提交报价单, 当申请支付时, 承包商应提交各种货物资源的发票、凭证、账单或收据。

工程变更价款确定过程可用图 7.1 表示。

承包商在双方确定变更后 14 天内向监理工程师提出变更工程价款报告时, 视为该项变更不涉及合同价款的变更。监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认, 监理工程师无正当理由不确认时, 自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。监理工程师不同意承包商提出的变更价款, 按关于合同争议的约定处理。因承包商自身原因导致的工程变更, 承包商无权要求追加合同价款。

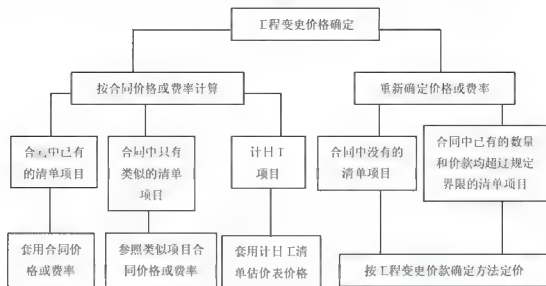


图 7.1 工程变更价款的确定过程

7.4 工程变更的管理与控制

发包人和监理工程师可分别在合同专用条款约定的范围内发出工程变更指令，除获得发包人或监理工程师指令外，承包人不得擅自作出任何变更。除非在特殊情况下，发包人或监理工程师可书面批准承包人除遵照发包人和监理工程师指令以外而作出的任何工程变更。任何发包人或监理工程师要求或获发包人和监理工程师随后追加的工程变更均不会使合同失效。对工程变更权的规定有利于合理划分工程变更活动中管理层和执行层的界面，促进工程变更活动的有序开展，防止工程变更现象的失控。

承包人应按发包人或监理工程师指示在规定的进度内完成变更洽商工作，如果双方对变更金额或时间安排发生争议，经协商未能达成一致意见，承包人不得因双方对变更事项未达成一致意见而拒绝执行或拖延执行变更指令。如果承包人在工程变更指令发出后 7 天内不执行或拒绝执行该指令，发包人有权雇佣其他承包人执行该指令，所增加的费用一般由承包人负责。此规定有利于约束承包人严格履行合同和等同于合同附件的工程变更指令，通过增加违约成本的方式保证工程变更指令的及时执行。

7.4.1 工程变更的分类控制

在工程变更的管理实践和理论研究中，人们通常按照工程变更的性质和费用影响实施分类控制，以区分业主和监理工程师在处理不同属性变更问题上的职责，权限及其工作流程。一般把工程变更分为三个重要性不同的层级，即：①重大变更；②重要变更；③一般变更。其特征和控制程序如下：

1. 重大变更

重大变更是指一定限额以上的涉及设计方案、施工措施方案、技术标准、建设规模和建设标准等内容的变动。如高层建筑基础形式的变更,道路线形的调整,隧道位置的移动,交通工程重大防护设施的变更等。

重大变更一般由监理工程师初审,总监理工程师复审,报送业主后,由业主组织勘察、设计、监理和承包商各方评审通过后实施。

2. 重要变更

重要变更是指一定限额区间内的不属于重大变更的较大变更。如建筑物局部标高的调整,工序作业方案的变动等。

重要变更一般由监理工程师初审,总监理工程师批准后实施。

3. 一般变更

一般变更是指一定限额以下的设计差错、设计遗漏、材料代换以及施工现场必须立即作出决定的局部修改等。一般变更由监理工程师审查批准 after 实施。

一类变更的限额依建设项目投资规模,合同控制目标和两级监理工程师执业能力等因素综合设定。如国内某跨海大桥工程合同文件中,对三类变更的限额划分如下:

(1) 一般变更:变更产生的合同增、减的费用不超过5万元。

(2) 重要变更:一个(次)变更产生的合同增、减的费用在5~10万元之间或多个(次)类似变更累计产生的合同增、减的费用在5~20万元之间。

(3) 重大变更:一个(次)变更产生的合同增、减的费用超过10万元,或多个(次)类似变更累计产生的合同增、减的费用超过20万元。但是,工程中任何种类的附加工作和任何部分规定施工顺序或时间安排的变更不受此限额约束,均属于重要变更或重大变更范畴。

7.4.2 工程变更控制系统的构成

根据系统工程原理和建设项目工程变更的特点,建设项目工程变更控制系统一般由以下8个子系统构成,分别为①变更生成系统;②变更评审系统;③变更决策系统;④变更发布系统;⑤变更执行系统;⑥变更监督系统;⑦变更预警系统;⑧变更绩效评估系统。

建设项目工程变更控制系统框图如图7.2所示。

各子系统的基本功能如下:

1. 变更生成系统

变更生成系统包括提出工程变更意图和编制工程变更建议书等基本功能。在一个运转良好的建设项目工程变更控制系统中,工程变更意图的提出方可以涵盖建设项目主体各方,即业主、设计方、监理方和承包商。当工程变更意图提出后,根据工程变更的类型,经业主、监理工程师或设计方洽商同意后,即可进入编制工程变更建议方案阶段。

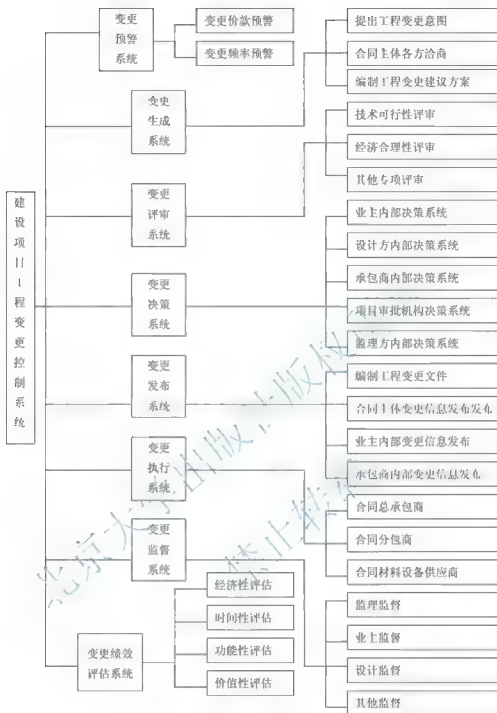


图 7.2 工程变更控制系统框图

2. 变更评审系统

变更评审系统包括技术可行性评审、经济合理性评审和其他专项评审。变更评审的具

体内容依工程变更的类型而定。如施工措施变更方案的评审指标将明显不同于设计变更方案的评审指标。施工措施变更方案和设计变更方案的评审指标和评价方法在本文第五部分进行了研究。

3. 变更决策系统

变更决策系统包括业主内部决策系统、设计方内部决策系统、监理方内部决策系统、承包商内部决策系统和项目审批机构决策系统。在变更决策系统中,设计方内部决策系统、监理方内部决策系统和承包商内部决策系统是整个变更决策系统的二级系统,当变更引起建设项目建设规模和标准超出原审批范围时,项目审批机构则为最高决策系统。

4. 变更发布系统

变更发布系统由编制工程变更文件、合同主体各方变更信息发布、业主内部变更信息发布和承包商内部变更信息发布等系统组成。工程变更文件一般由提出方负责编制,工程变更信息应由业主方统一编码发布。由于工程变更可能涉及工期、合同价款或材料设备采购计划的调整,在业主内部和承包商内部也存在着工程变更信息的发布流程。

5. 变更执行系统

变更执行系统由总承包商、专业分包商和材料设备供应商组成。其中:专业分包商既包括总承包商委托的专业分包商,也包括由业主指定的专业分包商,如消防工程承包商、土石方工程承包商和高级装饰工程承包商等。

6. 变更监督系统

变更监督系统由监理监督、业主监督、设计监督和其他监督组成。对于一般工程变更的实施,通常由监理方按照委托监理合同的授权监督执行。对于重要工程变更或重大工程变更,除监理监督外,还需业主和设计方共同监督,特殊变更项目,应委托专业机构或由政府工程质量监督部门检测监督。

7. 变更预警系统

变更预警系统由变更价款预警和变更频率预警两个部分组成。变更预警系统的建立有利于业主方准确控制工程变更的总量、节奏和质量。变更价款预警是指业主根据历史工程经验,通过事先设定建设项目阶段性变更价款控制值来监控建设项目工程变更价款变动趋势,及时发布警示信息,提示业主及时分析超限原因,采取相应应对措施。变更频率预警是指业主根据历史工程经验,通过事先设定建设项目阶段性变更频率控制值来监控建设项目工程变更的频繁程度,及时发布超限警示信息,提示业主采取措施,防止频繁变更给工程管理带来的混乱,以减少因频繁变更导致的施工索赔和合同争端。

8. 变更绩效评估系统

变更绩效评估系统由经济性评估、时间性评估、功能性评估和价值性评估组成。变更绩效评估的目的是总结建设项目工程变更管理经验,积累工程变更管理资料,根据绩效和合同条款约定,奖励或惩罚相关工程变更提出方。

7.4.3 承包商提出工程变更的控制程序

常见的五类工程变更中,设计变更和施工措施变更频率较高,对工程造价的影响亦较大,是合同控制的重点。而对设计变更而言,既有业主对自身项目管理人员提出设计变更的控制,也有业主对承包商、监理方和设计方提出设计变更的控制。在现行建设工程工程量清单招标投标模式下,经评审的合理低价法是业主在工程招标阶段选择承包商的基本方法,承包商为谋求中标,一般只有选择低价中标的路线,而一旦中标,设计变更则成为承包商调整其工程量清单综合单价的唯一途径。因此,加强对承包商提出工程变更的控制是合同控制的重中之重。

承包商提出工程变更的原因和目的很多,主要分为两个方面:一是对原设计图纸提出设计变更;二是对已确认的施工组织设计或施工方案提出施工措施变更。

第一方面情况包括以下内容:

- (1) 设计图纸本身的遗漏或错误。
- (2) 主观上想通过设计变更来增加工程量,以期增加工程承包收益。
- (3) 由于某项工程施工质量不合格,又无法全部返工处理。
- (4) 选用材料替代市场紧俏或无法采购的材料。
- (5) 用工艺简单、自身技术力量优势较强的做法代替工艺复杂、施工难度较大的做法。
- (6) 主观上想通过设计变更调整原投标报价中报价偏低的工程量清单项目综合单价。

以上6种情况都是承包商从自身利益考虑或从工程顺利推进角度提出的,监理工程师和业主及设计各方应认真分析、仔细审核,善于识别,有针对性地进行处理。

第二方面情况可分为以下几种:

- (1) 原施工组织设计或施工方案存在技术缺陷或不合理因素,无法指导施工。
- (2) 原施工方案投入成本过高,重新提出成本较低的施工方案。
- (3) 工程进度滞后而提出对原施工计划进行调整。
- (4) 工程地质条件变化或有经验的承包商无法预见的外部施工环境发生变化需对原施工方案进行修改和调整。
- (5) 设计变更导致必须对原施工方案进行调整。
- (6) 业主对工程进度提出新的要求需对原施工方案进行调整。
- (7) 工程所在地政府行政管理部门要求调整施工方案以满足环保或劳动保护等要求。

上述7种情况既有因承包商自身原因导致的施工组织设计或施工方案的调整,也包括业主、不可抗力或第三方原因引起的施工组织设计或施工方案的调整。对因承包商自身原因导致的施工组织设计或施工方案的调整,在满足工期和质量要求的前提下,增加或减少的工程费用在合同价款中不予调整。对因业主、不可抗力或第三方原因引起的施工组织设计或施工方案的调整,其增加或减少的工程费用在合同价款中据实结算。

标准的承包商提出工程变更的控制程序如图7.3所示。

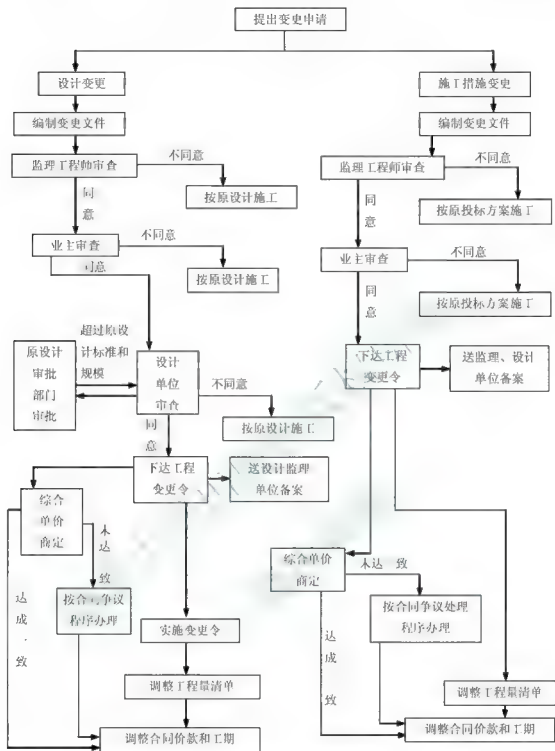


图 7.3 承包商提出工程变更的控制程序

复习思考题

1. 简述工程变更的含义与特点。
2. 简述工程变更的分类。
3. 分析不同类型工程变更之间的相互衍生关系。
4. 简述工程变更的生成因素。
5. 分析合同主体各方在工程变更活动中的特点及其权利义务关系。
6. 简述工程变更价款的确定方法与程序。
7. 简述工程变更分类管理的意义。
8. 简述工程变更控制系统的组成。
9. 简述工程变更管理与工程索赔管理的区别与联系。
10. 结合具体工程案例，构建一个业主方的工程变更控制系统。

第8章 工程合同风险管理

教学提示：本章的重点是风险及风险管理的概念；工程合同风险因素分析的内容及工程合同的风险管理。本章的难点是工程合同的担保和工程合同的保险。

教学要求：通过本章教学应使学生掌握风险、风险管理的概念和风险管理的任务；工程合同风险的分类；承包人承包工程的主要风险；工程担保的方式及内容；工程保险条款的主要内容；工程合同的风险管理。熟悉工程合同担保的基本概念；工程合同保险的基本概念；工程合同保险的投保。了解风险的特点；风险因素分析的方法；担保的原则和特征。

8.1 风险管理概述

1. 风险

现代汉语字典把风险解释为“可能发生的危险”，而一些英文字典则将其定义为“遭受危险、蒙受损失或伤害等的可能或机会”。风险是人们应对未来行为的决策及客观条件的不确定性而可能引起的后果与预定目标发生多种负偏离的综合。或者说，风险是活动或事件消极的、人们不希望的结果发生的潜在可能性。风险的内涵可以从以下3种角度来考察：

(1) 风险同人们有目的的活动有关。必须是与人们的行为相联系的风险，否则就不是风险而是危险。

(2) 客观条件的变化是风险的重要成因。风险同将来的活动和事件有关。

(3) 风险是指可能的后果与项目的目标发生负偏离。

2. 风险的特点

为了加深对风险的理解，还必须了解风险的以下特点：

(1) 风险存在的客观性和普遍性。作为损失发生的不确定性，风险是不以人们的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在的。

(2) 单一具体风险发生的偶然性和大量风险发生的必然性。正是由于存在着这种偶然性和必然性，人们才要去研究风险，才有可能去计算风险发生的概率和损失程度。

(3) 风险的多样性和多层次性。

(4) 风险的可变性。

3. 风险管理

1) 风险管理

风险管理是对潜在的意外损失进行辨识、评估、预防和控制的过程，是用最低的费用把项目中可能发生的各种风险控制在最低限度的一种管理体系。建筑工程由于生产的

单件性、地点的固定性、投资数额巨大以及周期长、施工过程复杂等特点,比一般产品生产具有更大的风险。建筑工程项目的立项及其可行性研究、设计与计划都是基于可预见的技术、管理与组织条件以及对工程项目的环境(政治、经济、社会、自然等各方面)理性预测的基础上作出的,而在工程项目实施以及项目建成后运行的过程中,这些因素都有可能产生变化,都存在着不确定性。风险会造成工程项目实施的失控现象,如工期延长、成本增加、计划修改等,最终导致工程经济效益降低,甚至项目失败。但风险和机会同在,往往是风险大的项目才能有较高的盈利机会。风险管理不仅能使建设项目获得很高的经济效益,还能促进建设项目的管理水平和竞争能力的提高。每个工程项目都存在风险,对于项目管理者来说,主要挑战就是将这种损失发生的不确定性减至一个可以接受的程度,然后再将剩余不确定性的责任分配给最适合承担它的一方,这个过程构成了工程项目的风险管理。

2) 风险管理的任务

风险管理主要包括风险识别、风险分析和风险处置。风险管理是对项目目标的主动控制,是建立项目风险的管理程序及应对机制,以有效降低项目风险发生的可能性,一旦风险发生,风险对于项目的冲击能够最小。风险管理的任务是:

- (1) 识别与评估风险。
- (2) 制定风险处置对策和风险管理预算。
- (3) 制定落实风险管理措施。
- (4) 风险损失发生后的处理与索赔管理。

8.2 工程合同风险因素分析

风险分析是指应用各种风险分析技术,用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程。风险分析的目的是为了准确、深入地了解风险产生的原因和条件,尤其是重大风险,还需要对其做进一步的分析。

风险因素是指一系列可能影响项目向好或向坏的方向发展的因素的总和。风险分析的内容主要是分析项目风险因素发生的可能性、预期的结果、可能发生的时间及发生的频率。对风险分析的结果风险管理者必须有自己的判断,风险分析方法是协助风险管理者进行分析风险,而风险分析不能代替风险管理者判断。

8.2.1 风险因素分析的方法

风险分析的方法包括:定性分析方法、定量分析方法或两者相结合的方式。定性分析方法主要有头脑风暴法、德尔菲法、因果分析法、情景分析法等;定量分析方法有敏感性分析、概率分析、决策树分析、影响图技术、模糊数学法、灰色系统理论、效用理论、模拟法、计划评审技术、外推法等。风险因素识别的方法有许多,但风险分析方法必须与使用这种方法的环境相适应,具体问题应作具体分析。在实践中用得较多的是头脑风暴法、德尔菲法、因果分析法和情景分析法。

1. 头脑风暴法

头脑风暴法,是通过专家会议,发挥专家的创造性思维来获取本来信息的一种直观预

测和识别方法。头脑风暴法通过主持专家会议的人在会议开始时的发言激起专家们的思维“灵感”，促使专家们感到急需回答会议提出的问题而激发创造性的思维，在专家们回答问题时产生信息交流，受到相互启发，从而诱发专家们产生“思维共振”，以达到互相补充并产生“组合效应”，获取更多的未来信息，使预测和识别的结果更准确。

2. 德尔菲法

德尔菲法又称专家调查法，是通过函询收集若干位与该项目相关领域的专家的意见，然后加以综合整理，再匿名反馈给各位专家，再次征询意见。这样反复经过四至五轮，逐步使专家的意见趋向一致，作为最后预测和识别的根据。

3. 因果分析法

因果分析图因其图形像鱼刺，故也称鱼刺图分析法。图中主干是风险的后果，枝是风险因素和风险事件，分支为相应的小原因。用因果分析图来分析风险，可以从原因预见结果，也可以从可能的后果中找出将诱发结果的原因。

4. 情景分析法

情景分析法又称幕景分析法，是根据发展趋势的多样性，通过对系统内外相关问题的系统分析，设计出多种可能的未来前景，然后用类似于撰写电影剧本的手法，对系统发展态势作出自始至终的情景和画面的描述。

情景分析法是一种适用于对可变因素较多的项目进行风险预测和识别的系统技术，它在假定关键影响因素有可能发生的基础上，构造出多重情景，提出多种未来的可能结果，以便采取适当措施防患于未然。

8.2.2 风险分类

1. 风险分类

将工程合同中的风险进行分类，可使风险管理者更彻底地了解风险，管理风险时更有目的性、更有效果，并为风险评估做好准备。

1) 按风险产生的原因分类

(1) 政治风险。例如政局的不稳定性，战争状态、动乱、政变，国家对外关系的变化，国家政策的变化等。

(2) 法律风险。如法律修改，但更多的风险是法律不健全，有法不依、执法不严，对有关法律理解不当以及工程中可能有触犯法律的行为等。

(3) 经济风险。如国家经济政策的变化、国家经济发展状况、产业结构调整、银根紧缩、物价上涨、关税提高、外汇汇率变化、通货膨胀速度加快、金融风波等。

(4) 自然风险。如地震、台风、洪水、干旱，反常的恶劣的雨、雪天气，特殊的、未探测到的恶劣地质条件如流沙、泉眼等。

(5) 社会风险。包括宗教信仰的影响和冲击、社会治安的稳定性、社会的禁忌、劳动者的文化素质、社会风气等。

(6) 合同风险。由于合同条款的不完备或合同欺诈导致合同履行困难或合同无效。

(7) 人员风险。这是主观风险，是关系人恶意行为、不良企图或重大过失造成的破坏。

2) 按风险产生的阶段分类

- (1) 项目决策风险。
- (2) 融资、筹资风险。
- (3) 建设期风险。
- (4) 生产经营期风险。包括技术风险、时机风险、效益风险、商业风险等。

3) 按风险产生的后果分类

(1) I 期风险。即造成局部的(I 期活动、分项工程)或整个工程的 I 期延长,不能及时投入使用。

(2) 费用风险。包括财务风险、成本超支、投资追加、报价风险、收入减少、投资回收期延长或无法收回、回报率降低。

(3) 质量风险。包括材料、工艺、工程不能通过验收,工程试生产不合格,经过评价工程质量未达标准。

(4) 生产风险。项目建成后达不到设计生产能力,可能是由于设计、设备问题,或生产用原材料、能源、水、电供应问题。

(5) 市场风险。工程建成后产品未达到预期的市场份额,销售不足,没有销路,没有竞争力。

(6) 信誉风险。即造成对企业形象、职业责任、企业信誉的损害。

(7) 人员、设备风险。如人身伤亡、安全、健康以及工程或设备的损坏。

(8) 法律风险。即可能被起诉或承担相应法律或合同的处罚。

2. 承包人承包工程的主要风险

工程合同的风险因素分析对发包人和承包人来说都十分重要,发包人主要从对承包人的资格考察及合同具体条款的签订上防范风险,这里不多叙述。此处仅介绍承包人在建设工程承包过程中的风险因素分析。

承包工程中常见的风险有如下几类。

(1) 工程的技术、经济、法律等方面的风险。具体包括:由于现代工程规模大,功能要求高,需要新技术、特殊的工艺,特殊的施工设备,有时发包人将工期限定得太紧,承包人无法按时完成;现场条件复杂,干扰因素多;施工技术难度大,特殊的自然环境,如场地狭小,地质条件复杂,气候条件恶劣,水电供应、建材供应不能保证等;承包人的技术力量、施工力量、装备水平、工程管理水平不足,在投标报价和工程实施过程中会有这样或那样的失误,例如:技术设计、施工方案、施工进度计划和组织措施存在缺陷和漏洞,计划不周,报价失误等;承包人资金供应不足,周转困难;在国际工程中还常常出现对当地法律、语言不熟悉,对技术文件、工程说明和规范理解不正确或出错的现象。

(2) 发包人资信风险。属于发包人资信风险的有如下几方面:发包人的经济情况变化,如经济状况恶化,破产倒闭,无力继续实施工程,无力支付工程款,工程被迫中止;发包人的信誉差,不诚实,有意拖欠工程款,或对承包人的合理索赔要求不作答复,或拒不支付;发包人为了达到不支付或少支付工程款的目的,在工程中苛刻刁难承包人,滥用权力,施行罚款或扣款;发包人经常改变主意,如改变设计方案、实施方案,打乱工程施工秩序,但又不愿意给承包人以补偿等。

(3) 外界环境的风险。主要包括:在国际工程中,工程所在国政治环境的变化,如发

生战争、禁运、罢工、社会动乱等造成工程中断或终止；经济环境的变化，如通货膨胀、汇率调整、工资和物价上涨；合同所依据的法律的变化，如新的法律颁布，国家调整税率或增加新的税种，新的外汇管理政策等；自然环境的变化，如百年未遇的洪水、地震、台风等，以及工程水文、地质条件的不确定性。

(4) 合同风险。即施工合同中的一般风险条款和一些明显的或隐含着对承包人不利的条款。它们会造成承包人的损失，是进行合同风险分析的重点。具体包括：合同中明确规定的承包人承担的风险，如工程变更的补偿范围和补偿条件、合同价款的调整条件、工程范围的不确定（特别是对固定总价合同），发包人和工程师对设计、施工、材料供应的认可权及检查权、其他形式的风险条款等；合同条文的不全面、不完整等，如缺少工期拖延违约金的最高限额的条款或限额太高、缺少工期提前的奖励条款、缺少发包人拖欠工程款的处罚条款等；合同条文不清楚、不细致、不严密，如合同中对一些问题不做具体规定，仅用“另行协商解决”等字眼，再如“承包人为施工方便而设置的任何设施，均由他自己付款”中的“施工方便”即含糊不清；发包人为了转嫁风险提出的单方面约束性，过于苛刻，责权利不平衡的合同条款；其他对承包人苛刻的要求，如要承包人大量垫资承包、工期要求太紧超过常规、过于苛刻的质量要求等。

3. 建立风险清单

如果已经确认了是风险，就需将这些风险一一列出，建立一个关于本项目的风险清单。开列风险清单必须做到科学、客观、全面，尤其是不能遗漏主要风险。

8.3 工程合同的担保

担保是指承担保证义务的一方，即保证人(担保人)应债务人(被保证人或称被担保人)的要求，就债务人应对债权人(权利人)的某种义务向债权人作出的书面承诺，保证债务人按照合同规定条款履行义务和责任，或及时支付有关款项，保障债权人实现债权的信用工具。

担保制度在国际上已有很长的历史，已经形成了比较完善的法规体系和成熟的运作方式。中国的担保制度的建设是以1995年颁布的《中华人民共和国担保法》为标志的，现在已经进入了一个快速发展阶段。

担保以信用为本。所谓信用，是指一种建立在授信人对受信人偿付承诺的信任的基础上；使后者无须付现即可获取商品、服务或货币的能力。授信人以自身的财产为依据授予对方信用，受信人则以自身财产承担偿债责任为保证取得信用。对信用提供物质担保主要有两种形式：一是用受信人自身的财产提供担保，如贷款的抵押、赊购的定金；二是由第三方提供担保，如银行或担保机构提供的履约担保。前者受自身财产的限制；而后者却利用了社会信用资源，增加了担保资源，可以有效改善信用管理，降低交易费用。所以，在工程担保中大量采用的是第三方担保，也就是保证担保。

8.3.1 工程合同担保的基本概念

工程合同担保是合同当事人为了保证工程合同的切实履行，由保证人作为第三方对建

设工程中一系列合同的履行进行监管并承担相应的责任,是一种采用市场经济手段和法律手段进行风险管理的机制。在工程建设中,权利人(债权人)为了避免因义务人(债务人)原因而造成的损失,往往要求由第三方为义务人提供保证,即通过保证人向权利人进行担保。倘若被保证人不能履行其对权利人的承诺和义务,以致权利人遭受损失,则由保证人代为履约或负责赔偿。工程保证担保制度在世界发达国家已有一百多年的发展历程,已成为一种国际惯例。《世界银行贷款项目招标文件范本》、国际咨询工程师联合会 FIDIC《土木工程施工合同条件》、英国土木工程师协会 ICE 新工程合同条件(NEC)、美国建筑师协会 AIA《建筑工程标准合同》等对于工程担保均进行了具体的规定。

工程担保制度是以经济责任链条建立起保证人与建设市场主体之间的责任关系。工程承包人在工程建设中的任何不规范行为都可能危害担保人的利益,担保人为维护自身的经济利益,在提供工程担保时,必然对申请人的资信、实力、履约记录等进行全面的审核,根据被保证人的资信实行差别费率,并在建设过程中对被担保人的履约行为进行监督。通过这种制约机制和经济杠杆,可以迫使当事人提高素质、规范行为,保证工程质量、工期和施工安全。另外,承建商拖延工期、拖欠工人工资和供货商货款、保修期内不尽保修义务和设计人延迟交付图纸及业主拖欠工程款等问题光靠工程保险解决不了,必须借助于工程担保。实践证明,工程保证担保制度对规范建筑市场、防范建筑风险特别是违约风险、降低建筑业的社会成本、保障工程建设的顺利进行等方面都有十分重要和不可替代的作用。

引进并建立符合中国国情的工程保证担保制度是完善和规范我国建设市场的重要举措。

1. 担保的原则

遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

2. 担保的特征

1) 从属性

从属性是一种附随特性。担保是为了保证债权人债权的实现而设置的,所以从属于被担保的债权。被担保的债权是主债权,而主债权人对担保人享有的权利是从债权。没有主债权的存在,从债权就没有依托;主债权消灭,担保的义务也归于消灭。

2) 条件性

债权人只能在债务人不履行和不能履行债务时才能向担保人主张权利。

3) 相对独立性

担保设立须有当事人的合意,与被担保的债权的发生和成立是两个不同的法律关系。另外,根据我国《担保法》的规定,当事人可以约定担保不依附主合同而单独发生效力,也就是说,即使主债权无效,也不影响担保权的效力。

3. 担保方式

担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。

1) 保证

保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或

者承担责任的行为。

2) 抵押

抵押是指债务人或者第三人不移转对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。

3) 质押

质押是指债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有，将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。

4) 留置

留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，从将该财产折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。

5) 定金

当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

6) 反担保

第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保，也就是要求被担保人向担保人提供一份担保。反担保方式既可以是债务人提供的抵押或者质押，也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。

4. 联合担保

同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额承担保证责任。没有约定保证份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。已经承担保证责任的保证人，有权向债务人追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。

5. 担保合同的形式

担保合同可以是独立订立的保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同等的书面合同，包括当事人之间的具有担保性质的信函、传真等，也可以是主合同中的担保条款。

保函由担保银行出具，是担保人就担保事宜向权利人所作的书面承诺。国际上，工程担保一般采用见索即付的无条件保函，即保证人无需介入对被保证人违约责任的认定，只要权利人在保函的有效期内，根据有关法规及保函规定的索赔程序向担保人出示相应的索赔文件，担保人应当立即无条件地就担保金额向权利人支付索赔款项。在任何情况下，主合同双方都应提供相同类型的保函。

6. 工程保证担保

1) 保证人的资格

具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。但国家机关以及以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人，企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。

2) 保证方式

(1) 按担保的责任分

① 一般保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。

② 连带保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

(2) 按担保的主体分

① 银行担保。由银行作为担保人出具保函担保，这是最常用的担保方式。

② 担保公司担保。担保公司是经工商部门注册登记，并经政府职能部门批准设立的具有从事经济担保资格的专门担保机构。担保公司以其信誉和设立的基金为担保基础，出具的是担保保证书。

③ 同业担保。是由同行出具担保保证书的担保。同业担保的优点是可以在保证债务履行的同时，保证工程建设的正常进行。因为当债务人不履行和不能履行合同时，债权人就可以保证人身份直接接管工程，履行主债权合同。但采用同业担保方式的，应注意只有最高等级的企业才可以为同级别企业担保，否则只能为比其级别低的企业担保。

④ 母公司担保。母公司担保是特指母公司为其子公司担保。母公司担保具有同业担保相似的作用，又有很好的信任基础，可以简化资信审查手续。

⑤ 联合担保。联合担保往往出现在大型工程建设的担保中。基于对风险的承受能力，由两家或两家以上的担保人签订联合担保协议，共同对某一建设项目进行担保，出具担保保证书。

3) 保证合同的内容

(1) 被保证的主债权种类、数额。

(2) 债务人履行债务的期限。

(3) 保证的方式。

(4) 保证担保的范围。

(5) 保证的期间。

(6) 担保费用。

(7) 双方认为需要约定的其他事项。

4) 保证人的责任

(1) 保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

(2) 主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失承担连带赔偿责任；债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的 1/2。

(3) 主合同无效而导致担保合同无效，担保人无过错的，担保人不承担民事责任；担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的 1/3。

(4) 债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面

同意的, 保证人不再承担保证责任。

(5) 保证期间, 债权人依法将主债权转让给第三人的, 保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任; 债权人许可债务人转让债务的, 应当取得保证人书面同意, 保证人对未经其同意转让的债务, 不再承担保证责任。保证合同另有约定的除外。

(6) 债权人与债务人协议变更主合同的, 应当取得保证人书面同意, 未经保证人书面同意的, 保证人不再承担保证责任, 除非合同另有约定。

5) 保证人免责条件

(1) 合同当事人双方串通, 骗取保证人提供保证的。

(2) 主合同债权人采取欺诈、胁迫等手段, 使保证人在违背真实意思的情况下提供保证的。

6) 保证合同的有效期

保证合同有约定的, 依照约定; 如果保证人与债权人未约定保证期的, 保证有效期为主债务履行期届满之日起 6 个月。

7) 保证担保的费用

担保合同中应该约定在担保人承担了担保责任后, 被担保人应向担保人支付担保费用。担保费一般按担保金额的比例计取, 也可约定一个固定的金额。工程担保费用应计入工程成本, 投标人投标担保和承包商履约担保的担保费用可作为投标报价的一部分参与竞争。

7. 工程担保的内容

1) 投标担保

投标保证担保是在建设工程总承包或分包的招投标过程中, 保证人为具有合格的投标人向招标人提供的担保, 保证投标人不在投标有效期内中途撤标; 中标后与招标人签订施工合同并提供招标文件要求的履约以及预付款等保证担保。如果投标人违约, 招标人可以没收其投标保证金, 要求保证人在保函额度内予以赔偿。

2) 承包商履约担保

履约保证是指由于非业主的原因, 承包商无法履行合同义务, 保证机构应该接受该工程, 并经业主同意由其他承包商继续完成工程建设, 业主只按原合同支付工程款, 保证机构须将保证金付给业主作为赔偿。履约保证充分保障了业主依照合同条件完成工程的合法权益。

3) 承包商付款担保

付款担保是指若承包商没有根据工程进度按时支付工人工资以及分包商和材料设备供应商的相关费用, 经调查确认后由保证机构予以代付。付款保证使得业主避免了不必要的法律纠纷和管理负担。

4) 预付款担保

预付款担保是要求承包商提供的, 为保证工程预付款用于该工程项目, 不准承包商挪作他用及卷款潜逃的担保。

5) 维修担保

维修担保是为保障维修期内出现质量缺陷时, 承包商负责维修而提供的担保。维修担

保可以单列，也可以包含在履约担保内，也有采用扣留一定比例工程款作担保的。

6) 业主付款担保

业主工程款支付保证是保证人为有支付能力的业主向承包商提供的担保，保证业主按施工合同的约定向承包商支付工程款。若业主违约，保证人在保函额度内代为支付。

7) 业主责任履行担保

业主责任保证是保证人为业主履行合同约定的义务和责任而向承包商提供的担保，保证业主按合同的约定履行义务，承担责任。

8) 完工担保

完工担保是保证人为承包商按照承包合同约定的工期和质量完成工程向业主提供的担保。

我国的工程担保制度尚处在试点阶段，主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主支付担保。

8.3.2 工程投标担保

投标担保，或投标保证金，是指投标人保证其投标被接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或反悔，保证投标人一旦中标，即按招标文件的有关规定签约承包工程。否则，招标人将对投标保证金予以没收。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件可视为不响应招标而予以拒绝或作为废标处理。

1. 担保方式

投标保证金是在投标报价前或者在投标报价的同时向招标人提供的担保。投标保证金的形式有很多种，具体方式由招标人在招标文件中规定。通常的做法有如下几种：

- (1) 现金。
- (2) 支票。
- (3) 银行汇票。
- (4) 不可撤销信用证。
- (5) 银行保函。
- (6) 由保险公司或者担保公司出具投标保证书。

2. 投标担保的额度

投标担保额度为投标总价的 0.5%~5%，视工程大小及工程所在地区的经济状况，并参照当地的惯例，由招标文件规定。我国房屋和基础设施工程招标的投标保证金为投标价的 2%，但最高不超过 80 万元。

3. 担保的有效期

投标担保的有效期应超出投标有效期的 28~30 天，但在确定中标人后 3~10 天以内退还未中标人保函、担保书或定金。不同的工程可以有不同的时间规定，这些都应该在招标文件中明确。

4. 投标保证金的解除

(1) 招标文件应明确规定在确定中标人后多少天以内返还未中标人保函、担保书或定金。

(2) 中标人的投标保证金可以直接转为履约担保的一部分, 或者在其提交了履约担保并签订了承包合同之后退还。

5. 违约责任

(1) 采用银行保函或者担保公司保证书的, 除不可抗力外, 投标人在开标后和投标有效期内撤回投标文件, 或者中标后在规定时间内不与招标人签订工程合同的, 由提供担保的银行或者担保公司按照担保合同承担赔偿责任。

如果是收取投标保证金的, 除不可抗力外, 投标人在开标后的有效期内撤回投标文件, 或者中标后在规定时间内不与招标人签订工程合同的, 招标人可以没收其投标保证金; 实行合理低价中标的, 还可以要求按照与第二标投标报价的差额进行赔偿。

(2) 除不可抗力因素外, 招标人不与中标人签订工程合同的, 招标人应当按照投标保证金的2倍返还中标人。给对方造成损失的, 依法承担赔偿责任。

8.3.3 承包商履约担保

履约担保是为保障承包商履行承包合同义务所作的一种承诺, 这是工程担保中最重要的也是担保金额最大的一种工程担保。

1. 担保方式

承包商履约担保可以采用银行保函、担保公司担保书和履约保证金的方式, 也可以采用同业担保方式, 由实力强、信誉好的承包商为其提供履约担保, 还应当遵守国家有关企业之间提供担保的有关规定, 不允许两家企业互相担保或者多家企业交叉担保。

2. 担保额度

采用履约担保金方式(包括银行保函)的履约担保额度为(……合同价的……)5%~10%; 采用担保书和同业担保方式的一般为合同价的10%~15%。

3. 履约担保责任方式

采用银行保函担保的, 当承包商由于非业主的原因而不履行合同义务时, 一般都是由担保人在担保额度内对业主损失支付赔偿。采用担保公司或同业担保书担保的, 当承包商由于非业主的原因而不履行合同义务时, 应由担保人向承包商提供资金、设备或者技术援助, 使其能继续履行合同义务; 或直接接管该项工程, 代位履行合同义务; 或另觅经业主同意的其他承包商, 继续履行合同义务; 或按照合同约定, 在担保额度范围内, 对业主的损失支付赔偿。

采用履约保证金的, 中标人不履行合同的, 履约保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过履约保证金数额的, 应当对超过部分予以赔偿; 履约保证金可以是现金也可以是支票、银行汇票或银行保函。

4. 履约担保的有效期

承包商履约担保的有效期应当截止到承包商根据合同完成了工程施工并经竣工验收合

格之日。业主应当按承包合同约定在承包商履约担保有效期截止日后若干天之内退还承包商的履约担保。

5. 履约担保的索取

为了防止业主恶意支取承包商的履约担保金，一般在合同中规定在任何情况下，业主就承包商履约担保向保证人提出索赔之前，应当书面通知承包商，说明导致索赔的违约性质，并得到项目总监理工程师及其监理单位对索赔理由的书面确认。

6. 履约担保的递补

承包商在业主就其履约担保索赔了全部担保金额之后，应当向业主重新提交同等担保金额的履约担保，否则业主有权解除承包合同，由承包商承担违约责任。若剩余合同价值已不足原担保金额，则承包商重新提交的履约担保的担保金额以不低于剩余合同价值为限。

8.3.4 预付款担保

预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但须由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。

1. 担保方式

1) 银行保函

预付款担保的主要形式即银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。

2) 发包人与承包人约定的其他形式

预付款担保也可由保证担保公司担保，或采取抵押等担保形式。

2. 担保额度

预付款担保额度与预付款数额相同，但其担保额度应随投标人返还的金额而逐渐减少。预付款不计利息。

3. 预付款担保的作用

预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿。

4. 预付款担保有效期

发包人将按合同专用条款中规定的金额和日期向承包人支付预付款。预付款保函应在预付款全部扣回之前保持有效。

8.3.5 业主支付担保

业主支付担保是指应承包人的要求,发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付业务的担保。业主支付担保对于解决我国普遍存在的拖欠工程款现象是一项有效的措施。

1. 担保方式与额度

业主应当在签订工程承包合同时,向承包商提交支付担保,担保金额应当与承包商履约担保的金额相等。业主可以采用银行保函或者担保公司担保书的方式,小型工程项目也可以由业主依法实行抵押或者质押担保。

2. 担保有效期

业主支付担保的有效期应当截止到业主根据合同约定完成了除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日,承包商应当按合同约定在业主支付担保有效期截止日后若干天内退还业主的支付担保。

3. 担保的索付

在任何情况下,承包商就业主支付担保向保证人提出索赔之前,应当书面通知业主,说明导致索赔的原因。

4. 业主支付担保的递补

业主在承包商就其支付担保索赔了全部担保金额之后,应当及时向承包商重新提交同等担保金额的支付担保,否则承包商有权解除承包合同,由业主承担违约责任。若剩余合同价值已不足原担保金额,则业主重新提交的支付担保的担保金额以不低于剩余合同价值为限。

8.4 工程合同的保险

8.4.1 保险概述

保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。

保险市场的主体由保险人、投保人以及保险代理人、保险经纪人和保险公估人构成。保险人是指与投保人订立保险合同,并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司;投保人是与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人;保险代理人是根据保险人的委托,向保险人收取代理手续费,并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位或者个人;保险经纪人是基于投保人的利益,为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务,并依法收取佣金的单位;保险公估人是指经中国保险监督管理委员会批准,依照本规定设立,专门从事保险标的评估、勘验、鉴定、估损、理算等业务,并据此向保险当事人合理收取费用的公司。

保险合同是投保人与保险人在公平互利、协商一致、自愿且不损害社会公共利益的原则下约定保险权利义务关系的协议。除法律、行政法规规定必须保险的以外，保险公司和其他单位不得强制他人订立保险合同。合同的最重要内容是保险标的、保险额和保险费。保险标的是保险保障的目标和实体，指保险合同双方当事人权利和义务所指向的对象，可以是财产或是与财产有关的利益或责任，也可以是人的生命或身体。保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额，是投保时给保险标的确定的金额，又是保险人计收保险费的依据和承担给付责任的最高限额。保险费简称保费，是投保人为转嫁风险支付给保险人的与保险责任相应的代价，通常是按保险金额与保险费率的乘积来计收，也可按固定金额收取。

保险合同中，投保人对保险标的必须具有明确的保险利益，否则保险合同无效。如果投保人通过故意虚构保险标的、未发生保险事故而谎称发生保险事故、故意造成财产损失的保险事故、故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病等人身保险事故，或伪造、变造与保险事故有关的证明、资料和其他证据，或者有指使、唆使、收买他人提供虚假证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度等骗取保险金的行为，属于保险欺诈活动，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

我国保险法规定，从事保险活动必须遵循自愿、诚实信用以及开展保险业务公平竞争的原则，同时还体现了以下原则：

1. 保险利益原则

保险利益原则是指保险合同的有效成立，必须建立在投保人对保险标的具有保险利益的基础上。而保险利益是指投保人对保险标的具有法律上承认并为法律所保护、可以用货币计算和估价、经济上已经确认或能够确认的利益。

2. 损失补偿原则

损失补偿原则是指在补偿性的保险合同中，当保险事故发生造成保险标的或被保险人损失时，保险人给予被保险人的赔偿数额，不能超过被保险人所遭受的经济损失。

3. 保险近因原则

保险关系上的近因是指造成损失的最直接、最有效的起主导作用或支配性作用的原因，而不是指在时间上或空间上与损失最接近的原因。近因原则是指危险事故的发生与损失结果的形成，须有直接的因果关系，保险人才对发生的损失补偿责任。

4. 重复保险的分摊原则

重复保险的分摊原则是指投保人对同一标的、同一保险利益、同一保险事故分别向两个以上保险人订立保险合同的重复保险，其保险金额的总和往往超过保险标的的实际价值，当发生事故时，按照补偿原则，只能由这几个保险人根据不同比例分摊此金额，而不能由几个保险人各自按实际保险金额赔偿，以免造成重复赔款。

按保险标的保险可分为财产保险(包括财产损失保险、责任保险、信用保险等)和人身保险(包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等)两大类，而工程保险既涉及到财产保险，又涉及到人身保险。

8.4.2 工程合同保险的基本概念

工程合同保险是对以工程建设过程中所涉及的财产、人身和建设各方当事人之间权利义务关系为对象的保险的总称；是对建筑工程项目、安装工程项目及工程中的施工机器、设备所面临的各种风险提供的经济保障；是业主和承包商为了工程项目的顺利实施，以建设工程项目，包括建设工程本身、工程设备和施工机具以及与之有关的人作为保险对象，向保险人支付保险费，由保险人根据合同约定对建设过程中遭受自然灾害或意外事故所造成的财产和人身伤害承担赔偿责任的一种保险形式。投保人将威胁自己的工程风险通过按约向保险人交纳保险费的办法转移给保险人(保险公司)，如果事故发生，投保人可以通过保险公司取得损失赔偿，以保证自身免受损失。

1. 工程合同保险单保障范围

工程保险承保的保障范围包括因保险责任范围内的自然灾害和意外事故及工人、技术人员的疏忽、过失等造成的保险工程项目物质财产损失及列明的费用，在工地施工期间内对第三者造成的财产损失或人身伤害而依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。由于工程项目本身涉及多个利益方，凡是对工程保险标的具有可保利益者，都对工程项目承担不同程度的风险，均可以从工程保险单项下获得保险保障。本保险的保险金额可先按工程项目的合同价或概算拟定，工程竣工后再按工程决算数调整。

2. 工程合同保险的分类

1) 按保险标的分类

工程保险按保险标的的分类可以分为建筑工程一切险、安装工程一切险、机器损失保险和船舶建造险。

2) 按工程建设所涉及的险种分类

(1) 建筑工程一切险

公路、桥梁、电站、港口、宾馆、住宅等工业建筑、民用建筑的土木建筑工程项目均可投保建筑工程一切险。

(2) 安装工程一切险

机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目均可投保安装工程一切险。

(3) 第三方责任险

该险种一般附加在建筑工程(安装工程)一切险中，承保的是施工造成的工程、永久性设备及承包商设备以外的财产和承包商雇员以外的人身损失或损害的赔偿责任。保险期为保险生效之日起到工程保修期结束。

(4) 雇主责任险

该险种是承包商为其雇员办理的保险，承保承包商应承担的其雇员在工程建设期间因与工作有关的意外事件导致伤害、疾病或死亡的经济赔偿责任。

(5) 承包商设备险

承包商在场所所拥有的(包括租赁的)设备、设施、材料、商品等，只要没有列入工程一切险标的范围的都可以作为财产保险标的，投保财产险。这是承包商财产的保障，一般应由承包商承担保费。

(6) 意外伤害险

意外伤害险是指被保险人在保险有效期间因遭遇非本意、外来的、突然的意外事故，致使其身体蒙受伤害而残疾或死亡时，由保险人依照保险合同规定付给保险金的保险。意外伤害险可以由雇主为雇员投保，也可以由雇员自己投保。

(7) 执业责任险

执业责任险是以设计人、咨询商(监理人)的设计、咨询错误或员工工作疏漏给业主或承包商造成的损失为保险标的险种。

3) 按主动性、被动性分类

工程保险按主动性和被动性，可分为强制性保险和自愿保险两类。

(1) 强制性保险

所谓强制性保险是指根据国家法律法规和有关政策规定或投标人按招标文件要求必须投保的险种，如在工业发达国家和地区，强制性的工程保险主要有建筑工程一切险(附加第三者责任险)、安装工程一切险(附加第三者责任险)、社会保险(如人身意外险、雇主责任险和其他国家法令规定的强制保险)、机动车辆险、10年责任险和5年责任险、专业责任险等。

(2) 自愿保险

自愿保险是由投保人完全自主决定投保的险种，如在国际上常被列为自愿保险的工程保险主要有国际货物运输险、境内货物运输险、财产险、责任险、政治风险保险、汇率保险等。

4) 按单项、综合投保分类

(1) 单项保险

单项保险是在一个工程项目的多个可保标的中对其中一个标的进行投保，以及对多个标的分别投保的方式。

(2) CIP 保险

CIP 是英文 Controlled Insurance Programs 的缩写，有人译为受控保险计划，也有人翻译为投保工程一切险，其实质是“揽子保险”。CIP 保险的基本运行机制是在工程承包合同中明确规定，由业主或承包商统一购买“揽子保险”，保障范围覆盖业主、承包商及所有分包商，内容包括了劳工赔偿、雇主责任险、一般责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险。

在 CIP 保险模式下，工程项目的保险商在工程现场设置安全管理顾问，指导项目的风险管理，并向承包商、分包商提供风险管理程序和管理指南。业主、承包商和分包商要制定相关的防损计划和事故报告程序，并在安全管理顾问的严格监督下实施。CIP 保险具有以下优点：

① CIP 保险以最优的价格提供最佳的保障范围。因为 CIP 保险的“揽子保险计划”，覆盖了工程项目的业主、承包商、分包商在工程进展过程中的几乎所有相关风险，避免了各个承包商、分包商分别购买保险时可能出现的重复保险和漏保，对业主来说，可以通过避免重复保险，争取大保单的优惠保险费率，降低工程造价。

② 能实施有效的风险管理。由于 CIP 保险设置了安全管理顾问，采用了一致的安全计划和措施，制定和执行了现场指导、监督防损计划和事故报告程序，从而实现了对项目

风险管理适时的、有效的监控,可以有效地减少或杜绝损失事故的发生,保障建设项目目标的实现。

③ 降低赔付率,进而降低保险费率。CIP 保险实行专业化的、实时动态的、全面的安全管理,能够最大限度地避免风险事故的发生,降低保险人的赔付率,增进其经济效益。所以 CIP 保险可以比普通保险更低的保险费率承保,为投保人节约保险费支出。

④ 避免诉讼,便于索赔。在有多个承保人的传统保险方式下,当损失发生时,为了确定损失事故的最终责任,各个承包商、各个承保人之间往往相互推诿责任,极易导致诉讼。而 CIP 保险模式下只有唯一的承保人,所以能避免这种情况的发生。同时,由于保险人有安全管理顾问介入工程项目的风险管理,对保险人迅速而正确地理赔创造了有利条件。

3. 国际上工程合同保险的特点

- (1) 由保险经纪人在保险业务中充当重要角色。
- (2) 健全的法律体系,为工程保险发展提供了保障。
- (3) 投保人与保险商通力合作,有效控制了意外损失。
- (4) 保险公司返赔率高,利润率低。

8.4.3 工程合同保险条款的主要内容

1. 自然灾害与意外事故的定义

1) 自然灾害

指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉以及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。

2) 意外事故

指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件,包括火灾和爆炸。

2. 物质损失的定义及赔偿限额

1) 定义

保险单明细表中分项列明的保险财产在列明的土地范围内,因保险单除外责任以外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失(包括物质的损坏或损失),以及由于保险单列明的原因发生上述损失所产生的有关费用,按保险单的规定负责赔偿。

2) 赔偿限额

每一保险项目的赔偿责任均不得超过保险单所列明的相应分项保险金额,且在任何情况下,在保险单下承担的对物质损失的最高赔偿责任不得超过保险单总保险金额。

3. 第三方责任的定义及赔偿限额

1) 定义

在保险期限内,因发生与保险单所承保工程直接相关的意外事故引起土地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任,按合同条款的规定赔偿。

2) 赔偿限额

只能对被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用赔偿,且对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准。在任何情况下,均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额,且在保险单项下对上述经济赔偿的最高赔偿责任不得超过保险单列明的累计总额。

4. 除外责任

1) 总除外责任

(1) 战争、类似战争行为、敌对行为、武装冲突、恐怖活动、谋反、政变引起的任何损失、费用和责任。

(2) 政府命令或任何公共当局的没收、征用、销毁或毁坏。

(3) 罢工、暴动、民众骚乱引起的任何损失、费用和责任。

(4) 被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失、费用和责任。

(5) 核裂变、核聚变、核武器、核材料、核辐射及放射性污染引起的任何损失、费用和责任。

(6) 大气、土地、水污染及其他各种污染引起的任何损失、费用和责任。

(7) 工程部分停工或全部停工引起的任何损失、费用和责任。

(8) 罚金、延误、丧失合同及其他后果损失。

(9) 保险单明细表或有关条款中规定的应由被保险人自行负担的免赔额。

2) 物质损失的除外责任

(1) 因设计错误、工艺不善及材料缺陷引起损失及费用。

(2) 由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失。

(3) 施工用机具、设备、机器装置失灵造成的本身损失。

(4) 自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或温度)变化、正常水位变化或其他渐变原因所造成的损失和费用。

(5) 维修保养或正常检修的费用。

(6) 档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。

(7) 盘点时发现的短缺。

(8) 领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。

(9) 在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失。

(10) 在保险单保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。

3) 第三方责任的除外责任

(1) 保险单物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用。

(2) 工程所有人、承包人或其他关系方或他们所雇用的在工地现场从事与工程有关工作的职员、工人以及他们的家庭成员的人身伤亡或疾病。

(3) 工程所有人、承包人或其他关系方或他们所雇用的职员、工人所有的或由其照管、

控制的财产发生的损失。

(4) 领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、飞机造成的事故。

(5) 被保险人根据与他人的协议应支付的赔偿或其他款项，但即使没有这种协议，被保险人仍应承担的责任不在此限。

5. 保险金额

1) 保险单明细表中列明的保险金额应不低于被保险工程安装完成时的总价值(包括设备费用、原材料费用、安装费、建造费、运输费和保险费、关税、其他税项和费用)，以及由工程所有人提供的原材料和设备费用；施工用机器、装置和机器设备按重置同型号、同负载的新机器、装置和机械所需费用；或其他保险项目由被保险人与保险人商定的金额。

2) 若被保险人是以保险工程合同规定的工程概算总造价投保，被保险人应在本保险项目下工程造价中包括的各项费用因涨价或升值原因而超出原被保险工程造价时，必须尽快以书面形式通知保险人，保险人据此调整保险金额；在保险期限内对相应的工程细节作出精确记录，并允许保险人在合理的时候对该项记录进行查验；若保险工程的安装期超过3年，必须从保险单生效日起每隔12个月向保险人申报当时的工程实际投入金额及调整后的工程总造价，保险人将据此调整保险费；在保险单列明的保险期限届满后3个月内向保险人申报最终的工程总价值，保险人据此以多退少补的方式对预收保险费进行调整，否则，保险人将视为保险金额不足，一旦发生保险责任范围内的损失时，保险公司将根据保险条款的规定对各种损失按比例赔偿。

6. 保险期限

1) 建筑期(安装期)物质损失及第三者责任保险期限

(1) 保险人的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之日起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，建筑期(安装期)保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

(2) 不论保险的安装设备在有关合同中对试车和考核期如何规定，保险人仅在保险单明细表中列明的试车和考核期限内对试车和考核所引发的损失、费用和责任负责赔偿；若保险设备本身是在本次安装前已被使用过的设备或转手设备，则自其试车之时起，保险人对该项设备的保险责任即行终止。

(3) 上述保险期限的展延，须事先获得保险人的书面同意，否则，从保险单明细表中列明的建筑期保险期限终止日起至保证期终止日止，期间内发生的任何损失、费用和责任，保险人不负责赔偿。

2) 保证期物质损失保险期限

保证期的保险期限与工程合同中规定的保证期一致，从工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程时起算，以先发生者为准。在任何情况下，保证期的保险期限不得超出保险单明细表中列明的保证期。

7. 赔偿处理

1) 对保险财产遭受的损失, 保险人可选择以支付赔款或以修复、重置受损项目的方式予以赔偿, 但对保险财产在修复或重置过程中发生的任何变更、性能增加或改进所产生的额外费用, 保险人不负责赔偿。

2) 在发生保险单物质损失项下的损失后, 保险人按下列方式确定赔偿金额:

(1) 可以修复的部分损失, 以将保险财产修复至其基本恢复受损前状态的费用扣除残值后的金额为准。但若修复费用等于或超过保险财产损失前的价值时, 则按全部损失或推定全损处理。

(2) 全部损失或推定全损, 以保险财产损失前的实际价值扣除残值后的金额为准, 但保险人有权不接受被保险人对受损财产委付。

(3) 任何属于成对或成套的设备项目, 若发生损失, 保险人的赔偿责任不超过该受损项目在所属整对或整套设备项目的保险金额中所占的比例。

(4) 发生损失后, 被保险人为减少损失而采取必要措施所产生的合理费用, 保险人可予以赔偿, 但本项费用以保险财产的保险金额为限。

3) 保险人赔偿损失后, 由保险人出具批单将保险金额从损失发生之日起相应减少, 并且不退还保险金额减少部分的保险费。如被保险人要求恢复至原保险金额, 应按约定的保险费率补缴恢复部分从损失发生之日起至保险期限终止之日止, 按日比例计算的保险费。

4) 在发生保险单第三者责任项下的索赔时:

(1) 未经保险人书面同意, 被保险人或其代表对索赔方不得作出任何责任承诺或拒绝、出价约定、付款或赔偿。必要时, 保险人有权以被保险人的名义接办对任何诉讼的抗辩或索赔的处理。

(2) 保险人有权以被保险人的名义, 为保险人的利益自付费用向任何责任方提出索赔的要求。未经保险人书面同意, 被保险人不得接受责任方就有关损失作出的付款或赔偿安排或放弃对责任的索赔权利, 否则, 由此引起的后果将由被保险人承担。

(3) 在诉讼或处理索赔过程中, 保险人有权自行处理任何诉讼或解决任何索赔案件, 被保险人有义务向保险人提供一切所需的资料和协助。

(4) 被保险人的索赔期限, 从损失发生之日起, 不得超过 2 年。

8. 被保险人的义务

(1) 在投保时, 被保险人及其代表应对投保申请书中列明的事项以及保险人提出的其他事项作出真实、详尽的说明或描述。

(2) 被保险人或其代表应根据保险单明细表和批单中的规定按期缴付保险费。

(3) 在本保险期限内, 被保险人应采取一切合理的预防措施, 包括认真考虑并付诸实施保险人代表提出的合理的防损建议, 谨慎选用施工人员, 遵守一切与施工有关的法规和安全操作规程, 由此产生的一切费用, 均由被保险人承担。

(4) 在发生引起或可能引起保险单项下索赔的事故时, 被保险人或其代表应该采取以下措施:

① 立即通知保险人, 并在 7 天内或经保险人书面同意延长的期限内以书面报告提供事故发生的经过、原因和损失程度。

② 采取一切必要措施防止损失的进一步扩大并将损失减少到最低程度。

③ 在保险人代表或检验师进行勘查之前,保留事故现场及有关实物证据。

④ 在保险财产遭受盗窃或恶意破坏时,立即向公安部门报案。

⑤ 在预知可能引起诉讼时,立即以书面形式通知保险人,并在接到法院传票或其他法律文件后,立即将其送交保险人。

⑥ 根据保险人的要求提供作为索赔依据的所有证明文件、资料和单据。

(5) 若在某一保险财产中发现的缺陷表明或预示类似缺陷亦存在于其他保险财产中时,被保险人应立即自付费用进行调查并纠正该缺陷。否则,由类似缺陷造成的一切损失应由被保险人自行承担。

9. 总则

1) 保单效力

被保险人严格地遵守和履行保险单的各项规定,是保险人在保险单项下承担赔偿责任的先决条件。

2) 保单无效

如果被保险人或其代表漏报、错报、虚报或隐瞒有关保险的实质性内容,则保险单无效。

3) 保单终止

除非经保险人书面同意,保险单将在下列情况下自动终止:

(1) 被保险人丧失保险利益。

(2) 承担风险扩大。

保险单终止后,保险人将退还被保险人保险单项下未到期部分的保险费。

4) 权益丧失

如果任何索赔含有虚假成分,或被保险人或其代表在索赔时采取欺诈手段企图在保险单项下获取利益,或任何损失是由被保险人或其代表的故意行为或纵容所致,被保险人将丧失其在保险单项下的所有权益。对由此产生的包括保险人已支付的赔款在内的一切损失,应由被保险人负责赔偿。

5) 合理查验

保险人的代表有权在任何适当时候对保险财产的风险情况进行现场查验,被保险人应提供一切便利及保险人要求的用以评估有关风险的详情和资料。

6) 比例赔偿

在发生本保险物质损失项下的损失时,若受损保险财产的分项或总保险金额低于对应的应保险金额,其差额部分视为被保险人所自保,保险人则按保险单明细表中列明的保险金额与应保险金额的比例负责赔偿。

7) 重复保险

保险单负责赔偿损失、费用或责任时,若另有其他保障相同的保险存在,不论是否由被保险人或他人以其名义投保,也不论该保险赔偿与否,保险人仅负责按比例分摊赔偿的责任。

8) 权益转让

若保险单项下负责的损失涉及其他责任方时,不论保险人是否已赔偿被保险人,被保险人应立即采取一切必要的措施行使或保留向该责任方索赔的权利。在保险人支付赔款后,被保险人应向该责任方追偿的权利转让给保险人,移交一切必要的单证,并协助保险人向责任方追偿。

9) 争议处理

被保险人与保险人之间的一切有关保险的争议应通过友好协商解决,如果协商不成,可以申请仲裁机关仲裁或向法院提出诉讼。

8.4.4 工程合同保险的投保

1. 投保程序

1) 选择保险顾问或保险经纪人。

2) 确定投保方式和投保发包方式。

投保方式是指一揽子投保还是分别投保,是业主投保还是承包商投保,或者是各自投保。

投保发包方式是指通过招标投标还是直接询价投保。

3) 准备有关承保资料,提出保险要求,如果采取保险招标,则应准备招标文件。

(1) 承保资料

为了对项目风险进行准确的评估,保险人通常需要投保人提供与工程有关的文件、图纸和资料,包括工程地质水文报告、地形图、工程设计文件和工程造价文件、工程合同、工程进度表以及有关业主的情况、投资额多少、资金来源、承包方式、施工单位资料等。

(2) 保险要求

保险要求是投保人对保险安排的设计,主要解决保什么,怎么保。保险人在对工程项目评估后就可根据投保人的保险要求设计保险方案。所以,保险方案是投保人的要求和保险人的承保计划的体现,主要包括:

- ① 保险责任范围。
- ② 建筑工程项目,各分项保险金额及总保额。
- ③ 物质损失免赔额及特种危险的赔偿限额。
- ④ 安装项目及其名称、价值和试车期。
- ⑤ 是否投保施工、安装机具设备,其种类和重置价值。
- ⑥ 是否投保场地清理费和现有建筑物及其保额。
- ⑦ 是否加保保证期,其种类、期限。
- ⑧ 是否投保第三者责任险,赔偿限额和免赔额。
- ⑨ 其他特别附加条款。

(3) 保险招标文件

当确定采用招标选择保险人时,招标文件编写就是选择保险人最关键的工作。

主要的内容有:

- ① 保险标的(保险项目清单)及保险金额。
- ② 保险费的计算方法。

- ③ 投标资格要求。
- ④ 投保人要求。
- ⑤ 评标标准与方法。
- ⑥ 保险合同条款。一般都采用标准的文本。
- (4) 将有关资料发给国内保险公司并要求报价,如采取招标方式,发售招标文件。
- (5) 谈判或经过开标、评标选定保险人。
- (6) 填写投保申请表或投保单。
- (7) 就保单的一些细节进行最后商定。
- (8) 双方签署保险单。

2. 选择保险人应考虑的因素

投保人应从安全的角度出发,全盘考虑保险安排的科学性,以合理的保费支出,寻求可靠的保险保障。对保险人的选择主要应考虑以下几个方面:

- (1) 保险人的资信、实力。
- (2) 风险管理水平。
- (3) 同类工程项目的管理经验。
- (4) 保险服务。
- (5) 技术水平。
- (6) 费率水平及分保条件。

3. 保险合同的构成

1) 投保申请书或投保单

有的险种习惯于使用投保申请书,有的险种习惯于使用投保单。

投保申请书、投保单主要内容包括投保人、工程关系各方、被保险人、工程建设地点、建设工期、建设地的地质水文资料以及建设工程的详细情况、投保保险标的(清单)以及相应的投保金额、随申请附的资料等。由投保人如实和尽可能详尽地填写并签字后作为向保险公司投保建筑、安装工程险的依据。投保申请书(投保单)为工程保单的组成部分。投保申请书(投保单)在未经保险公司同意或未签发保险单之前不发生保险效力。

2) 保险单

保险单一般由保险公司提供标准格式,每个险种都有其相应的标准格式。主要内容是确认的投保人、被保险人和保险人,工程建设地点、建设工期、建设现状,保险险种、保险标的(清单)、保险金额、保险费,特殊保险内容的约定。

保险公司根据投保人投保申请书(投保单),在投保人缴付约定的保险费后,同意按保险单条款、附加条款及批单的规定以及明细表所列项目及条件承保约定的险种。投保申请书(投保单)为保险单的组成部分。

3) 保险条款

保险条款是规定保险合同双方权利义务的法律文件,一般使用标准文本。目前使用的保险条款是中国人民保险公司编制的,常用的有建筑工程一切险保险条款和安装工程一切险保险条款。

4. 保险合同的内容

- (1) 投保人名称和住所。
- (2) 投保人、被保险人名称和住所, 以及人身保险的受益人的名称和住所。
- (3) 保险标的。
- (4) 保险责任和责任免除。
- (5) 保险期间和保险责任开始时间。
- (6) 保险价值。
- (7) 保险金额。
- (8) 保险费以及支付办法。
- (9) 保险金赔偿或者给付办法。
- (10) 违约责任和争议处理。

8.5 工程合同的风险管理

8.5.1 工程合同的风险管理

1. 风险识别

工程项目建设过程存在着风险, 管理者的任务就是防范、化解与控制这些风险, 使之对项目目标产生的负面影响最小。知己知彼, 方能百战不殆。要做好风险的处置, 首先就要了解风险, 了解其产生的原因及其后果, 才能有的放矢地进行处置。风险识别是指找出影响项目安全、质量、进度、投资等目标顺利实现的主要风险, 这既是项目风险管理的第一步, 也是最重要的一步。这一阶段主要侧重于对风险的定性分析。风险识别应从风险分类、风险产生的原因入手。

风险识别步骤如下所示。

(1) 项目状态的分析

这是一个将项目原始状态与可能状态进行比较及分析的过程。项目原始状态是指项目立项、可行性研究及建设计划中的预想状态, 是一种比较理想化的状态; 可能状态则是基于现实、基于变化的一种估计。比较这两种状态下的项目目标值的变化, 如果这种变化是恶化的, 则为风险。

理解项目原始状态是识别项目风险的基础。只有深刻理解了项目的原始状态, 才能正确认定项目执行过程中可能发生的状态变化, 进而分析状态的变化可能导致的项目目标的不确定性。

(2) 对项目进行结构分解

通过对项目的结构分解, 可以使存在风险的环节和子项变得容易辨认。

(3) 历史资料分析

通过对以前若干个相似项目情况的历史资料分析, 有助于识别目前项目的潜在风险。

(4) 确认不确定性的客观存在

风险管理者不仅要辨识所发现或推测的因素是否存在不确定性,而且要确认这种不确定性是客观存在的,只有符合这两个条件的因素才可以视作风险。

2. 风险评估

风险评估是指采用科学的评估方法将辨识并经分类的风险进行评估,再根据其评估值大小予以排队分级,为有针对性、有重点地管理好风险提供科学依据。风险评估的对象是项目的所有风险,而非单个风险。风险评估可以有许多方法,如方差与变异系数分析法、层次分析法(简称 AHP 法)、强制评分法及专家经验评估法等。经过风险评估,将风险分为几个等级,如重大风险、一般风险、轻微风险、没有风险。

对于重大风险要进一步分析其原因和发生条件,采取严格的控制措施或将其转移,即使多付出些代价也在所不惜;对于一般风险,只要给予足够的重视即可,当采取化解措施时,要较多地考虑成本费用因素;对于轻微风险,只要按常规管理就可以了。

3. 风险的处置

风险处置就是根据风险评估以及风险分析的结果,采取相应的措施,也就是制定并实施风险处置计划。通过风险评估以及风险分析,可以知道项目发生各种风险的可能性及其危害程度,将此与公认的安全指标相比较,就可确定项目的风险等级,从而决定应采取什么样的措施。在实施风险处置计划时应随时将变化了的情况反馈,以便能及时地结合新的情况对项目风险进行预测、识别、评估和分析,并调整风险处置计划,实现风险的动态管理,使之能适应新的情况,尽量减少风险所导致的损失。

常用的风险处置措施主要有 4 种。

1) 风险回避

风险回避就是在考虑到某项目的风险及其所致损失都很人时,主动放弃或终止该项目以避免与该项目相联系的风险及其所致损失的一种处置风险的方式。它是一种最彻底的风险处置技术,在风险事件发生之前将风险因素完全消除,从而完全消除了这些风险可能造成的各种损失。

风险回避是一种消极的风险处置方法,因为再人的风险也都只是一种可能,既可能发生,也可能不发生。采取回避,当然是能彻底消除风险,但同时也失去了实施项目可能带来的收益,所以这种方法一般只在存在以下情况之一时才会采用:

- (1) 某风险所致的损失频率和损失幅度都相当高。
- (2) 应用其他风险管理方法的成本超过了其产生的效益时。
- 2) 风险控制

对损失小、概率人的风险,可采取控制措施来降低风险发生的概率,当风险事件已经发生则尽可能降低风险事件的损失,也就是风险降低。所以,风险控制就是为了最大限度地降低风险事故发生的概率和减小损失幅度而采取的风险处置技术。为了控制工程项目的风险,首先要对实施项目的人员进行风险教育以增强其风险意识,同时采取相应的技术措施。

(1) 根据风险因素的特性,采取一定措施使其发生的概率降至接近于零,从而预防风险因素的产生。

- (2) 减少已存在的风险因素。
- (3) 防止已存在的风险因素释放能量。
- (4) 改善风险因素的空间分布从而限制其释放能量的速度。
- (5) 在时间和空间上把风险因素与可能遭受损害的人、财、物隔离。
- (6) 借助人为设置的物质障碍将风险因素与人、财、物隔离。
- (7) 改变风险因素的基本性质, 加强风险部门的防护能力。
- (8) 做好救护受损人、物的准备。
- (9) 制定严格的操作规程, 减少错误的作业造成不必要的损失。

风险控制是一种最积极、最有效的处置方式, 它不仅能有效地减少项目由于风险事故所造成的损失, 而且能使全社会的物质财富少受损失。

3) 风险转移

对损失大、概率小的风险, 可通过保险或合同条款将责任转移。风险转移是指借用合同或协议, 在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方。风险转移主要有两种方式, 即保险风险转移和非保险风险转移。

(1) 保险风险转移

保险是最重要的风险转移方式, 是指通过购买保险的办法将风险转移给保险公司或保险机构。

(2) 非保险风险转移

非保险风险转移是指通过保险以外的其他手段将风险转移出去。非保险风险转移主要有:

- ① 担保合同。
- ② 租赁合同。
- ③ 委托合同。
- ④ 分包合同。
- ⑤ 无责任约定。
- ⑥ 合资经营。
- ⑦ 实行股份制。

通过转嫁方式处置风险, 风险本身并没有减少, 只是风险承担者发生了变化, 因此转移出去的风险, 应尽可能让最有能力的承受者分担, 否则就有可能给项目带来意外的损失。

保险和担保是风险转移最有效、最常用的方法, 是工程合同履约风险管理的重要手段, 也是符合国际上惯例的做法。工程保险着重解决“非预见的意外情况”, 包括自然灾害或意外事故造成的物质损失或人身伤亡。工程担保着重解决“可为而不可为”, 用市场化的方式来解决合同约定问题; 工程担保属于工程保障机制的范畴; 通过工程担保, 在被担保人违约、失败、负债时, 债权人的权益得到保障。这是保险和担保最重要、最根本的区别。另外, 工程保证担保中, 保证人要求被保证人签订一项赔偿协议, 在被保证人不能完成合同时, 被保证人须同意赔偿保证人因此而造成的由保证人代为履约时所需支付的全部费用; 而在工程保险中, 作为保险人的保险公司将按期收取一定数额的保险费, 事故发生后, 保险公司负担全部或部分费用, 投保人无需再作任何补偿。在工程保证担保中, 保证人所承担的风险小于被保证人, 只有当被保证人的所有资产都付给保证人后, 仍然无法还清保证

人代为履约所支付的全部费用时,保证人才会蒙受损失;而在工程保险中,保险人(保险公司)作为唯一的责任者,将为投保人所造成的事故负责,与工程保证担保相比,保险人所承担的风险明显增加。

4) 风险保留

对损失小、概率小的风险留给自己承担,这种方法通常在下列情况下采用:

- (1) 处理风险的成本大于承担风险所付出的代价。
- (2) 预计某一风险造成的最大损失项目可以安全承担。
- (3) 当风险降低、风险控制、风险转移等风险控制方法均不可行时。
- (4) 没有识别出风险,错过了采取积极措施处置的时机。

综上所述,不难看出风险保留有主动保留和被动保留之分。主动保留是指在对项目风险进行预测、识别、评估和分析的基础上,明确风险的性质及其后果,风险管理者认为主动承担某些风险比其他处置方式更好,于是筹措资金将这些风险保留,如前3种情况。被动保留则是指未能准确识别和评估风险及损失后果的情况下,被迫采取自身承担后果的风险处置方式。被动保留是一种被动的、无意识的处置方式,往往造成严重的后果,使项目遭受重大损失。被动保留是管理者应该力求避免的。

8.5.2 承包人的风险管理

1. 承包人风险管理的主要内容

(1) 合同签订前对风险做全面分析和预测。主要考虑如下问题:工程实施过程中可能出现的风险类型、种类;风险发生的规律,如发生的可能性、发生的时间及分布规律;风险的影响,即风险发生,对承包人的施工过程、工期、成本等有哪些影响;承包人要承担哪些经济和法律的责任等;各种风险之间的内在联系,如一起发生或伴随发生的可能性。

(2) 对风险采取有效的对策和计划。即考虑如果风险发生应采取什么措施予以防止,或降低它的不利影响,为防范风险做组织、技术、资金等方面的准备。

(3) 在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效控制。包括采取措施防止或避免风险的发生;有效地转移风险,争取让其他方承担风险造成的损失;降低风险的不利影响,减少自己的损失;在风险发生的情况下进行有效决策,对工程施工进行有效控制,保证工程项目的顺利实施。

2. 承包人的合同风险对策

(1) 在报价中考虑。主要包括:提供报价中的不可预见风险费;采取一些报价策略;使用保留条件、附加或补充说明等。

(2) 通过谈判,完善合同条文,双方合理分担风险。主要包括:充分考虑合同实施过程中可能发生各种情况,在合同中予以详细、具体地规定,防止意外风险;使风险型条款合理化,力争对责权利不平衡条款、单方面约束性条款做修改或限定,防止独立承担风险;将一些风险较大的合同责任推给发包人,以减少风险(这样常常也相应减少收益机会);通过合同谈判争取在合同条款中增加对承包人权益的保护性条款。

(3) 购买保险。购买保险是承包人转移风险的一种重要手段。通常,承包人的工程保险主要有工程一切险、施工设备保险、第三方责任险、人身伤亡保险等。承包人应充分了

解这些保险所保的风险范围、保险金计算、赔偿方法、程序、赔偿额等详细情况。

(4) 采取技术、经济和管理的措施。如组织最得力的投标班子, 进行详细的招标文件分析, 做详细的环境调查, 通过周密的计划和组织, 做精细的报价以降低投标风险; 对技术复杂的工程, 采用新的同时又是成熟的工艺、设备和施工方法; 对风险大的工程派遣最得力的项目经理、技术人员、合同管理人员等, 组成精干的项目管理小组; 施工企业对风险大的工程, 在技术力量、机械装备、材料供应、资金供应、劳务安排等方面予以特殊对待, 全力保证该合同的实施; 对风险大的工程, 应做更周密的计划, 采用有效的检查、监督和控制手段等。

(5) 在工程施工过程中加强索赔管理。用索赔来弥补或减少损失、提高合同价格、增加工程收益、补偿由风险造成的损失。

(6) 采用其他对策。如将一些风险大的分项工程分包出去, 向分包商转嫁风险; 与其他承包人联营承包, 建立联营体, 共同承担风险等。

在选择上述合同风险对策时, 应注意优先顺序。通常按下列顺序依次选择:

技术、经济和管理措施; 购买保险; 采用联营或分包措施; 报价中考虑的措施; 通过合同谈判, 修改合同条件; 通过索赔弥补风险损失。

复习思考题

1. 风险管理的任务是什么?
2. 建设工程合同中存在哪些风险?
3. 我国工程建设中常采用的工程担保有哪几种?
4. 简述工程建设中常用工程担保的主要内容。
5. 我国工程建设中常采用的工程保险有哪几种?
6. 工程保险与工程担保有何区别与联系?
7. 常用的风险处置措施及适用范围是什么?
8. 我国工程保险发展的重点和难点是什么?

第9章 工程合同争议的解决

教学提示: 在现实生活中,有合同活动,当事人之间因各种客观情况或者主观原因难免要发生合同争议。合同当事人在遇到合同争议时,究竟是通过协商和解,还是通过调解、仲裁、诉讼去解决,应当认真考虑对方当事人的态度、双方之间的合作关系、自身的财力和人力等实际情况,权衡出对自己最为有利的争议解决对策。

教学要求: 本章让学生了解合同争议产生的原因以及解决合同争议的方式,熟悉和解与调解在解决争议时应遵守的原则,熟悉仲裁的特征和基本程序,熟悉民事诉讼管辖和民事诉讼的原则。重点让学生通过本章的学习,提高学生处理合同争议、按程序办事、解决工程索赔问题的实际工作能力,加深对建设工程合同管理课程的理解。

9.1 概 述

9.1.1 合同争议

所谓合同争议,又称合同纠纷,是指合同当事人之间对合同履行的情况和不履行或者不完全履行合同的后果产生的各种纠纷。当事人对合同履行情况产生的争议,一般是指对合同是否已经履行或者是否按合同约定履行产生的分歧;对合同不履行或者不完全履行的后果的争议,一般是指对没有履行或者不完全履行合同的責任由哪一方承担或者如何承担产生的分歧。

合同关系的实质是通过设定当事人的权利义务在合同当事人之间进行资源配置。而在合同的权利义务框架中,权利与义务是互相对称的,一方的权利即另一方的义务;反之亦然。一旦义务人怠于或拒绝履行自己应尽的义务,则其与权利人之间的法律争议势必在所难免。在某种情况下,合同当事人都无意违反合同的约定,但由于他们对于合同履行过程中的某些事实有着不同的看法和理解,就容易酿成合同争议。在某些情况下,由于合同立法中法律漏洞的存在,也会导致当事人对于合同事实的解释互不一致。总之在现实生活中,有合同活动,当事人之间因各种客观情况或者主观原因难免要发生合同争议。

从内容上讲,这里所说的“合同争议”应作广义的解释,凡是合同双方当事人对合同是否成立、合同成立的时间、合同内容的解释、合同的效力、合同的履行、违约责任,以及合同的变更、中止、转让、解除、终止等发生的争议,均应包括在内。

1. 合同争议一般具有的特点

(1) 合同争议发生于合同的订立、履行、变更、解除以及合同权利的行使过程中。如果某一争议虽然与合同有关系,但不是发生于上述过程中,就不构成合同争议。

(2) 合同争议的主体双方须是合同法律关系的主体。此类主体既包括自然人,也包括法人和其他组织。

(3) 合同争议的内容主要表现在争议主体对于导致合同法律关系产生、变更与消灭的

法律事实以及法律关系的内容有着不同的观点与看法。

2. 合同争议产生的原因

1) 因合同订立引起的争议

从司法实践看,在合同争议案件中,大量的是因为双方当事人订立合同时不认真,内容(条款)规定不具体、不明确,合同的形式和订立程序不符合法律、法规规定而造成的。这方面的合同争议主要包括:

(1) 因合同主体不合法而引起的争议。例如,有的当事人没有民事行为能力,或者限制民事行为能力,却签订与其能力不相符的合同,引起合同争议;有的超出工商行政管理部门核准的经营范围而签订合同,引起合同争议;有的利用作废合同冒名顶替,引起合同争议;有的借口单位领导不同意,否认已签订的合同,引起合同争议等。

(2) 因合同内容引起的争议。例如,有的因合同质量条款要求不明确,成交后发生争议;有的因合同数量条款规定的不明确,在履行中发生纠纷;有的因交货日期在合同中没有写明,导致合同争议等。

(3) 因代签合同引起的争议。例如,有的主管机关未经企业同意,代签合同,企业不承认,拒绝履行合同,从而引起争议;有的因委托个人签订,单位推卸责任发生合同争议等。

(4) 因合同订立程序不合法而引起的争议。例如,有的因签订合同手续不全,引起争议;有的为降低价格,借口未经鉴证,宣布无效,引起合同争议。

(5) 因合同订立的形式产生的争议。例如,有的口头合同,一方不履行,发生争议,有的必须履行法定审批手续而未履行,导致合同无效,从而发生争议。

2) 因合同履行发生的争议

合同订立后,因一方或者双方不履行合同或者不当履行合同而发生的争议,也是多种多样的。这类合同争议主要有:

(1) 违反合同不交货产生的争议。例如,不按合同规定交货,另行高价销售,产生的争议等。

(2) 不按合同规定收货引起的纠纷。例如,如因市场行情变化,商品滞销,不按合同规定接受对方交付的货物而引起的争议等。

(3) 不按合同规定的数量交货(不交、多交或者少交)而引起的争议。

(4) 不按合同规定的质量条件履行合同而发生的争议。

(5) 不按合同规定的产品规格履行合同而引起的争议。

(6) 产品包装不符合合同规定引起的争议。

(7) 不按合同规定的履行期限履行合同发生的争议。

(8) 因拖欠货款引起的合同争议。

(9) 不按合同规定的价格交付价款引起的争议。

(10) 不按合同规定的履行方式履行引起的纠纷。

总之,当事人一方或者双方不按合同规定的每一条款履行,都会产生合同争议。

3) 因变更或者解除合同而产生的合同争议

在实践中,往往有许多原因使合同发生变更,有的是原订合同主体因为关、停、并、

转或者分立,发生变更后合同规定的义务由谁履行,由此产生争议;有的是因合同内容经协商变更后,一方又反悔,从而引起争议等。也有因不按法律或者合同规定的方式、程序变更或者解除合同,从而引起合同争议的情况。

9.1.2 建设工程施工合同争议的形成

建设工程施工合同的订立或履行过程中,合同双方形成争议的原因是错综复杂的,但绝大多数争议是合同当事人主观原因造成的。

1. 选择订立合同的形式不当

建设工程施工合同有固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金价格合同,在订立建设工程施工合同时,就要根据工程大小,工期长短,造价的高低,涉及其他各种因素多寡,选择适当的合同形式。若选择了不适当的合同形式,会导致合同争议的产生。

2. 合同主体不合法

《合同法》规定:合同当事人可以是公民(自然人),也可以是其他组织。也就是说作为建设工程承包合同当事人的发包人和承包人,都应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力,这是订立合同最基本的主体资格。《建筑法》还要求施工企业除具备企业法人条件外,还必须取得相应的资质等级,方可在其资质等级许可的范围内从事建设活动。但是,当前一些从事建筑活动的企业或单位,超越资质等级或无资质等级承包工程,造成主体资格不合法,这种无效合同如果履行就会产生严重的纠纷和不良后果。因此,在工程招标或非招标工程发包前,一定要对承包商进行严格的资格预审或后审,以防订立合同主体不合法。

3. 合同条款不全,约定不明确

在合同履行过程中,由于合同条款不全,约定不明确,引起纠纷是相当普遍的现象,也是造成合同纠纷最常见、最大量、最主要的原因。当前,一些缺乏合同意识和不会用法律保护自己权益的发包人或承包人,在谈判或签订合同时,认为合同条款太多、繁琐,从而造成合同条款少项;一些合同虽然条款比较齐全,但内容只作原则约定,不具体、不明确,从而导致了合同履行过程中的争议产生。例如:有的施工合同签订时选择了固定价格形式,但只是在相应的条款内约定合同价格采取固定价格,但没约定其涵盖的工作范围,也不约定按合同报价的一定比例,给予承包商的风险费用,一旦工程施工过程中发生承包商难以承受的变化情况,就会出现争议。

4. 草率签订合同

建设工程承包合同一经签订,其当事人之间就产生了权利和义务关系。这种关系是法律关系,其权利受法律保护,义务受法律约束。但是目前一些合同当事人,法制观念淡薄,签订合同不认真,履行合同不严肃,导致合同纠纷不断发生。

5. 缺乏违约具体责任

有些建设工程施工合同签订时,只强调合同的违约条件,但是没有要求对方承担违约责任,对违约责任也没有做出具体约定。导致双方在合同履行过程中争议的发生。

9.1.3 建设工程施工合同争议的主要内容

在我国建设市场活动中,常见的合同争议集中在承包人同发包人之间的经济利益方面。大致有以下一些内容。

(1) 承包人提出索赔要求,发包人不予承认,或者发包人同意支付的额外付款与承包索赔的金额差距极大,双方不能达成一致意见。其中,可能包括:发包人认为承包人提出索赔的证据不足;承包人对于索赔的计算,发包人不予接受;某些索赔要求是由于承包人自己的过失造成的;发包人引用免责条款以解除自己的赔偿责任;发包人致使承包人得不到任何补偿。

(2) 承包人提出的工期索赔,发包人不予承认。承包人认为工期拖延是由于发包人拖延交付施工场地、延期交付设计图纸、拖延审批材料样品和现场的工序检验以及拖延工程付款造成的;而发包人则认为工期拖延是由于承包人开工延误、劳力不足、材料短缺造成的。

(3) 发包人提出对承包人进行违约罚款,扣除拖延工期的违约罚金外,要求对由于工期延误造成发包人利益的损害进行赔偿;承包人则提出反索赔,由此产生严重分歧。

(4) 发包人对承包人的严重施工缺陷或提供的设备性能不合格而要求赔偿、降价或更换;承包人则认为缺陷业已改正、不属于承包方的责任或性能试验方法错误等,不能达成一致意见。

(5) 关于终止合同的争议。由终止合同造成的争议最多,因为无论任何一方终止合同都会给对方造成严重损害。但是,终止合同可能是在某种特殊条件下,合同双方为避免更大损失而采取的补救办法。为此,合同双方应当事先在合同中规定终止合同时各方的权利和义务,这样才便于争议的合理解决。

(6) 承包人与分包商的争议。其内容大致和发包人与承包人的争议内容相似。

(7) 承包人与材料设备供应商的争议。多数是关于货品质量、数量、交货期和付款方面的争议。

9.1.4 解决建设工程施工合同争议的一般方式

为了尽可能减少建设工程施工合同争议,最重要的是合同双方要签好合同。在签订合同之前,承包人和发包人应当认真地进行磋商,切不可急于签约而草率从事。其次,在履约过程中双方应当及时交换意见,尽可能将执行中的问题加以适当处理,不要将问题积累,尽量将合同争议解决在合同履行过程中。

公正、全面、及时地解决合同争议对于保护当事人的合法权益,加强合同领域的法制建设有着重要意义。根据《合同法》第一百二十八条规定,当事人可以通过四种途径解决合同争议,即协商和解;调解;提请仲裁机构仲裁;向人民法院提起诉讼。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议提请仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的裁决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。所以,建设工程承包合同争议一旦发生,合同当事人应按照有关的法律法规规定,通过适当的方式解决合同争议。合同当事人在遇到合同争议时,究竟是通过协商和解,还是通过调解、仲裁、诉讼去解决,应当认真考虑对方当事人的态度、双方之间的合作关系、自身的财力和人力等

实际情况, 权衡出对自己最为有利的争议解决对策。

9.2 合同争议的和解与调解

《合同法》第一百二十八条规定: 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。因此发生建设工程承包合同争议时, 当事人可以自行协商和解, 或者通过第三方进行调解。

9.2.1 和解

和解是指合同当事人发生争议后, 在没有第三方介入的情况下, 在自愿互谅的基础上, 就已经发生的争端进行商谈并达成协议, 自行解决争议的一种方式。

1. 和解的特征

(1) 和解是双方在自愿、友好、互谅的基础上进行的。它没有第三方介入, 不伤害双方的感情, 有利于维持和发展双方的合作关系; 经协商达成的协议, 当事人一般也能自觉遵守。

(2) 和解的方式和程序十分灵活。和解解决争议不像仲裁、诉讼那样有确定的方式和严格的程序, 双方当事人不违反法律的前提下, 可以根据实际情况以多种方式进行协商, 灵活的解决争议。

(3) 和解解决争议节省开支和时间。由于和解是由当事人自行进行, 不用通过严格的仲裁和诉讼程序, 可以节省仲裁诉讼和聘请律师等费用, 也节约了因程序问题而花费的时间, 因而能使争议得到经济、快捷的解决。

2. 和解的优点

(1) 简便易行。和解只需要发生争议各方自己决定在什么地方和什么时间进行协商, 不需要任何第三方介入, 因而十分方便, 有利于合同争议的解决。

(2) 有利于加强纠纷双方的协作。既然合同争议各方选择了协商方法解决争议, 就表明他们有和解的愿望, 在协商过程中, 就会增强对对方的理解, 而采取互谅、互让的态度, 不会使争议激化, 有利于巩固双方的协作关系, 增强信任感。

(3) 有利于合同的履行。由于和解是在双方自愿协商的基础上形成的, 因而双方一般都能自觉执行, 有利于合同的顺利履行。

3. 和解的局限性

由于和解解决争议具有这些特点, 因而在现实经济活动中, 争议双方往往愿意首先进行协商以求和解, 宁愿互相作一些让步, 承担一部分损失, 使争议得到及时解决。

但是, 由于和解协议缺乏法律强制履行的效力, 因而和解解决争议的方法是有局限性的。和解所达成的协议能否得到切实自觉的遵守, 完全取决于争议双方的诚意和信誉。如果在双方达成和解协议后, 一方反悔, 拒绝履行应尽的义务, 协议就成了“一纸空文”; 而且在实践中, 当争议标的的金额巨大或争议双方分歧严重时, 要通过协商达成谅解是比较困难的。鉴于此, 我国法律既重视和解解决争议的积极作用, 同时又不把它当作唯一的方式,

而是允许争议当事人在进行和解解决无效之时,还可以通过调解、仲裁或诉讼等途径解决。

9.2.2 调解

调解是指合同当事人于争议发生后,在第三方的主持下,在查明事实和分清是非的基础上,根据事实和法律,通过说服引导,促进当事人互谅互让,友好地在自愿的基础上达成协议,从而公平、合理地解决争议的一种方式。

1. 调解的特点

与和解一样,通过调解的方式解决合同争议也具有方式灵活,程序简便,节省时间和费用,不伤害争议双方的感情等特点,因而既可以及时、友好地解决争议,又可以保护当事人的合法权益。同时由于调解是在第三方主持下进行的,因而决定了它所独有的特点:

(1) 有第三方介入,看问题可能更客观、全面一些,有利于争议的公正解决;有第三方参加,可以缓解双方当事人的对立情绪,便于当事人双方较为冷静、理智地考虑问题。

(2) 有第三方介入,对事实的查明更深入和具体,有利于当事人抓住时机,寻找适当的突破口,公正合理地解决争议。

2. 目前建设工程施工合同争议的调解组织

合同争议调解是通过第三方进行的,这里的“第三方”可以是仲裁机构及人民法院,也可以是仲裁机构及人民法院以外的其他组织和个人。因参与调解的第三方的不同,调解的性质也就不同,一般而言,建设工程施工合同争议的调解主要有以下几种:

1) 仲裁机构的调解

建设工程施工合同争议的仲裁调解,是指争议双方将争议事项提交仲裁机构后,由仲裁机构在查清事实,明确是非,分清责任的基础上,组织合同双方当事人通过自愿协商,互谅互让、依法达成和解的一种仲裁活动。它具有两个特征:

(1) 调解活动自始至终都在仲裁人员的主持下进行。这一特征将仲裁调解与当事人自行和解区别开来。仲裁调解,是在提出仲裁申请之后,由仲裁机构与合同争议当事人共同参加,以仲裁机构为主导,并负责组织和安排调解的全过程,仲裁机构对双方达成的调解协议,拥有审查批准的权利。

(2) 调解协议经仲裁机构批准抵达当事人后,即具有与法院判决同等的法律效力。这一特征与行政调解区别开来。行政调解是解决合同争议的有效途径,但它不具有法律效力。当事人一方或双方反悔的,仍可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。在仲裁机构主持下,双方当事人达成的协议,对当事人有法律约束力,双方当事人必须自觉履行,如果一方拒绝履行。另一方可向人民法院要求强制履行。同时,调解协议生效后,争议当事人就不得再以同一事实和理由,向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

(3) 用调解的方式解决合同争议仲裁机构可以通过宣传教育,使合同争议当事人提高遵纪守法、讲求诚信的自觉性,从而有利于预防合同争议的再度发生。

需指出的是,仲裁机构在接受争议当事人的仲裁申请后,可以先进行调解,如果双方达成调解协议,则调解成功,仲裁机构即制作调解书并结束仲裁程序;如果达不成调解协议,仲裁机构应当及时作出裁决。

2) 人民法院的调解

建设工程施工合同争议的法院调解,是在人民法院审判人员的主持下,双方当事人就发生争议的民事权利义务关系,通过协商,互谅互让,共同达成协议,解决争议,终结诉讼所进行的活动和结案方式。但是法院调解,是有条件限制的。

法院调解解决建设工程施工合同争议的前提条件:

(1) 人民法院调解建设工程施工合同争议,必须遵守当事人自愿的原则。所谓自愿原则包括两层含义,第一层含义是指是否采取调解方式解决争议,必须取决于当事人的自愿。第二层含义是指当事人自愿达成协议。通过当事人双方协商,自愿共同达成协议。其中,人民法院可以提供参考意见,可以向当事人宣讲法律知识,帮助他们达成合法协议,但不得有任何强迫和变相强迫。

(2) 人民法院调解建设工程施工合同争议,必须在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解。所谓事实清楚,是指当事人双方对争议的事实陈述基本一致,又能提供可靠的证据,无须作大量调查即可判明事实、分清是非、确定责任。所谓分清是非,是指引起争议发生的责任分明,是双方均有过错,或是一方有过错,双方都应当承担义务,或是一方有责任对另一方履行义务,对这些分得很清楚,双方当事人也无太大争议。人民法院进行调解,必须以事实为根据,以法律为准绳。

3) 行政主管部门的调解

建设工程施工合同争议的行政调解,是行政机关依法劝导争议双方当事人和解,解决合同争议的一种方式。根据国务院职能分工,1 商行政管理部门是合同的监督管理机关,调解合同争议是合同监督管理职能的延伸,所以1 商行政管理部门是合同争议行政调解的当然部门。为了规范行政管理部门合同争议调解工作,及时解决合同争议,维护社会经济秩序,国家1 商行政管理局制订了《合同争议行政调解办法》。这是1 商行政管理部门调解合同争议的重要依据。合同争议行政调解具有以下特征:

(1) 合同争议行政调解的调解人员是行政机关。这是合同争议行政调解与其他合同争议调解方式的重要区别。

(2) 合同争议行政调解属案外调解。进入诉讼程序,由人民法院或仲裁机构的调解,为案内调解。

(3) 合同争议行政调解具有自愿性。它是在双方当事人自愿的基础上进行的,申请调解自愿,退出调解自愿,达成和解自愿。调解机关不能强迫当事人接受调解,不能把自己的意愿强加于双方当事人。

4) 社会(民间)调解

鉴于目前建设行政主管部门的职能约束,在发生争议时,还可以依托相关的行业学会或协会,制定有关调解管理办法,建立相应的调解组织,实施建设工程施工合同争议的社会(民间)调解活动。

建设工程施工合同不同于其他经济合同,具有较强的专业性,其合同内容包括工期、质量、工程造价、设备材料供应、工程款支付、竣工验收以及工程质量保修等诸多方面,合同条款涉及土地管理、文物保护、环境保护、标准化、城镇管理等诸多法律法规的相关内容。所以,建设工程施工合同履行过程中发生的争议,需要具备较强的相关专业知识的组织和人员才能进行调解。对于社会(民间)调解,虽然必须在我国法律体系框架下进行,但是,目前我国还没有一部具体的法律法规对其进行约束,所以,其调解形式、调解方式

以及调解结果都不受制约,自由的空间很大。而且,社会(民间)调解是一种社会(民间)行为,调解组织也为民间组织,其出具的调解书就不具有法律效力,对合同争议当事人缺乏法律约束力,如果一方当事人反悔,该调解书就成了“一张废纸”。

5) 联合调解

联合调解是指涉外合同争议发生后,当事人双方分别向所属国的仲裁机构申请调解,由双方授权的仲裁机构分别派出数量相等的人员组成“联合调解委员会”,联合调解案件。

9.2.3 调解与和解的原则

不论是和解还是通过第三人调解,其最根本的还是在当事人有彻底解决合同纠纷的愿望,能够相互理解、互谅互让地解决合同纠纷,在采用这些方法时,必须坚持以下几项原则:

1. 自愿原则

虽然我国在多部法律法规内都有对解决合同纠纷采取和解或调解的条款,但这并不意味着和解或调解是必须采用的法定程序,因为和解或调解都是建立在当事人自愿的基础上的。特别是调解不同于仲裁或审判,因为任何一方不同意调解,都不能强迫调解。调解合同纠纷时,要耐心倾听各方当事人和关系人的意见,并对这些意见进行分析研究、调查核实,然后据理说服各方当事人,使他们自愿达成协议,促使调解成功。若调解无效,当事人则可以请求仲裁机构裁决或由人民法院判决,任何人都不得阻止当事人行使这些权利。

2. 依法原则

当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规。解决合同纠纷是解决合同履行中对于一些条款的争议。因此,不论是和解方法还是调解方法解决合同纠纷,都必须坚持依法原则。和解协议或调解协议都是合同的组成部分,都必须以遵守法律、行政法规为前提。决不允许以违反法律、行政法规为代价,解决合同纠纷,否则这种和解或调解都是无效的。

3. 公平、公正原则

在采用和解方法解决合同纠纷时,各方当事人都要摆正自己的地位,采取公正的态度解决问题。采用调解方法时,调解人对各方当事人都要立场公正,秉公办事,只有这样才能取得各方的信任,作出的调解才能为各方所接受。若违背了公平、公正原则,则难以达成和解或调解协议,即使勉强达成协议,也会因其基础不牢,容易反复或出现不履行的情况。处理得不好,甚至适得其反,导致纠纷扩大,矛盾激化。

4. 制作和使用调解书原则

《仲裁法》规定:当事人达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书。对于调解,《仲裁法》规定:调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或根据协议的结果制作裁决书。《民事诉讼法》则规定:调解达成协议,调解书应当写明诉讼请求、案件的事实和调解结果。根据这些法律规定,凡是经过和解或调解合同纠纷达成协议的都依法可以或应当制作调解书或裁决书。由于和解或调解都是建立在当事人自愿的基础上,因此在和解或调解书生效之前,当事人对和解或调解反悔的,仲裁机构或人民法院,应及时作出

裁决或判决。

9.3 合同争议的仲裁

9.3.1 合同争议仲裁的概念及特征

1. 仲裁的概念

所谓合同争议的仲裁,是指发生合同争议时,合同双方当事人根据书面仲裁协议,向仲裁机构提出仲裁申请,由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决,从而解决合同纠纷的法律制度。

仲裁是解决合同争议的重要方式之一,其适用范围很广。根据《仲裁法》第二条规定,凡是平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同争议和其他财产权益纠纷,都可以仲裁。由此看出,仲裁这种解决方式,适用于一切平等的主体之间发生的合同争议。

项合同的争议是否采用仲裁方式解决,完全取决于合同各方当事人的自由选择,只有当各方当事人一致同意将其争议提交仲裁时方可采用。当事人所作出的仲裁选择的法律表现形式为仲裁协议,仲裁协议(含合同中的仲裁条款)是对合同争议进行仲裁的法律依据。

当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。任何一方当事人不同意仲裁的,该合同争议就不得适用仲裁方式解决。

从实践上看,合同争议不能协商、调解解决的,许多当事人都习惯于选择仲裁方法解决争议。这主要是因为,同法院审判相比,仲裁方法比较灵活,程序相对简便,解决争议及时、迅速,所需费用又不多。也正因此,仲裁作为解决民事争议的一种方式已在国际上得到普遍承认,许多国家制定了仲裁法律,设置仲裁机构来处理争议案件。我国在原《中华人民共和国经济合同仲裁条例》的基础上于1994年8月制定了《中华人民共和国仲裁法》,专门对仲裁进行了规定。

2. 仲裁的特征

仲裁与调解相比较,其相同之处在于两者都以双方当事人自愿为基础,两者区别在于:

(1) 作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构,这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。仲裁与前述所说的调解虽然都是由第三方出面解决当事人之间的争议,但调解中的第三方作为调解人不需要特定的身份,即不是特定的第三方,普通人人都可以作为调解人来调解当事人之间的争议;而仲裁中的仲裁者则必须是依法成立并为法律授予仲裁资格的仲裁机构,其他任何单位和个人都不得进行仲裁。

(2) 仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼,但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。仲裁有一定的程序、规则,这种程序、规则是由法律和法规规定的。我国《仲裁法》专门对仲裁的基本程序、规则作了规定,国际商会也依据《仲裁法》和《民事诉讼法》有关规定对涉外仲裁规则专门做了具体规定。这些规定使仲裁有了比较严格的程序和规则,仲裁必须按照这些规定进行,而不得违反。

(3) 申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。即使一方事后反悔, 另一方仍可根据仲裁协议提起仲裁程序, 仲裁庭也可据此受理案件, 进行仲裁; 而调解的进行, 自始至终都需要双方同意。

(4) 仲裁裁决具有法律强制执行力。仲裁裁决尽管不是由司法机关作出, 但是法律却赋予其强制执行的效力。《仲裁法》第五十七条规定: 裁决书自作出之日起发生法律效力。对仲裁机构的仲裁裁决, 当事人应当履行。当事人一方在规定的期限内不履行仲裁机构的仲裁裁决的, 另一方可以向人民法院申请强制执行。仲裁裁决这种法律强制力, 是仲裁与协商、调解方式的重要区别之一。

(5) 仲裁员和调解人的地位不同。调解人在调解中只起说服劝导作用, 以促使双方互相让步, 达成和解协议。能否达成和解协议, 完全取决于争议双方当事人的意愿, 调解人无权裁断; 而仲裁员则不同, 他虽也负有规劝疏导责任, 但在调解无效时, 他可以依法进行裁决。

9.3.2 合同争议仲裁的基本原则

根据《仲裁法》有关规定, 在合同争议仲裁过程中, 应当遵循下列基本原则:

1. 以事实为根据, 以法律为准绳原则

这一原则要求在处理合同争议时应本着从实际出发, 实事求是的精神, 对争议事项作全面认真的调查研究, 在查清案件事实的情况下, 分清是非, 判明责任, 并依据法律规定作出正确的裁决, 以保证仲裁的客观和公正。在仲裁中, 仲裁机构应避免主观臆断、偏听偏信等行为, 更不可徇私枉法, 而应严格依法办案。

2. 先行调解原则

这一原则是指仲裁机构在受理合同争议后, 本着促进双方争议的解决、缓解其矛盾的精神, 在查清案件事实的基础上首先进行调解, 对当事人进行说服教育, 以求消除当事人间的隔阂, 互相谅解, 自愿达成和解协议, 从而解决争议。先行调解必须是在当事人自愿接受调解的前提下进行, 任何一方或者双方当事人不愿调解的, 仲裁机构就不能进行调解, 而应当开庭强制裁决。而且, 当事人同意调解, 但经过仲裁机构调解后仍达不成协议的, 也应及时裁决, 不能久拖不决。调解达成协议的, 仲裁机构应当制作调解书或者裁决书。

3. 保障当事人平等地行使权利原则

在仲裁活动中, 无论是申请人还是被申请人, 它们的法律地位都是平等的, 都有权享有仲裁程序规则中规定的各项权利, 如陈述事实, 进行辩论, 提供有关证据、聘请律师参加仲裁活动等。因此, 仲裁机构在处理争议过程中, 应当保障当事人平等地行使这些权利, 不得歧视任何一方当事人。

4. 自治原则

又称自愿原则, 主要含义是: 当事人是否将他们之间发生的纠纷提交仲裁, 由其自愿协商决定; 当事人将他们之间发生的纠纷提交哪一个仲裁委员会仲裁, 由其自愿协商选定; 仲裁不实施级别管辖和地域管辖。

5. 一次裁决原则

所谓一次裁决,又称一裁终局,是指仲裁机构对合同争议实行一裁终审制,即裁决一经作出就具有法律效力,当事人必须执行,不得申请复议,也不得另行向人民法院起诉。一方不执行仲裁裁决的,另一方有权要求人民法院执行。一次裁决有利于争议的迅速解决,以尽可能避免因争议久拖不决所带来的当事人损失的扩大以及因此而造成的其他消极后果。

6. 独立仲裁原则

这一原则是指,仲裁机构受理合同争议后,依法享有独立仲裁权,独自在其职权范围内对争议作出具有法律效力的最终裁决,而不受行政机关、其他单位和个人的干涉。当然,仲裁机构独立行使仲裁权并不意味着仲裁活动不受监督,人民法院有权对仲裁活动进行监督,对违法的裁决有权予以撤销或者不予执行。

9.3.3 仲裁机构及仲裁人员

仲裁机构,是指依照法律规定设立,并依法对平等主体的自然人、法人和其他组织之间发生的合同争议和其他财产权益争议专门地进行仲裁的组织。在我国,仲裁机构是仲裁委员会。由于国内合同和涉外合同不同,我国分别对这两类合同争议的仲裁规定了不同的仲裁机构,即我国仲裁委员会分为两类:一是对国内合同的仲裁委员会,是各地设立的仲裁委员会;二是对涉外合同争议的涉外仲裁委员会,是中国国际商会设立的中国国际经济贸易仲裁委员会(它可以在一些地方设立办事处)。

根据《仲裁法》第十条规定,仲裁委员会(处理国内合同争议的)在直辖市和省、自治区人民政府所在市设立,也可以根据需要在其他地区的市设立,不按行政区划层层设立。根据该法第十二、十三条规定,仲裁委员会由主任一人、副主任2~4人和委员7~11人组成。仲裁委员会的主任、副主任和委员由法律、经济贸易专家和有实际工作经验的人员担任。仲裁委员会的组成人员中,法律、经济贸易专家不得少于三分之一。仲裁员应当符合下列条件之一:第一,从事仲裁工作满八年的;第二,从事律师工作满八年的;第三,曾任审判员满八年的;第四,从事法律研究、教学工作并具有高级职称的;第五,具有法律、经济、贸易等专业知识,从事相关工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的。

仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,仲裁依法独立进行,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。仲裁实行一裁终局的制度,各个仲裁委员会之间也没有上下级隶属关系。在处理案件时,仲裁不实行级别管辖和地域管辖,仲裁委员会应当由当事人协议选定。也就是说,双方当事人可以在国内任意选择仲裁委员会来解决其合同争议,而不受地域和级别限制。

9.3.4 仲裁协议

所谓合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款),是指合同双方当事人将其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款,也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。

仲裁协议通常表现为：合同中的仲裁条款、专门仲裁协议以及其他形式的仲裁协议。

合同中的仲裁条款，是指双方当事人有关条约或合同中规定的将来如有争议即提交仲裁裁决的条款。由于这种条款通常是作为合同本身的内容订入合同的，故称仲裁条款。合同中的仲裁条款是仲裁协议中最为普遍的形式。

专门仲裁协议，是指双方当事人自愿将争议提交仲裁的一种具有独立内容的协议，它是相对独立于合同之外的另一种协议，与合同中的仲裁条款具有同等法律效力。专门仲裁协议的订立，可以是在争议发生之前，也可以是在争议发生之后。

其他形式的仲裁协议，是指除合同中的仲裁条款和专门仲裁协议以外的其他可以证明当事人双方自愿把争议提交仲裁的书面材料，主要包括双方往来的信函、电报、电传中表示同意仲裁的文字记录等。

根据我国《仲裁法》第十六条规定，不管是在合同中订立的仲裁条款，还是以其他书面方式在争议发生前或者争议发生后达成的请求仲裁的协议，仲裁协议都应当具有下列基本内容：

(1) 请求仲裁的意思表示。即双方当事人表示同意对其合同争议提请仲裁；

(2) 仲裁事项。即要求对发生争议的哪个或者哪些事项进行仲裁；

(3) 选定的仲裁委员会。当事人可以任意选择处理其合同争议的仲裁委员会，其他单位和个人不得强迫。

除了上述基本内容外，当事人双方也可以在仲裁协议中约定其他事项，如选择仲裁员、约定适用的法律和其他有关事项。

9.3.5 仲裁的程序

1. 仲裁的申请

合同当事人向仲裁机构请求对其合同争议进行仲裁时，并不是所有当事人达成的仲裁协议都是有效的，只有符合法定条件的仲裁协议才有效。有效的仲裁协议应当具备下列条件：

1) 仲裁协议必须以书面形式签订。根据《仲裁法》第十六条第1款规定，合同当事人达成的仲裁协议，不能采用口头形式，而只能采取书面形式，可以在争议发生之前或者之后达成；

2) 仲裁协议必须是双方当事人的共同意思表示。合同是双方当事人共同的意思表示，处理合同纠纷的仲裁协议也必须由双方意思表示一致，一方不同意就不能仲裁。任何一方不得强迫对方签订仲裁协议，把自己的意志强加于对方；

3) 仲裁协议的内容必须合法，不得违反国家利益和社会公共利益。仲裁协议中应有具体仲裁请求、事实和理由；

4) 各方当事人都必须具有完全的民事行为能力，能够独立地享有民事权利和承担民事责任。仲裁申请人还必须是与本案有直接利害关系的当事人。

只有同时具备上述条件的仲裁协议，才能产生法律效力，受法律保护。不具备上述条件之一的，仲裁协议无效。另外，根据《仲裁法》第十九条和二十条规定，当事人达成的仲裁协议独立存在，即不依附于合同存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。任何一方当事人对其订立的仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构

作出决定或者人民法院作出裁定；一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定，即不能由仲裁委员会决定。由仲裁委员会仲裁的，当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

2. 仲裁的受理

仲裁机构收到当事人的申请后，首先要进行审查。经审查符合申请条件，应当在7日内立案，对不符合规定的，也应当在7日内书面通知申请人不予受理，并说明理由。申请人可以放弃或变更仲裁请求。被申请人可以承认或反驳仲裁请求，有权提出反请求。

仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁委员会名册送达申请人，并将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁委员会名册送达被申请人。被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书。仲裁委员会收到答辩书后，应当在仲裁规则规定的期限内将答辩书副本送达申请人。被申请人未提交答辩书的，不影响答辩程序的进行。

3. 开庭和裁决

当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，仲裁可不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。

仲裁机构在查明事实、分清责任的基础上，应着重调解，引导和促使当事人达成调解协议。调解应在仲裁人员的主持下，按照法律规定的程序进行。调解达成协议的内容，双方当事人必须自愿，并不得违法。调解成功后，仲裁机构要制作调解书，加盖公章后，送发当事人双方。调解书是具有法律效力的仲裁文书。经调解仍达不成协议的，或调解书送达前一方或双方反悔的，应及时开庭进行仲裁。仲裁庭应按照多数仲裁员的意见进行裁决，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出，仲裁的最终结果以仲裁决定书给出。

4. 执行

调解书和仲裁决定书均为具有法律效力的仲裁文书，一经送达当事人即发生法律效力，当事人应主动履行。一方当事人不自动履行时，另一方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。

9.4 合同争议的司法诉讼

9.4.1 合同诉讼的概念和基本原则

1. 合同诉讼的概念

所谓合同争议诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求，在所有诉讼参与人的参加下，审理和解决合同争议的活动，以及由此而产生的一系列法律关系的总和。它是民事诉讼的重要组成部分，是解决合同纠纷的一种重要方式。

2. 合同诉讼的基本原则

合同的诉讼应遵循《民事诉讼法》所确定的基本原则:

(1) 人民法院依法独立审判的原则。人民法院依照国家法律规定,对合同纠纷案件独立进行审判,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

(2) 以事实为根据,以法律为准绳的原则。人民法院在审理合同纠纷案件时,必须以事实为根据,以法律为准绳,重证据,重调查研究,在查明事实、分清责任的基础上,正确地适用法律。

(3) 当事人诉讼权利平等的原则。当事人诉讼过程中享有平等的诉讼权利,有权使用本民族的语言和文字,有权委托代理人,有权申请回避和采取保全措施,有权提供证据,进行辩论,请求调解,提起上诉,申请执行。对当事人在适用法律上一律平等。

(4) 根据自愿和合法的原则进行调解。人民法院在查明事实、分清责任的基础上,应当根据自愿和合法的原则进行调解。调解不成的,应当及时判决。

(5) 实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。根据《民事诉讼法》第四十五条规定,审判人员有下列情形之一的,必须回避,当事人有权申请他们回避:其一,是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属;其二,与本案有利害关系;其三,与本案当事人有其他关系,可能影响对案件公正审理的。

(6) 审判监督原则。

(7) 使用本民族语言文字诉讼的原则。

(8) 审判实行辩论制度。

9.4.2 合同诉讼的管辖

1. 合同纠纷案件的收案范围

(1) 合同纠纷当事人协商、调解不成的合同纠纷案件。

(2) 合同纠纷当事人不愿协商、调解,直接起诉的合同纠纷案件。

(3) 合同纠纷当事人对仲裁条款、协议有争议的合同纠纷案件。

(4) 合同中虽然没有仲裁条款,纠纷发生后,又未达成书面仲裁协议的合同纠纷。由于仲裁分轨,当事人对合同纠纷的仲裁不能达成书面协议的,就可以选择诉讼来解决纠纷。

(5) 人民法院裁定不予执行的仲裁裁决,当事人可以重新达成书面仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。人民法院根据一方当事人的申请,强制执行仲裁裁决时,另一方当事人提出证据证明仲裁裁决有下列情形之一的,经合议庭审查属实,应裁定不予执行:

① 当事人在合同中没有订立仲裁条款,或者事后没有达成书面仲裁协议而仲裁机构予以仲裁的。

② 仲裁的事项不属于仲裁的范围或者仲裁机构无权仲裁而仲裁机构予以仲裁的。

③ 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违法的。

④ 认定事实的主要证据不足的。

⑤ 适用法律确有错误的。

⑥ 仲裁员在仲裁该案时有贪污、受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

对于上述裁决不予执行的仲裁裁决案件,当事人一方向人民法院起诉的,人民法院应

当受理。

(6) 经仲裁的劳动合同纠纷案件, 农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷案件, 当事人不服的, 在法定期限内可以向人民法院提起诉讼。我国仲裁法虽然规定了“或裁或审”的制度, 但不包括劳动合同纠纷案件和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷案件, 凡企业(包括私营企业、中外合资经营企业)与职工履行劳动合同发生纠纷的, 或因农业集体经济组织内部的农业承包合同发生纠纷的, 当事人不服有关仲裁机构裁决的, 在法定期间向人民法院起诉的, 人民法院应当受理。

2. 法院管辖的分类

管辖是指法院系统内部的上下级之间、同级法院之间在受理第一审合同纠纷案件上的权限分工。根据《民事诉讼法》第二章的规定, 法院管辖包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、专属管辖、指定管辖和协议管辖。

1) 级别管辖

合同纠纷诉讼的级别管辖, 是指人民法院系统内部上下级人民法院之间受理第一审合同纠纷案件的分工和权限范围。

根据合同纠纷案件的性质、影响范围、诉讼标的的价额的多少以及合同纠纷主体的特点, 我国《民事诉讼法》第十八条至第二十一条对级别管辖作了明确的规定:

(1) 基层人民法院管辖第一审民事案件, 但本法另有规定的除外。

(2) 中级人民法院管辖下列第一审民事案件: 重大涉外案件; 在本辖区有重大影响的案件; 最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

(3) 高级人民法院管辖在本辖区有重大影响的第一审民事案件。

(4) 最高人民法院管辖下列第一审民事案件: 在全国有重大影响的案件; 认为应当由本院审理的案件。

同时, 民事诉讼法还规定, 上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审案件, 也可以把自己管辖的第一审案件交下级人民法院审理; 下级人民法院对它所管辖的第一审案件, 认为需要由上级人民法院审理的, 可以报请上级人民法院审理。

2) 地域管辖

合同纠纷诉讼的地域管辖是指确定同级人民法院受理第一审合同纠纷案件的分工和权限范围。

根据我国《民事诉讼法》第二章、第二节“地域管辖”和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》的有关规定以及最高人民法院有关司法解释, 合同纠纷诉讼的地域管辖有以下几种情况:

(1) 一般合同纠纷诉讼由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。我国民事诉讼法第二十四条规定: “因合同纠纷提起的诉讼, 由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”

(2) 因保险合同纠纷提起的诉讼, 由被告住所地或保险标的物所在地人民法院管辖。

(3) 因铁路、公路、水上、航空和联合运输合同纠纷提起的诉讼, 由运输始发地、目的地或被告住所地人民法院管辖。

3) 合同当事人的协议管辖

合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、

原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

民事诉讼法第二十五条规定的书面合同中的协议，是指合同中的协议管辖条款或者诉讼前达成的选择管辖的协议。

合同的双方当事人选择管辖的协议不明确或者选择民事诉讼法第二十五条规定的人民法院中的两个以上人民法院管辖的，选择管辖的协议无效，依照民事诉讼法第二十四条的规定确定管辖。

4) 移送管辖

移送管辖是指人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

5) 指定管辖

有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，双方协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。

6) 专属管辖

根据《民事诉讼法》的规定，下列案件由特定的人民法院管辖：

- ① 因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；
- ② 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；
- ③ 因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。

9.4.3 审判组织

审判组织是指人民法院对合同案件进行具体审理工作的组织，人民法院是审判机关，对每一件案件的审理，必须由人民法院指定专人负责，只有在对案件进行具体的审理后，才能作出判决。人民法院指定专人负责审理案件是有一定的组织形式的，根据人民法院的级别、审级和案件的类别，我国民事诉讼法确定人民法院审理民事訴訟的组织形式有两种：独任制和合议制。

独任制是对合同案件进行审理的审判组织的一种形式，是指由一名审判员对案件进行审理和作出判决的制度。该审判员称为独任审判员。独任制的审判组织适用于案情比较简单，标的数额较小，事实较清楚的合同纠纷的第一审案件，这一类案件多由基层人民法院负责审理。

合议制是对合同案件进行审理的审判组织的另一种组织形式，是指由审判员和陪审员三人以上组成审判集体或者全部由审判员三人以上组成的审判集体，对案件进行审理和作出判决的制度。合议制是人民法院对合同纠纷案件进行审理的最常见的基本组织形式。人民法院按照合议制组成的法庭称合议庭。合议庭由审判长一名，审判员或陪审员若干名组成。合同纠纷案件的审级不同，合议庭的组成也不同：第一审案件的合议庭一般由审判员和陪审员共同组成或者由审判员组成，合议庭的组成人数一般是三人也可以是五人，但必须是单数。第二审案件的合议庭只能全部由审判员组成，陪审员不能参加第二审案件的审判工作，合议庭组成的最低人数也是三人，根据需要也可增加，但也必须是单数。发回重

审和根据审判监督程序进行再审的案件,原来参与该案审理的审判人员不能再参加案件的审理工作,人民法院应当另行组成合议庭对案件进行审理,以免影响案件的公正审理。

9.4.4 合同诉讼的参与人

参加合同诉讼的人员主要有以下几种:

1. 诉讼的当事人

因合同发生争议或一方认为自己的合法权益受到侵害以自己的名义进行诉讼,并受人民法院的裁判或调解书约束的人。诉讼的当事人一般就是合同的当事人,在一审程序中称为原告和被告,二审程序中称为上诉人和被上诉人。当事人必须具有诉讼的权利能力,如亲自参加诉讼的还应具备诉讼行为能力,否则当事人无法行使诉讼中的权利,无法承担诉讼中的义务。在此情况下,当事人的法定代理人应当代理其参加诉讼,当然,经济合同纠纷人多发生在法人之间,上述情况并不可能发生或极少发生。当事人可以是一个,也可以是两个或两个以上,即原告和被告都可以是一个或两个或两个以上。如果当事人一方或双方为两人以上,其诉讼标的是共同的,或者诉讼标的是同一种类,人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的诉讼称之为共同诉讼。

2. 诉讼中的第三人

根据民诉及最高人民法院的意见,有关诉讼中第三人的规定如下:

对当事人双方的诉讼标的,第三人认为有独立请求权的,有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的,第三人虽然没有独立请求权,但案件处理结果同他有法律上的利害关系的,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知他参加诉讼。人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人的诉讼权利义务。

依照民事诉讼法第五十六条的规定,有独立请求权的第三人有权向人民法院提出诉讼请求和事实、理由,成为当事人;无独立请求权的第三人,可以申请或者由人民法院通知参加诉讼。

在诉讼中,无独立请求权的第三人有当事人的诉讼权利义务,判决承担民事责任的无独立请求权的第三人有权提出上诉。但该第三人在一审中无权对案件的管辖权提出异议,无权放弃、变更诉讼请求或申请撤诉。

3. 诉讼代理人

诉讼代理人是指根据法律规定、法院指定或者诉讼当事人授权,以委托的当事人的名义代理其进行民事诉讼行为的公民。合同诉讼中的代理人一般是经授权委托产生,律师和其他具有法律知识的公民可以成为合同诉讼中当事人的代理人。

当事人委托授权律师或其他公民进行诉讼,须向人民法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书,授权委托书必须写明委托事项和委托权限,诉讼代理人在委托人的授权范围内进行诉讼活动。

9.5 合同争议解决途径的选择

在以上这些名目繁多的合同争议解决途径中，并不是每一项合同争议的解决都要经过这些过程，人们通常只选用其中一种或两种解决方式，以求较快且较经济地解决问题。实践证明，绝大多数的争议，都可以由合同双方友好协商解决。对于未能协商和解的争议，可以通过调解解决，通过法律途径(仲裁或诉讼)解决的是少数，另外从1999年开始还出现了DAB这种解决途径。为了更全面地了解各种争议解决途径的适用性，表9-1对它们的特点和优缺点进行了比较。

表9-1 合同争议解决途径对比表

序号	解决途径	争议形成	解决速度	所需费用	保密程度	对双方协作关系的影响
1	协商和解	在合同实施过程中随时发生	发生时，双方立即协商，达成一致	无需费用	纯属合同双方讨论，完全保密	据理协商，达成和解后不影响协作关系
2	调解	邀请调解者，需时数周	调解者分头探讨，一般需时一个月	费用较少	可以做到完全保密	对协作关系影响不大，达成协议后可以恢复协作关系
3	仲裁	申请仲裁，组成仲裁庭，需1~2个月	仲裁庭审理，一般需4~6个月	请仲裁员，费用较高	仲裁庭审理，可以保密	对立情绪较大，影响协作关系
4	诉讼	向法院申请立案，一般需时一年，甚至更久	法院庭审，需时甚久	请律师等，费用很高	一般属于公开审判，难以保密	敌对关系，协作关系破坏
5	评判	双方邀请评判员，组成DBA	DBA提出评判决定，需一个月左右	请评判员，费用甚高	内部评判，可以保密	有对立情绪，影响协作关系

复习思考题

1. 名词解释

合同争议 和解 调解 仲裁 仲裁裁决原则 仲裁协议 合同争议诉讼 诉讼代理人

2. 简答题

- (1) 合同争议产生的原因有哪些？
- (2) 和解与调解应遵守的原则是什么？
- (3) 仲裁的基本原则、一般程序是什么？

第10章 工程合同管理信息系统

教学提示：信息化是合同管理的必然趋势，通过本章教学，有利于学生全面总结工程合同管理的知识，使工程合同管理控制方法标准化和程序化。

教学要求：通过本章教学应使学生掌握合同管理信息系统的特点、施工合同的结构分解、合同控制的程序，了解合同管理信息系统的设计方法。

10.1 概 述

1. 合同信息管理的重要性

在工程实施过程中，合同管理主要是对工程承包合同的签订、履行、变更和解除进行监督检查，对合同双方争议进行调解和处理，以保证合同的依法签订和全面履行。合同管理人员首先应对合同各类条款进行仔细认真的分析研究，建立合同网络，在工程实施过程中根据合同进行监督检查，并通过各种反馈信息及时准确地处理工程实际问题。这就要求合同管理人员加强信息管理，对合同管理过程中输出的各种信息进行收集、整理、处理、存储、传递和应用，以便及时、高效地发出各项正确指令。

为了提高合同管理的水平，全面、准确、及时地获取工程信息十分重要，这就需要设计一个以合同为核心的信息流结构，包括建立合同目录、编码和档案，建立完整的合同信息管理制度以及包括会议制度在内的科学高效的合同管理信息系统。

2. 合同信息管理的特点

所谓信息管理是指对信息的收集、加工、整理、储存、传递与应用等一系列工作的总称。信息管理的目的是通过有组织的信息流通，使决策者能够及时准确地获取相应的信息。

建筑工程合同信息管理既有一般信息管理的特点，也有其特有的特点。

1) 时效性

在工程实施过程中，有大量的信息都是实时信息，而这些信息往往又与工程项目的总体目标是否能实现休戚相关。如果不能及时得到这些瞬息万变的信息，并将这些信息迅速传递到相关的单位、部门，势必对工程的实施产生重大影响，从而可能会导致项目总体目标不能按时、按质、按量实现。如工程师不能在规定的期限内作出指令就有可能导致工程停工，承包商的索赔不能及时解决可能会影响工程的实施。所以，及时准确地获取工程信息十分必要。

2) 综合性

在工程实施过程中，合同信息往往通过质量、进度和投资方面反映出来。合同既是业主与承包商连接的纽带，也是工程师实施监理的主要依据。但是，工程承包合同的主要条款则是关于双方当事人质量、进度和投资等方面的权利义务约定。同时，要加强合同管

理,也需要通过对大量其他各方面的信息进行分析处理来实现。

3) 复杂性

由于工程项目是一个复杂开放的系统,在所有的信息中既有项目内部信息,如合同的结构、合同管理制度,又有大量外部信息,如国家政策、法律法规等;既有固定信息,又有流动信息;既有现时信息,又有历史信息;既有生产信息,又有技术信息、经济信息。这就给信息管理带来了较大的难度。

10.2 合同管理信息系统

1. 概述

管理信息系统是一个由人、计算机等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和使用的系统。

管理信息系统引用其他学科中已成熟、先进的成果,集合成为一门综合性学科,如计算机科学提供了计算机及通讯的基础,运筹学提供了以正确的资料作出合理的决策的基础,各种管理的基本职能如组织、协调、控制等都是系统建立的基础等。

国外一些工程承包公司已经开发了工程项目管理信息系统,成绩显著。目前,在我国也已经有了这方面的开发研究,出现了一些较为成熟的软件,如工程概预算软件、建设监理软件、工程项目管理软件等。各种软件都有一定的特点,但也有一定的局限性,且多偏重于事务性信息管理,缺乏决策支持及专家系统的帮助。

2. 合同管理信息系统的主要功能

1) 数据、资料的收集

在工程实施过程中,每天都要产生大量的信息,如各种指令、信件、索赔报告等,必须确定收集什么样的信息,确定信息的结构,收集的方式及手续,考察信息的真伪,并具体落实到责任人。通常由合同工程师负责,秘书、文档管理员等承担此任务。

2) 数据资料的存储

原始数据资料不仅供目前使用,还有许多必须要保存。按照不同的使用和储存要求,数据资料储存于一定的信息载体上,要做到既安全可靠,又使用方便。

3) 信息的加工

即将原始数据资料经过信息加工处理,转变为可供决策使用的信息。处理方法有:

(1) 一般的信息处理方法,如排序、分类、合并、插入、删除等。

(2) 数学处理方法,如数学计算、数值分析、数理统计等。

(3) 逻辑判断方法,如差异诊断、风险分析等。

(4) 信息的传送、调用和输出。

即将经过处理的信息流通到需要的地方,以使各决策者作出客观正确的决策。

3. 合同文档管理

文档管理是指对作为信息载体的资料进行有序的收集、加工、分解、编目、存档,并为需要者提供专用和常用的信息的过程。文档系统是管理信息系统的基础,是管理信息系

统有效运行的前提条件。

合同管理文档系统的内容包括合同文本及附件, 合同分析资料、指令、信件、会议纪要, 各种原始工程文件、索赔文件, 各种技术、经济、财务方面的资料等。以下为建立合同管理文档系统的步骤。

1) 建立资料特征标识

(1) 要求。

一般合同资料的编码体系有如下要求。

- ① 统一的, 适用于所有资料的编码系统。
- ② 能够区分资料的种类和特征。
- ③ 有足够的存储空间。
- ④ 对人工处理和计算机处理同样有效。

(2) 资料编码的构成。

通常, 资料编码由一些字母和数字符号组成, 它们被赋予一定的含义, 这样编码就能够被识别。合同资料的编码一般由以下几部分构成。

- ① 有效范围。如属于某个项目、功能或要素。
- ② 资料的种类。如是属于合同文本, 还是属于信件; 是属于技术上的, 还是属于商务或行政上的。
- ③ 内容和对象。即设计出符合实际要求的文档结构。
- ④ 日期和序号。对于相同有效范围、相同种类、相同对象的资料可通过日期和序号来加以区分。

2) 索引系统

为了使资料的储存和使用方便, 必须建立资料的索引系统, 它类似于图书馆的书刊索引, 可以采取表格的形式, 其栏目应能够反映资料的各种特征信息。同时, 也要注意索引与文档之间的关系。其对应关系如图 10.1 所示。



图 10.1 索引和文档的关系

10.3 工程合同管理信息的分析

要设计开发合同管理信息系统,首先必须对现行合同管理系统进行系统分析。其内容包括:

1) 合同管理与工程项目其他管理职能的关系

工程项目管理包括进度管理、质量管理、成本管理、技术管理、资源管理、合同管理等,而合同管理几乎涉及到项目管理的其他各个领域,与其他职能管理部门、索引文档业主及承包商之间都有着密切的联系。合同管理成功与否,不仅在于合同管理人员,还依赖于其他人员的配合以及管理工作的成效。合同管理信息系统开发成功与否,同样存在着与其他职能管理部门的配合问题。而且,合同信息系统作为工程项目管理信息系统的一个子系统,它的应用深度,也受其他职能管理水平的影响。所以,应与其他系统同时开发,以提高工程项目管理水平。


2) 合同管理组织模式及合同管理工作程序

通过对上述合同管理与其他管理职能的关系分析,再结合本工程管理组成机构形式,以确定项目的合同管理模式。

由于合同管理的涉及面较广,与其他管理职能部门联系较为密切,因此,可建立在项目经理的统一领导之下,专职合同管理工程师直接负责,各专业负责人积极配合,全员参加的组织管理模式。

根据合同管理组织模式,确定从合同签订时起的合同管理工作程序,制定工作流程图。根据《建设工程施工合同》(GF-1999-0201),将与合同履行有关的工作程序介绍如下。

- (1) 工程质量控制程序。参见图 10.2(图中括号内数字代表示范文本条款号,下同)。
- (2) 工程进度控制程序。参见图 10.3。
- (3) 工程价款控制程序。参见图 10.4。
- (4) 工程索赔管理程序。参见图 10.5。

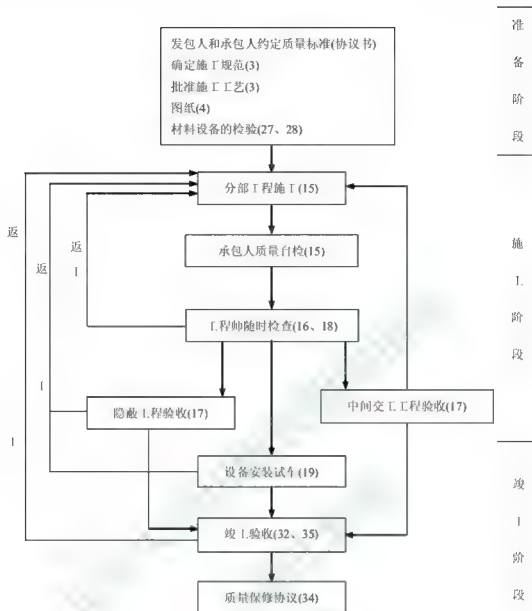

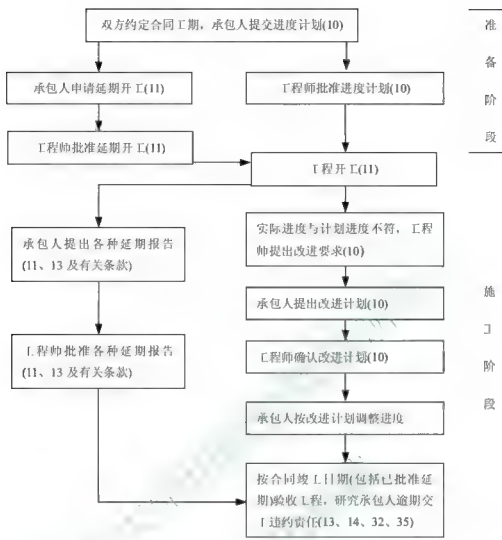


图 10.3 工程进度控制程序

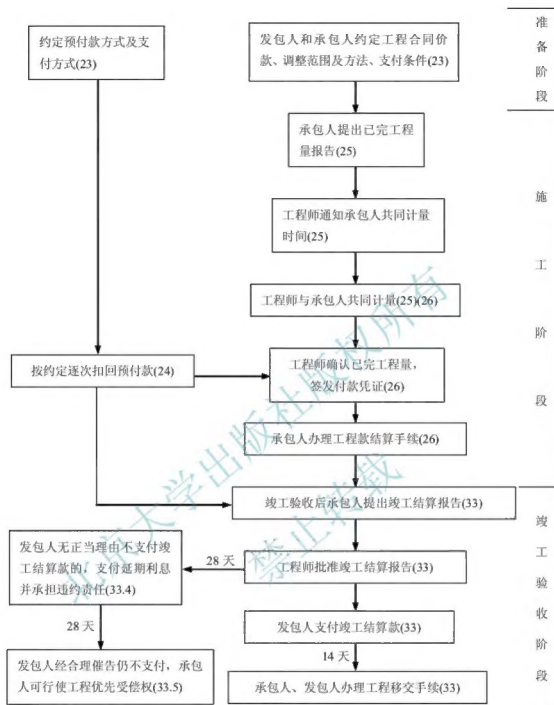


图 10.4 工程价款控制程序

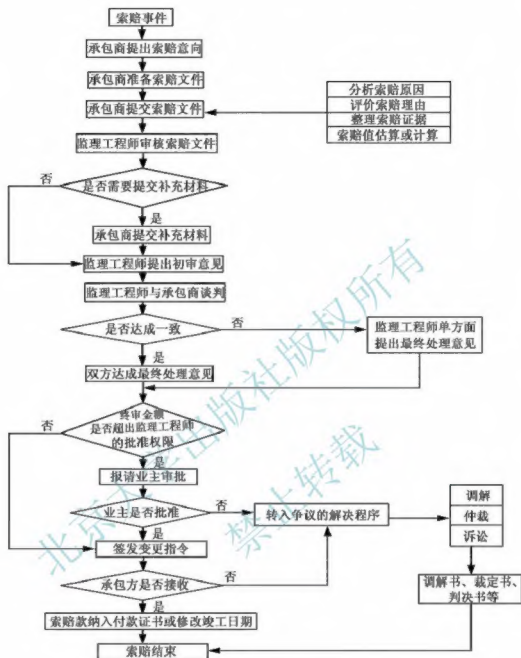


图 10.5 工程索赔管理程序

10.4 工程合同管理信息系统的设计

1. 系统总体数据结构模型设计

系统总体数据结构模型设计即从合同管理对数据的基本要求出发,对系统中有关数据进行分析与综合,包括对数据及其结构进行分类、分组、一般化和聚合处理等,从而构造出系统总体数据结构模型。

系统总体数据结构模型设计包括编码结构设计和系统总体数据结构模型设计。

(1) 编码结构设计。为了对大量数据进行统一有效的处理,充分发挥计算机的优势,提高系统工作效率,必须有适当的编码体系。

(2) 系统总体数据结构模型设计。在对系统进行较为详细的数据调查分析的基础上,采用扩展实体关系模型描述出系统总体数据结构模型。

2. 系统主要数据库设计

合同管理数据库主要可划分为合同管理、进度管理、质量管理、成本管理和文档管理几大部分,根据实际需要,再进行细分并确定各数据库名称。

3. 系统功能子系统划分

在系统功能开发时采用结构化设计方法,首先将整个系统从上到下划分为若干个功能子系统,每个子系统再划分为若干个功能模块,自上而下逐步设计,再自下而上层层实现。功能子系统划分应注意以下原则。

(1) 子系统要具有相对独立性。

(2) 各子系统之间数据的依赖性尽可能小。

(3) 子系统划分应当便于全系统的快速实现。在系统总体数据结构模型的基础上,依据上述系统划分的原则,可将合同管理信息系统划分为合同结构模式选用、合同日常管理、合同文档管理、索赔管理、合同管理知识导读和系统维护子系统。

4. 系统各功能子系统及功能模块设计

在合同管理信息系统功能子系统划分确定之后,要将各功能子系统进一步划分为若干个功能模块。如索赔管理功能子系统又可划分为索赔事件跟踪管理、索赔报告审核、索赔事项管理、索赔值计算等功能模块;系统维护子系统可分为系统简介、操作说明、编码、文件管理、打印管理等功能模块等。

复习思考题

1. 试述合同信息管理的特点。
2. 如何进行施工合同的结构分解?
3. 简述工程质量控制程序。

4. 简述工程进度控制程序。
5. 简述工程价款控制程序。
6. 试述合同控制程序和方法。
7. 如何进行工程合同信息管理系统设计？

北京大学出版社版权所有
禁止转载
